



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5 – APQ Viabilità

Assessorato Lavori Pubblici

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

5 - Viabilità

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - 001 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 32+412 Nuraminis - Villagrecia
2	2 - 002 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 41+000 Svincolo Villasanta
3	3 - 003 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 47+600 (Variante Sanluri)
4	4 - 009 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 88+357 Uras Macomer 2 Lotto
5	5 - 010 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras Macomer 3 Lotto 1 Stralcio
6	6 - 011 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al Km.99+500 Uras Macomer 3 Lotto 2 Stralcio
7	7 - 012 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al Km.108+300 Uras Macomer 4 Lotto
8	8 - 031 - Lavori di completamento della variante di Sassari - Truncu Reale Porto Torres Lotto "B" tra i Km. 6+410 e 10+623
9	9 - 034 - Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.)
10	10 - 039 - SS 131 dcn - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il porto industriale
11	11 - 041 - SS 131 dcn - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di Galtelli
12	12 - 044 - S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554 - 1 lotto 2 stralcio (svincolo Flumini di Quartu)
13	13 - 045 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi 1° lotto
14	14 - 046 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 2 lotto
15	15 - 052 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 1 stralcio
16	16 - 053 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 2 stralcio
17	17 - 058 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 4 lotto 1 stralcio
18	18 - 067 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 stralcio
19	19 - 068 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 stralcio
20	20 - 069 - Connessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di Arbatax
21	21 - 073 - S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-Casagliana (tipo B)



5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
22	22 - 079 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia – Tratto Alghero-bivio Rudas 1 lotto (compresa Circonvallazione di Alghero)
23	23 - 080 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia - Tratto bivio Rudas - Olmedo 2 lotto
24	24 - 089 - S.S. 128 - Lavori di costruzione della S.S. 128 bivio Monastir-bivio Serri 1 lotto
25	25 - 094 - S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, adeguamento tra Olbia e la S.S. 131dcn
26	26 - 100 - S.S. 127 Tempio - Sassari - Lavori di ammodernamento e sistemazione - Scala Ruja-Tempio 1 lotto 1 stralcio
27	27 - 101 - S.S. 127 Tempio - Sassari Lavori di ammodernamento e sistemazione Scala Ruja-Tempio 1 lotto 2 stralcio
28	28 - 102 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento e sistemazione per l'eliminazione degli svincoli a raso tra Elmas-Assemini-Decimomannu
29	29 - 103 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di installazione di una barriera spartitraffico centrale tra i km 16+800 e km 50+200 1 stralcio ed allargamento sede
30	30 - 104 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Circonvallazione di Iglesias
31	31 - 105 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento della S.S. 130 e S.S. 126 tratto Carbonia-Iglesias 1 lotto
32	32 - 106 - S.S. 389 Bitti - Budduso (Prosecuzione collegamento con la SP Abbasanta-Budduso-Olbia)
33	33 - 107 - S.S. 389 tratto Ala dei Sardi-bivio Padru - collegamento alla Abbasanta-Budduso-Olbia
34	34 - 108 - S.S. 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortoli lotto bivio Villagrande-svincolo Arzana
35	35 - 110 - S.S. 129bis Macomer - Bosa tratto Suni-Bosa
36	I Atto Integrativo
36	1 - 040 - S.S. 131 dcn Barriera centrale 1° lotto tratto Abbasanta-Nuoro
37	2 - 074 - S.S. 125/133 bis Olbia-Palau 2° lotto 1° stralcio
38	3 - 083b - S.S. 195 messa in sicurezza 2° lotto km. 10+500-12+550 3 rotonde svincolo Maramura, svincolo Capoterra, svincolo Frutti d'Oro
39	4 - 083e - S.S. 195 messa in sicurezza 5° lotto km. 13+500-14+000 rotonde doppia Torre degli Ulivi – Su Spantu
40	5 - 083f - S.S. 195 messa in sicurezza 6° lotto km. 12+500-13+500 intersezione San Girolamo
41	6 - 083g - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 1° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi
42	7 - 083h - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 2° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi.



5

VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
43	8 - 084a - S.S. 195 1° lotto stralcio
44	9 - 085 new - S.S. 195 tratto Cagliari - Pula 2°, 3° e 5° lotto
45	10 - 115 - Lavori di messa a norma della S.S. 554, eliminazione degli svincoli a raso (asse attrezzato urbano)
46	11 - 120 - Ammodernamento e riassetto funzionale della rete stradale dell'ANAS (strade di competenza statale e regionale) al fine di conseguire un sostanziale incremento delle velocità di percorrenza con interventi puntuali per l'eliminazione dei nodi critici
47	12 - 121 - Realizzazione percorsi stradali di collegamento aree interne con i principali assi viari regionali tramite il riassetto funzionale e l'interconnessione delle strade esistenti anche di diversa competenza gestionale
48	13 - 122 - SP 70 "Bassacutena-Porto Pozzo" completamento lavori di ammodernamento
49	14 - 123 - Circonvallazione di Luras, dalla SP 10 inizio abitato alla SP 10 fine abitato
50	15 - 124 - SP 14M sopraelevata di Olbia sud - completamento lavori di adeguamento e miglioramento funzionale
51	16 - 125 - Strada di accesso a Sedini, dalla S.S. 134 alla SP 13M
52	17 - 126 - Costruzione della strada di circonvallazione di Abbiadori dalla SP 59/bis alla SP 94
53	18 - 127 - SP 25 Sorso - Sassari, lavori di adeguamento e messa in sicurezza
54	Il Atto Integrativo
54	1 - 081 - SS 291 "Lavori di costruzione della nuova SS 291 Olmedo - Intersezione SS 291 esistente, 3° lotto"
55	2 - 128 - Trasversale sarda - Collegamento Oristano/Tortolì - 1° lotto 1° stralcio - Lavori di adeguamento della SP Sarule-Mamoiada
56	3 - 129 - Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per incrementare le possibilità di accesso alle zone costiere da parte dei comuni interni più prossimi, al fine di integrare e rafforzare le potenzialità di sviluppo turistico
57	4 - 130 - Studio per la razionalizzazione e ottimizzazione delle connessioni viarie tra il Sulcis-Iglesiente e l'Oristanese
58	5 - 131 - SS 131 "Cagliari-Sassari" tratto km 23+885 e km 32+412 Sovrappasso sulla SS 131 della strada comunale Muracesus nel territorio di Nuraminis
59	6 - 132 - SS 131 "Cagliari-Sassari" Innesco della variante di Sassari-Truncu Reale-Porto Torres al km 209+400
60	7 - 133 - SS 125 "Cagliari-Olbia" Ponte sul rio Padrongianus al km 311+860
61	8 - 134 - SS 128 "Messa in sicurezza dei punti critici della SS 128 nei tratti Senorbì-Isili



5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

1 - 001 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 32+412 Nuraminis - Villagrecca

Somma stanziata: € 31.100.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto Concluso

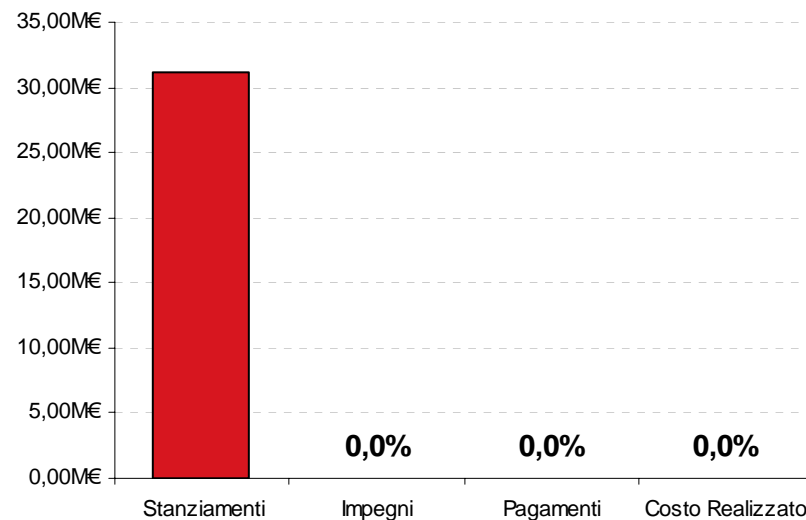

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

2 - 002 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 41+000 Svincolo Villasanta

Somma stanziata: € 61.100.000,00

Somma impegnata: € 61.100.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto Concluso

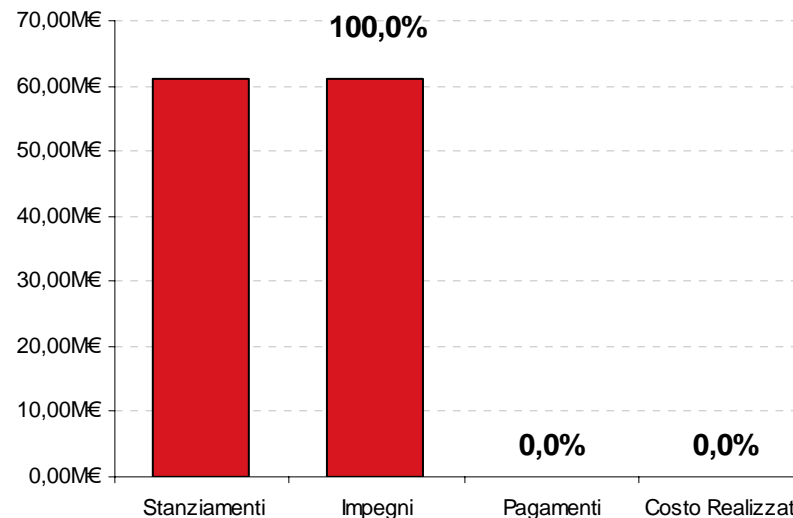

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

3 - 003 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 47+600 (Variante Sanluri)

Somma stanziata: € 41.140.000,00

Somma impegnata: € 33.969.261,91

% impegnato su stanziato: 82,57%


Costo realizzato: € 9.494.833,00

% realizzato su stanziato: 23,08%

Pagamenti: € 9.494.833,00

% pagato su stanziato: 23,08%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (22%)

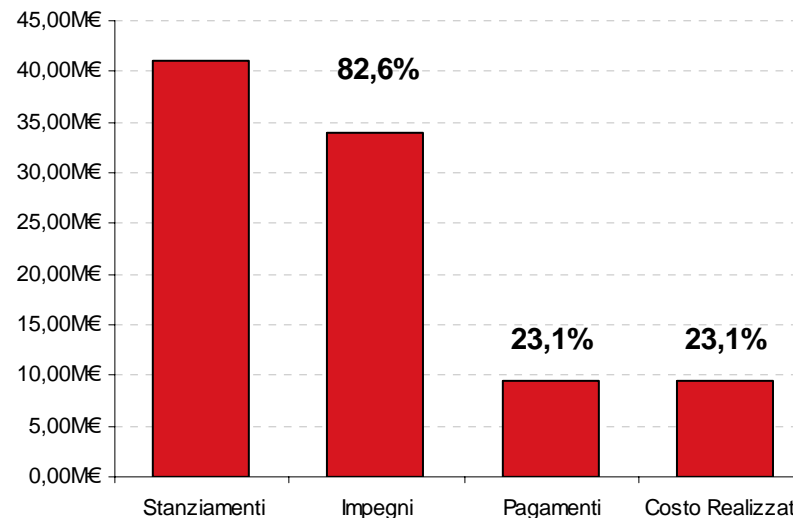

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

4 - 009 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 88+357 Uras Macomer 2 Lotto

Somma stanziata: € 33.215.613,24

Somma impegnata: € 33.215.613,24

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.007.403,73

% realizzato su stanziato: 15,08%

Pagamenti: € 5.007.403,73

% pagato su stanziato: 15,08%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (15%)

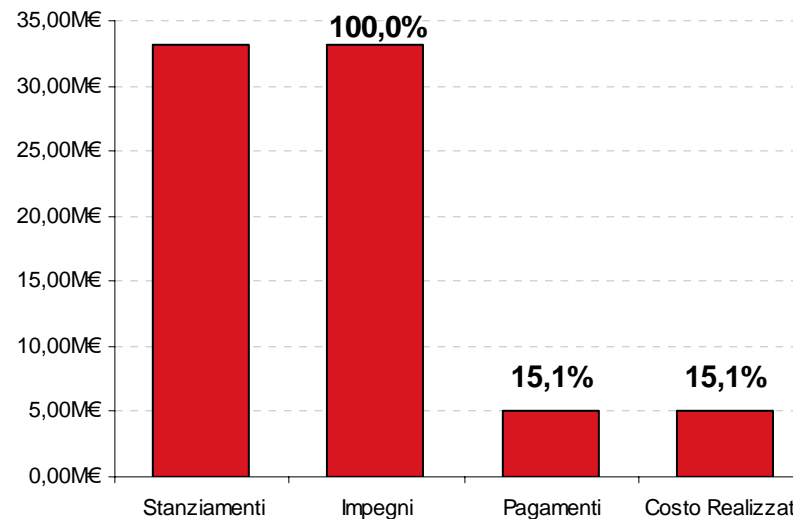

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

5 - 010 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras Macomer 3 Lotto 1 Stralcio

Somma stanziata: € 25.964.498,96

Somma impegnata: € 25.964.498,96

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 12.837.840,93

% realizzato su stanziato: 49,44%

Pagamenti: € 12.837.840,93

% pagato su stanziato: 49,44%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (49%)

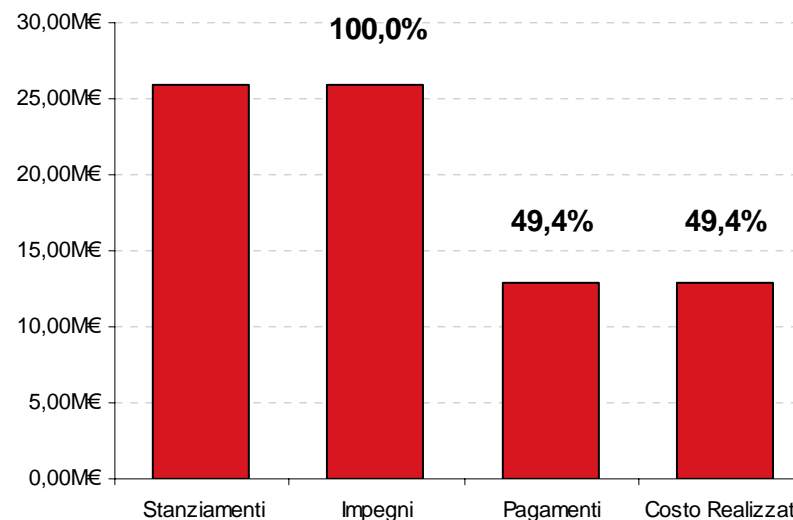

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

6 - 011 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al Km.99+500 Uras Macomer 3 Lotto 2 Stralcio

Somma stanziata: € 49.860.000,00

Somma impegnata: € 39.005.753,51

% impegnato su stanziato: 78,23%


Costo realizzato: € 10.123.853,54

% realizzato su stanziato: 20,3%

Pagamenti: € 10.123.853,54

% pagato su stanziato: 20,3%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (20%)

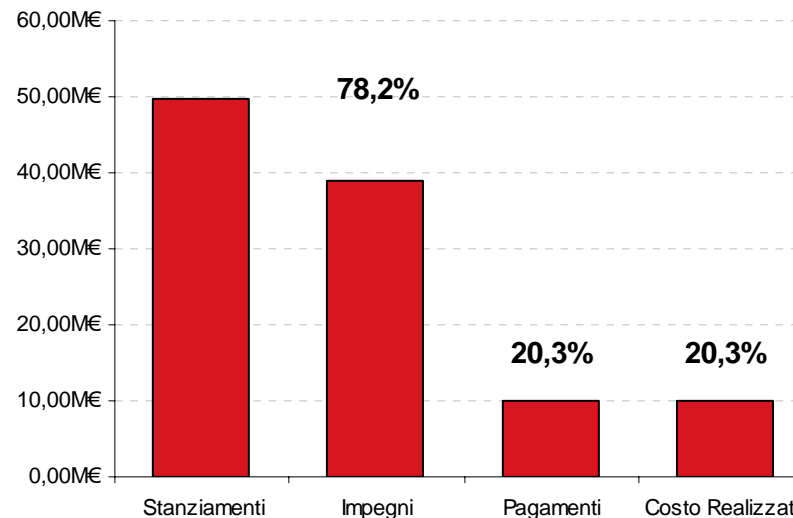

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

7 - 012 - S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al Km.108+300 Uras Macomer 4 Lotto

Somma stanziata: € 36.300.000,00

Somma impegnata: € 28.929.839,94

% impegnato su stanziato: 79,7%


Costo realizzato: € 5.290.438,57

% realizzato su stanziato: 14,57%

Pagamenti: € 5.290.438,57

% pagato su stanziato: 14,57%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (14%)

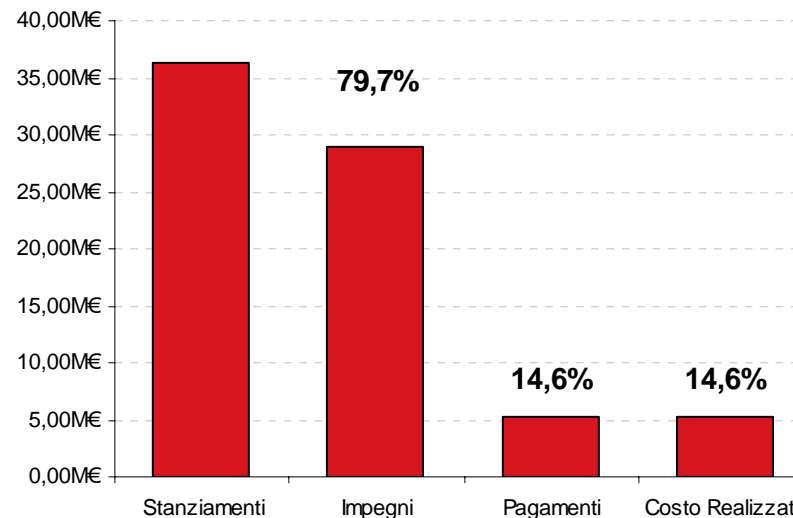

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

8 - 031 - Lavori di completamento della variante di Sassari - Truncu Reale Porto Torres Lotto "B" tra i Km. 6+410 e 10+623

Somma stanziata: € 11.362.051,79

Somma impegnata: € 11.362.051,79

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 8.328.913,69

% realizzato su stanziato: 73,3%

Pagamenti: € 8.328.913,70

% pagato su stanziato: 73,3%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (73%)

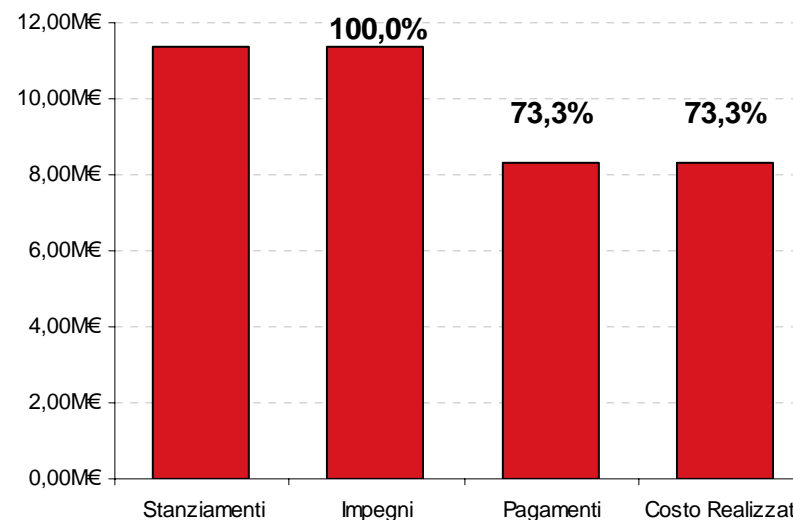

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

9 - 034 - Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.)

Somma stanziata: € 5.164.600,00

Somma impegnata: € 5.164.600,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.211.680,37

% realizzato su stanziato: 23,46%

Pagamenti: € 1.211.680,37

% pagato su stanziato: 23,46%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (23%)

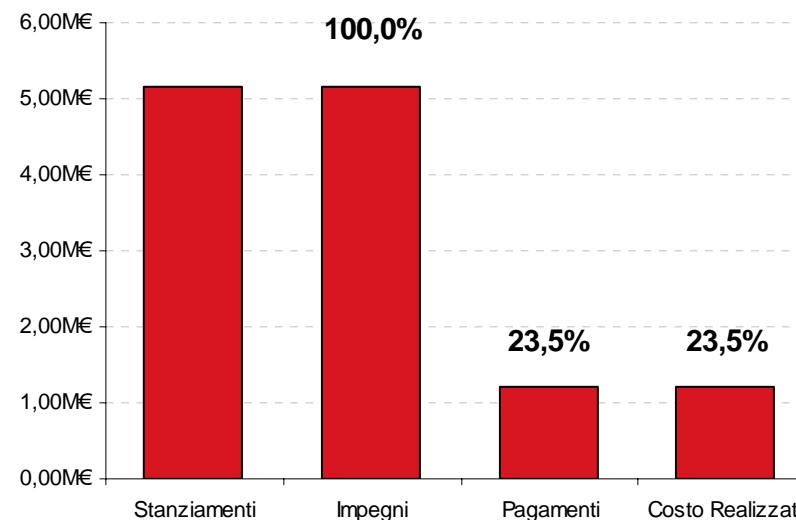

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

10 - 039 - SS 131 dcn - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il porto industriale

Somma stanziata: € 7.747.000,00

Somma impegnata: € 7.747.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 6.332.018,40

% realizzato su stanziato: 81,74%

Pagamenti: € 6.332.018,40

% pagato su stanziato: 81,74%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (82%)

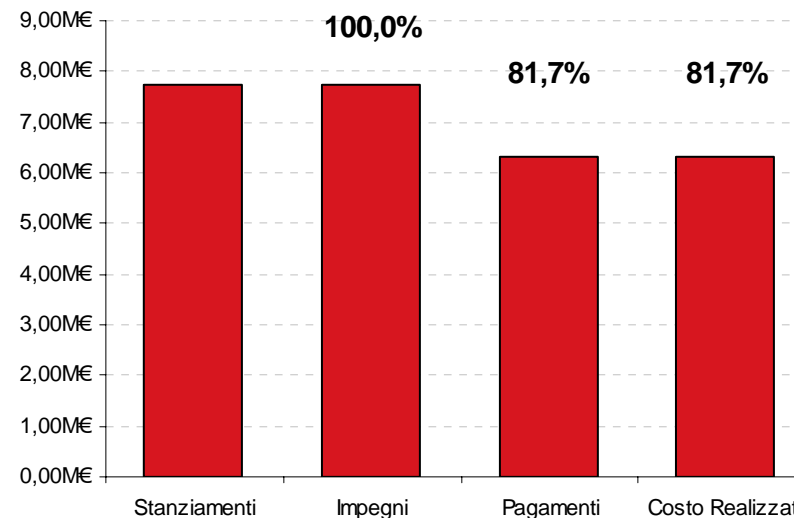

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

11 - 041 - SS 131 dcn - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di Galtelli

Somma stanziata: € 5.165.000,00

Somma impegnata: € 5.165.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 307.412,98

% realizzato su stanziato: 5,95%

Pagamenti: € 307.412,98

% pagato su stanziato: 5,95%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (6%)

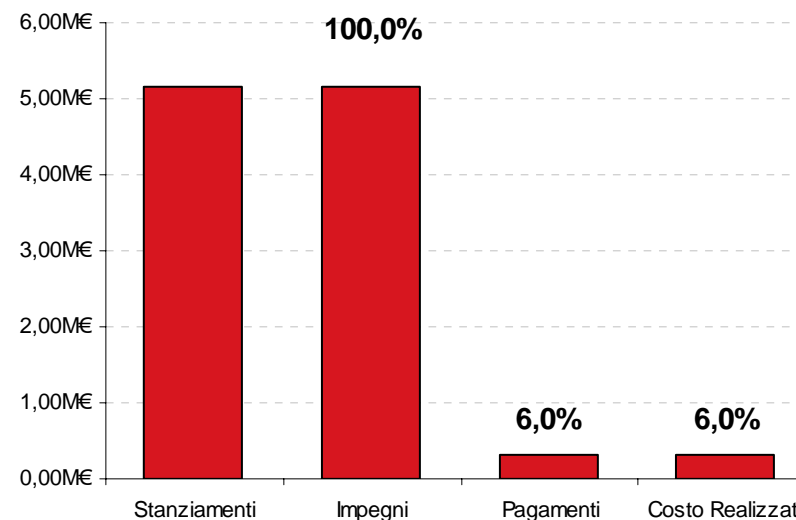

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

12 - 044 - S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554 - 1 lotto 2 stralcio (svincolo Flumini di Quartu)

Somma stanziata: € 14.427.538,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

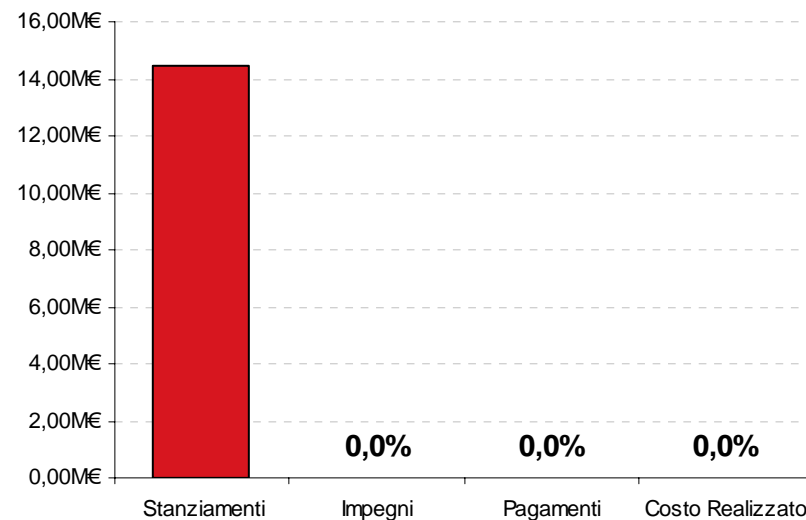

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

13 - 045 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi 1° lotto

Somma stanziata: € 92.580.000,00

Somma impegnata: € 92.580.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.442.846,00

% realizzato su stanziato: 2,64%

Pagamenti: € 2.442.846,00

% pagato su stanziato: 2,64%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (3%)

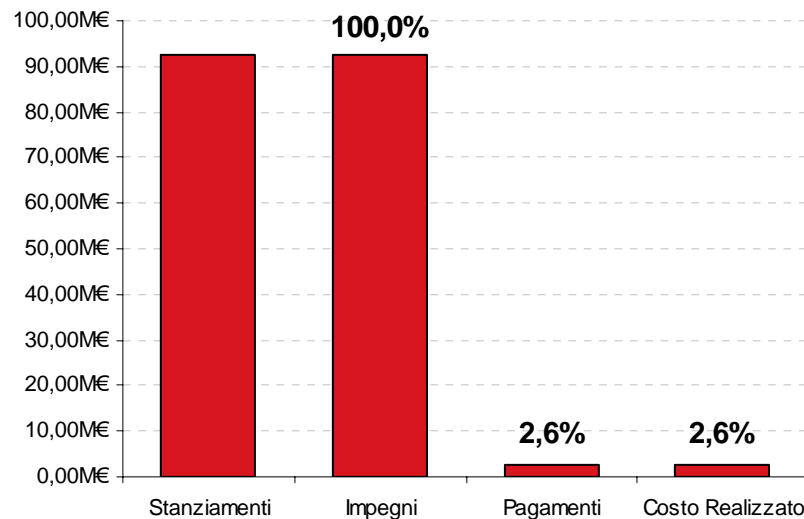

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

14 - 046 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 2 lotto

Somma stanziata: € 151.303.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

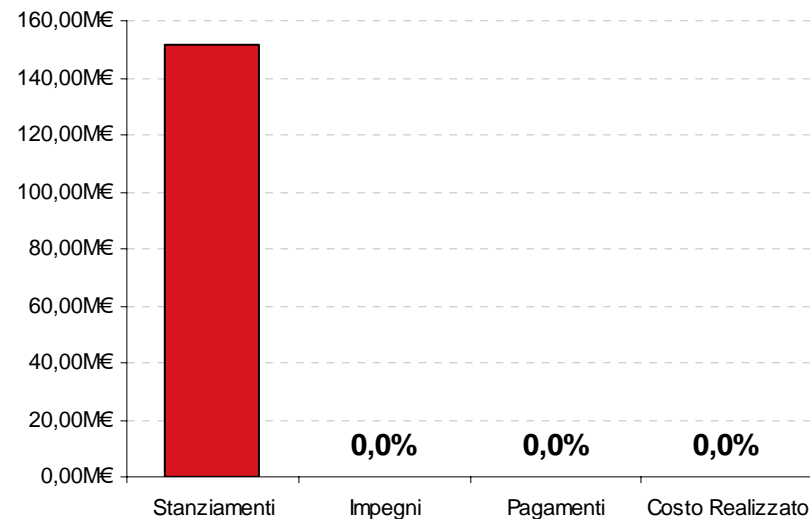

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

15 - 052 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 1 stralcio

Somma stanziata: € 28.405.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

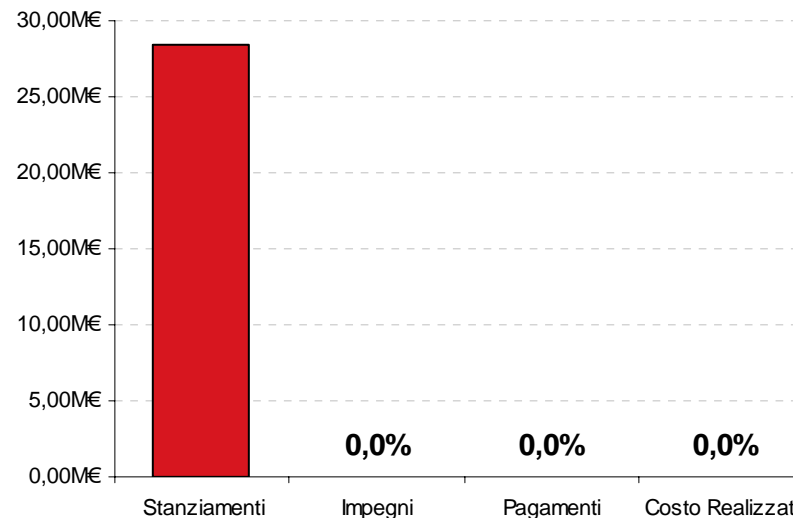

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

16 - 053 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 2 stralcio

Somma stanziata: € 35.472.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

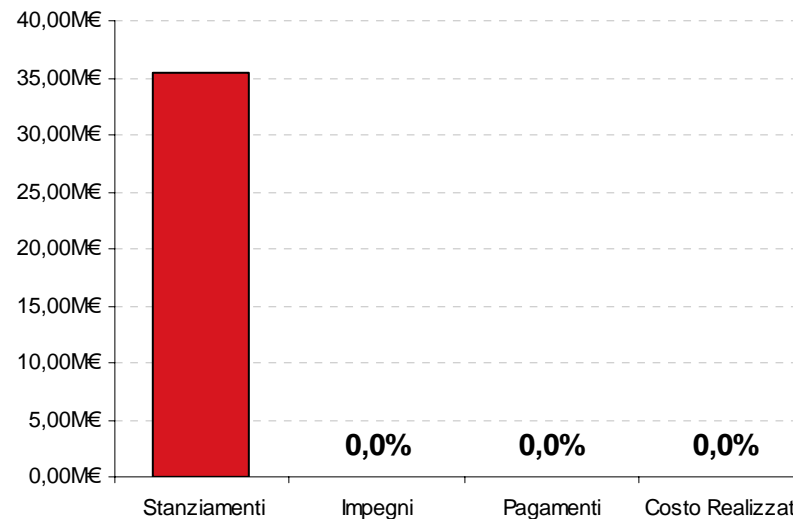

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

17 - 058 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-San Priamo - 4 lotto 1 stralcio

Somma stanziata: € 19.276.000,00

Somma impegnata: € 15.755.585,79

% impegnato su stanziato: 81,74%


Costo realizzato: € 5.788.687,40

% realizzato su stanziato: 30,03%

Pagamenti: € 5.788.687,40

% pagato su stanziato: 30,03%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (30%)

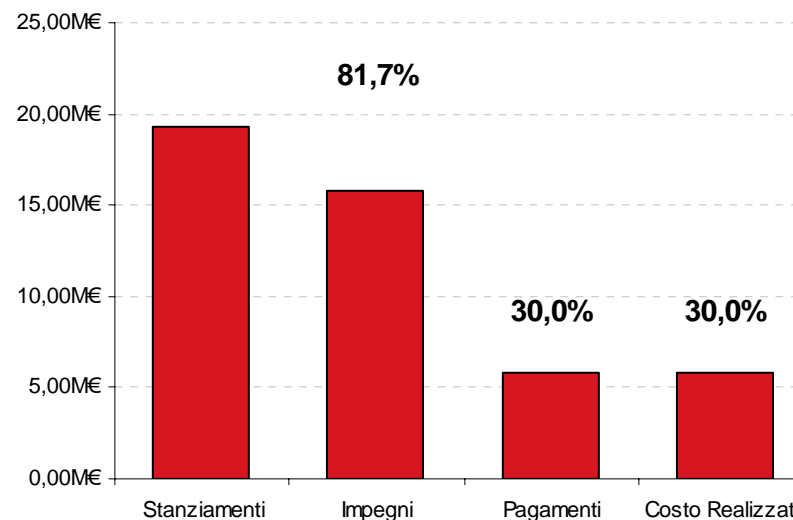

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

18 - 067 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 stralcio

Somma stanziata: € 24.015.245,81

Somma impegnata: € 19.031.809,21

% impegnato su stanziato: 79,25%


Costo realizzato: € 9.026.867,41

% realizzato su stanziato: 37,59%

Pagamenti: € 9.026.867,41

% pagato su stanziato: 37,59%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (38%)

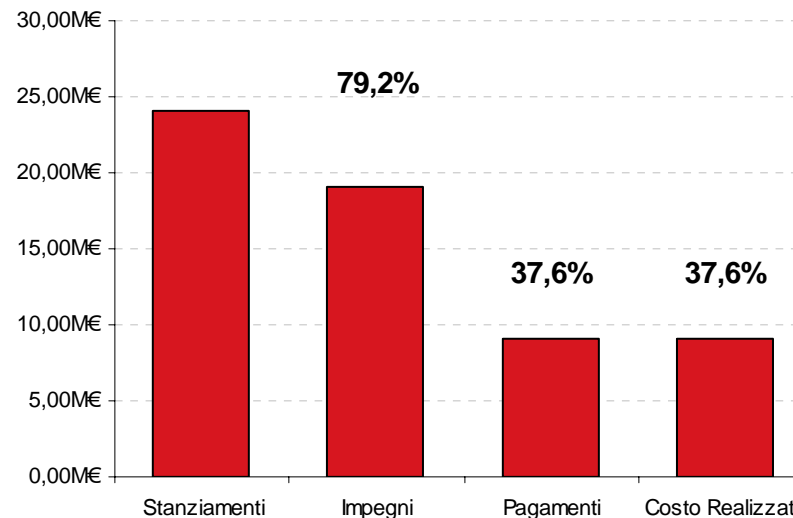

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

19 - 068 - S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 stralcio

Somma stanziata: € 13.815.222,05

Somma impegnata: € 11.305.971,16

% impegnato su stanziato: 81,84%


Costo realizzato: € 983.859,10

% realizzato su stanziato: 7,12%

Pagamenti: € 983.859,10

% pagato su stanziato: 7,12%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (7%)

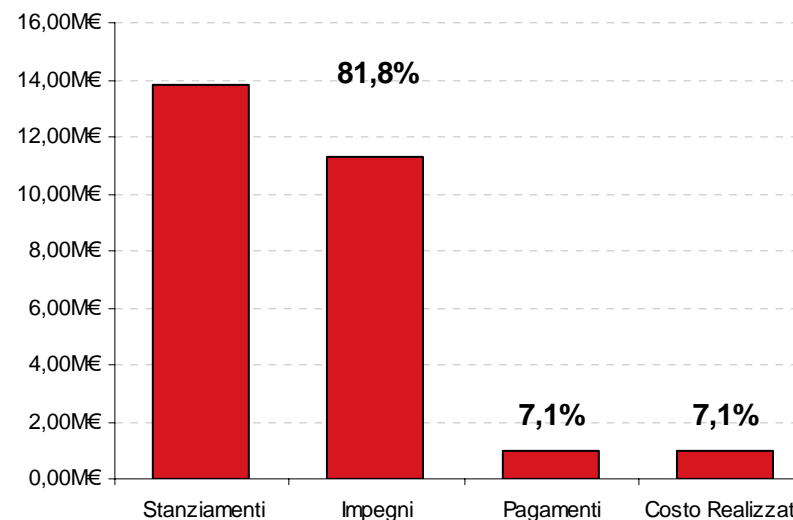

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

20 - 069 - Conessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di Arbatax

Somma stanziata: € 1.549.000,00

Somma impegnata: € 1.549.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 627.010,42

% realizzato su stanziato: 40,48%

Pagamenti: € 627.010,42

% pagato su stanziato: 40,48%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (40%)

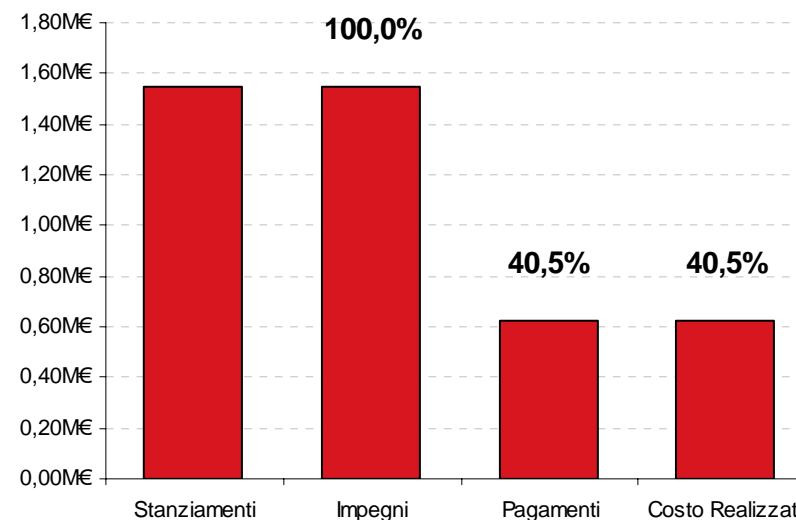

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

21 - 073 - S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-Casagliana (tipo B)

Somma stanziata: € 33.979.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

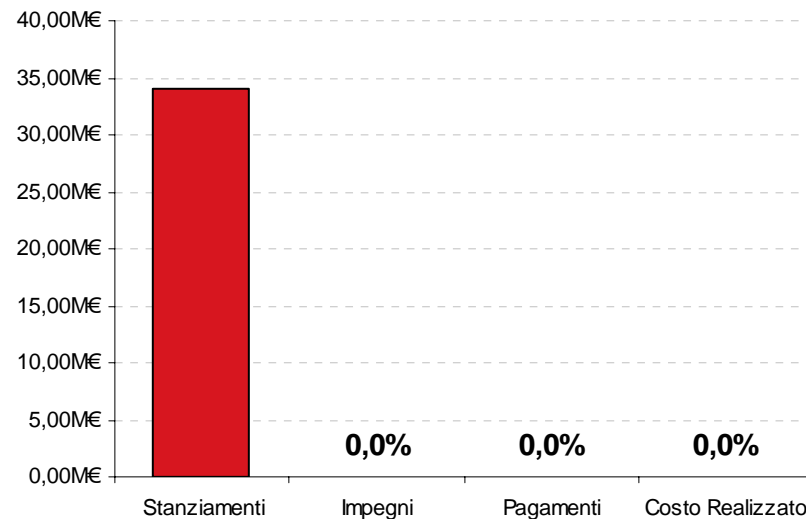

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

22 - 079 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia – Tratto Alghero-bivio Rudas 1 lotto (compresa Circonvallazione di Alghero)

Somma stanziata: € 57.843.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

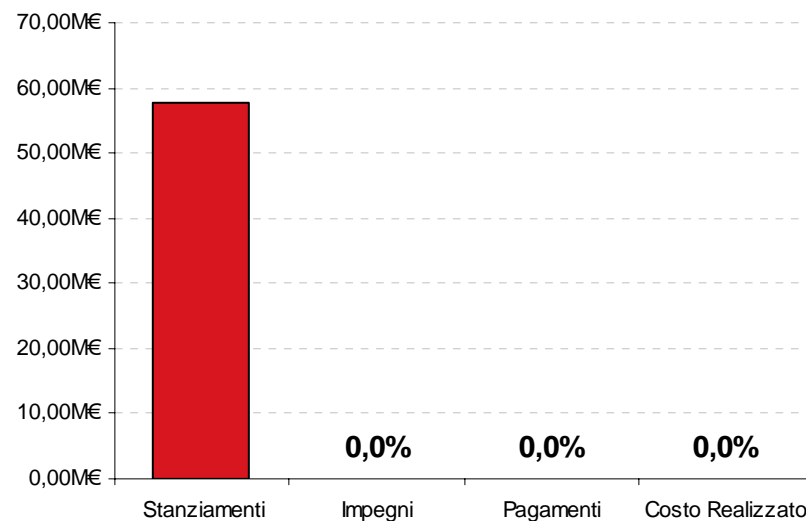

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

23 - 080 - S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia - Tratto bivio Rudas - Olmedo 2 lotto

Somma stanziata: € 48.372.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

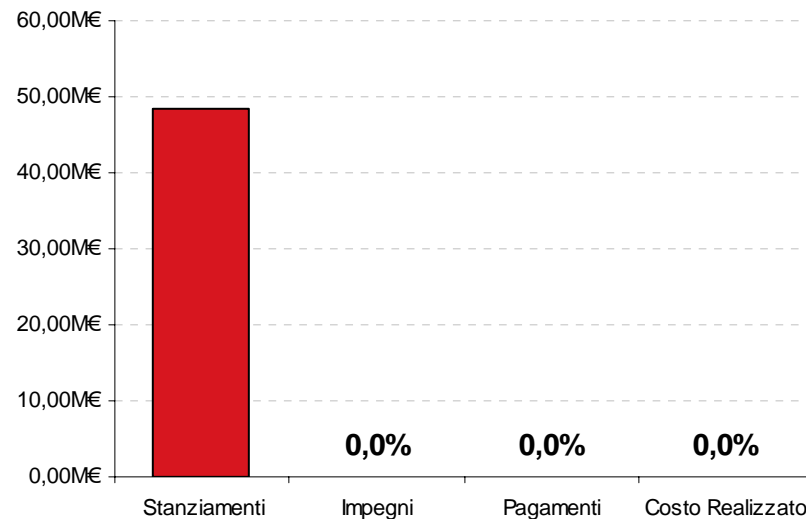

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

24 - 089 - S.S. 128 - Lavori di costruzione della S.S. 128 bivio Monastir-bivio Serri 1 lotto

Somma stanziata: € 20.658.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

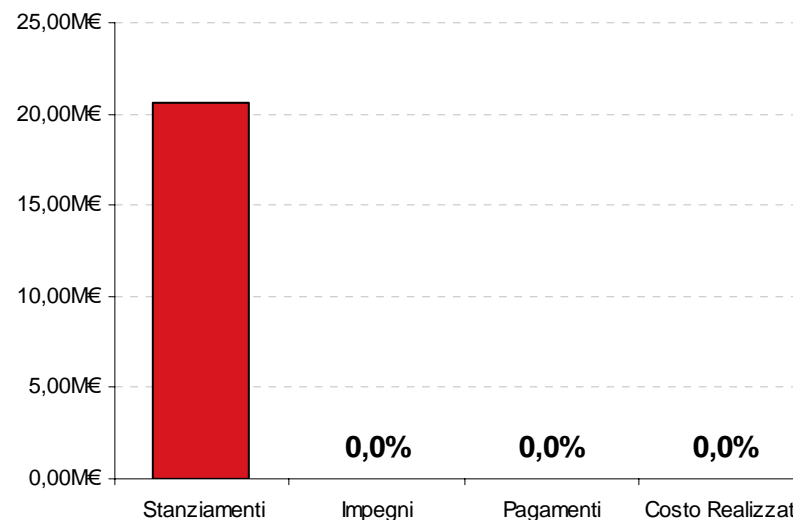

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

25 - 094 - S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, adeguamento tra Olbia e la S.S. 131dcn

Somma stanziata: € 16.493.794,14

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

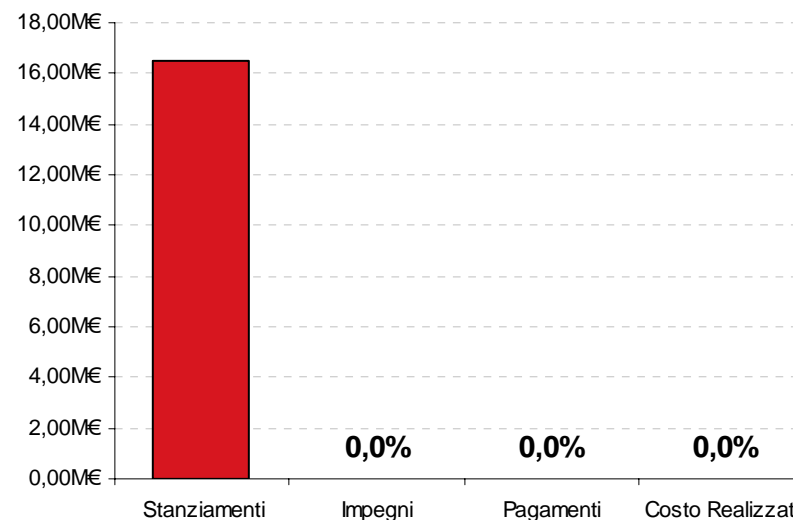

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

26 - 100 - S.S. 127 Tempio - Sassari - Lavori di ammodernamento e sistemazione - Scala Ruja-Tempio 1 lotto 1 stralcio

Somma stanziata: € 17.265.000,00

Somma impegnata: € 14.176.026,41

% impegnato su stanziato: 82,11%


Costo realizzato: € 2.781.988,00

% realizzato su stanziato: 16,11%

Pagamenti: € 2.781.988,00

% pagato su stanziato: 16,11%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (16%)

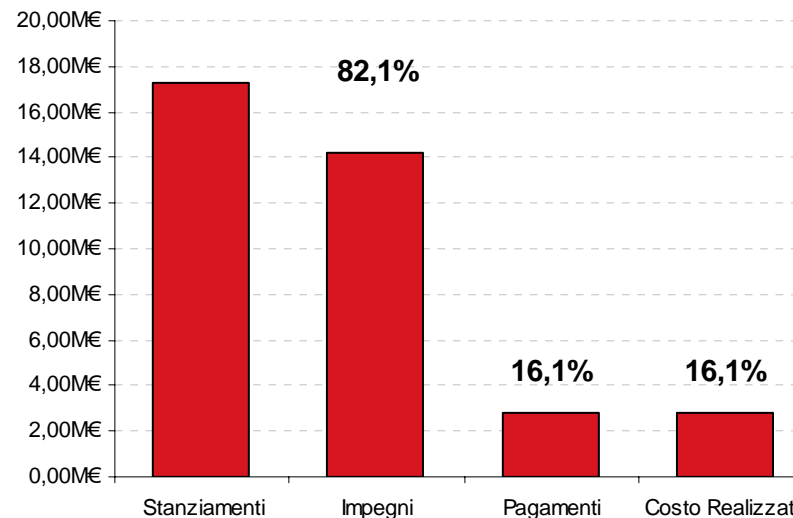

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

27 - 101 - S.S. 127 Tempio - Sassari Lavori di ammodernamento e sistemazione Scala Ruja-Tempio 1 lotto 2 stralcio

Somma stanziata: € 20.600.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

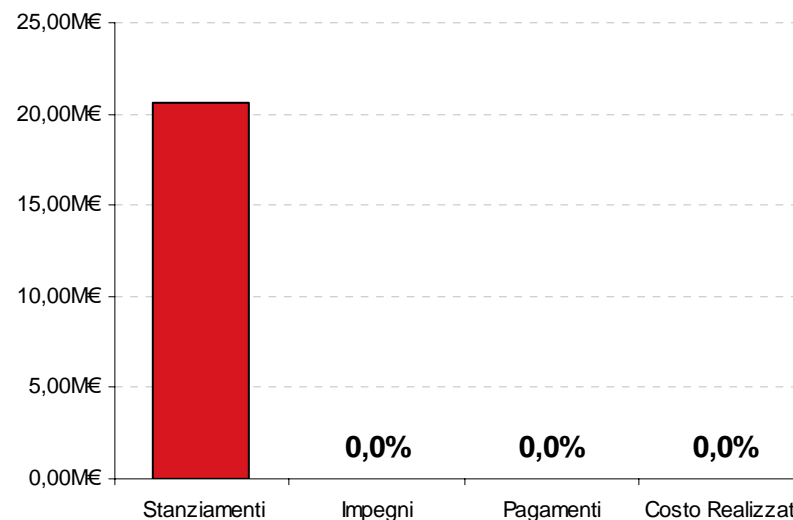

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

28 - 102 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento e sistemazione per l'eliminazione degli svincoli a raso tra Elmas-Assemini-Decimomannu

Somma stanziata: € 41.722.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

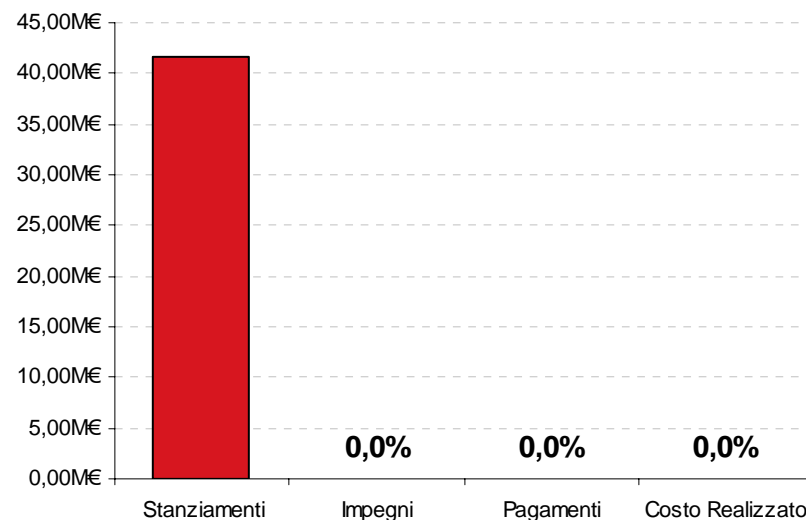

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

29 - 103 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di installazione di una barriera spartitraffico centrale tra i km 16+800 e km 50+200 1 stralcio ed allargamento sede

Somma stanziata: € 13.428.000,00

Somma impegnata: € 13.428.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 13.428.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 6.077.533,99

% pagato su stanziato: 45,26%

Stato di attuazione: Da collaudare

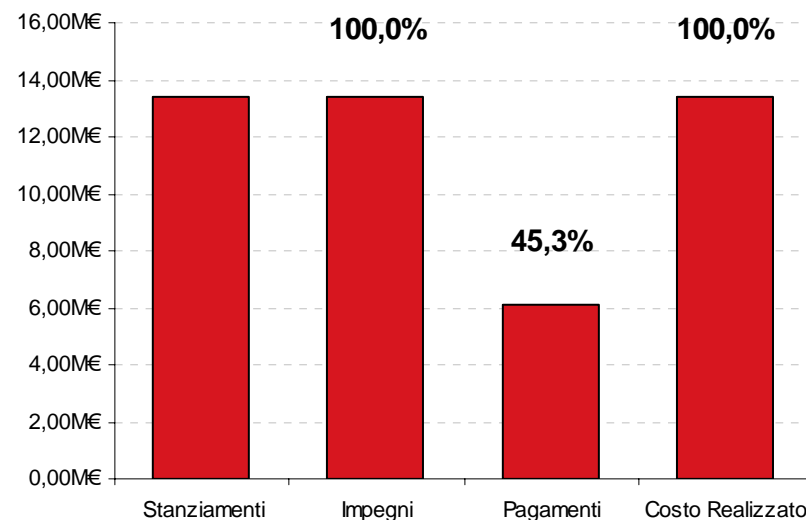

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

30 - 104 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Circonvallazione di Iglesias

Somma stanziata: € 7.052.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

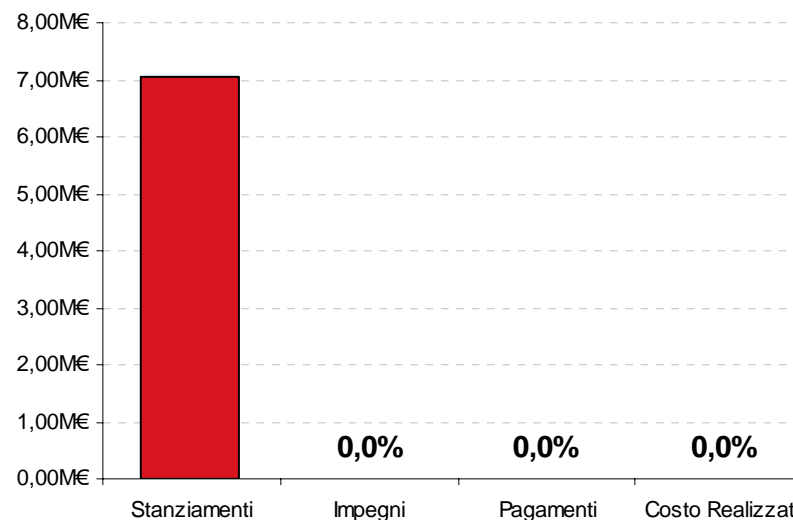

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

31 - 105 - S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento della S.S. 130 e S.S. 126 tratto Carbonia-Iglesias 1 lotto

Somma stanziata: € 20.658.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

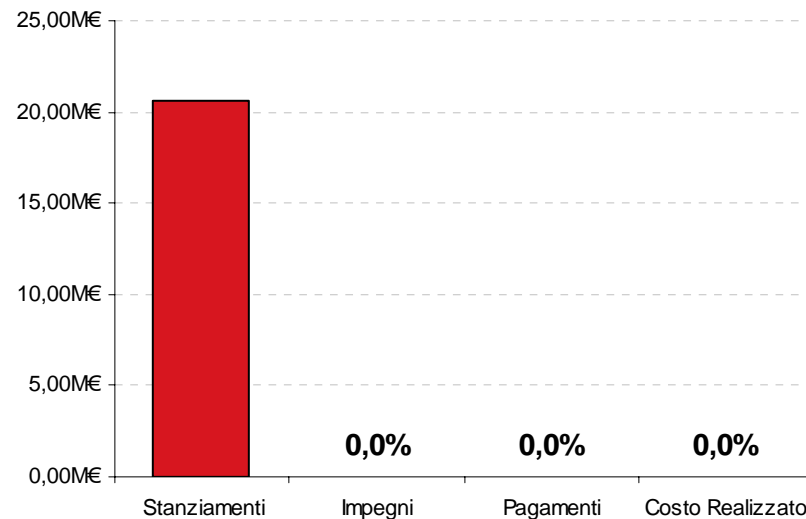

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

32 - 106 - S.S. 389 Bitti - Budduso (Prosecuzione collegamento con la SP Abbasanta-Budduso-Olbia)

Somma stanziata: € 20.658.000,00

Somma impegnata: € 20.658.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.707.108,44

% realizzato su stanziato: 8,26%

Pagamenti: € 1.707.108,44

% pagato su stanziato: 8,26%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (8%)

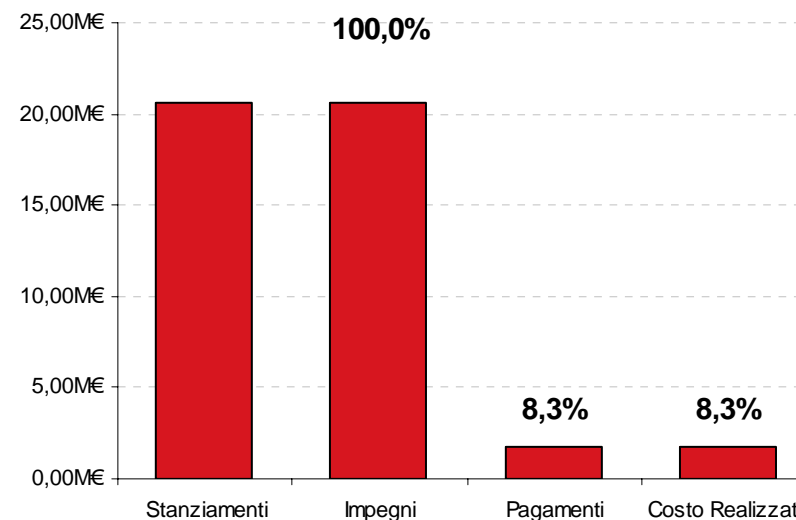

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

33 - 107 - S.S. 389 tratto Ala dei Sardi-bivio Padru - collegamento alla Abbasanta-Budduso-Olbia

Somma stanziata: € 15.494.000,00

Somma impegnata: € 15.494.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 113.054,26

% realizzato su stanziato: 0,73%

Pagamenti: € 113.054,26

% pagato su stanziato: 0,73%

Stato di attuazione: Appalto in corso

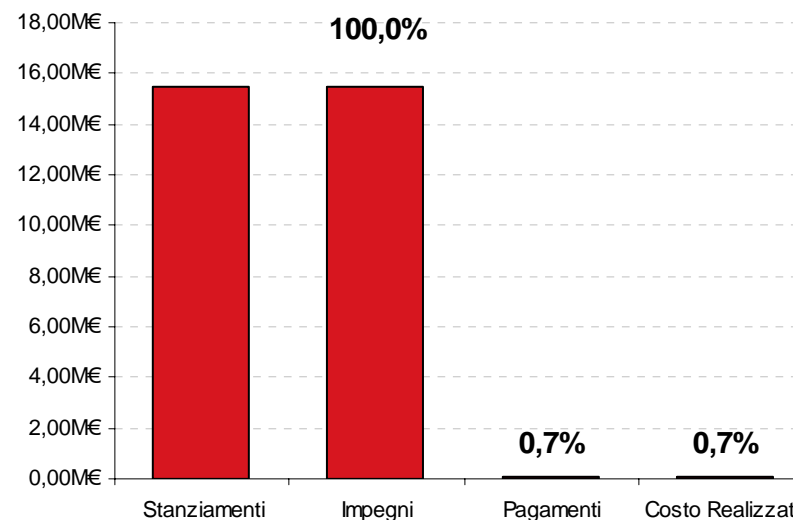

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

34 - 108 - S.S. 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortoli lotto bivio Villagrande-svincolo Arzana

Somma stanziata: € 20.865.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

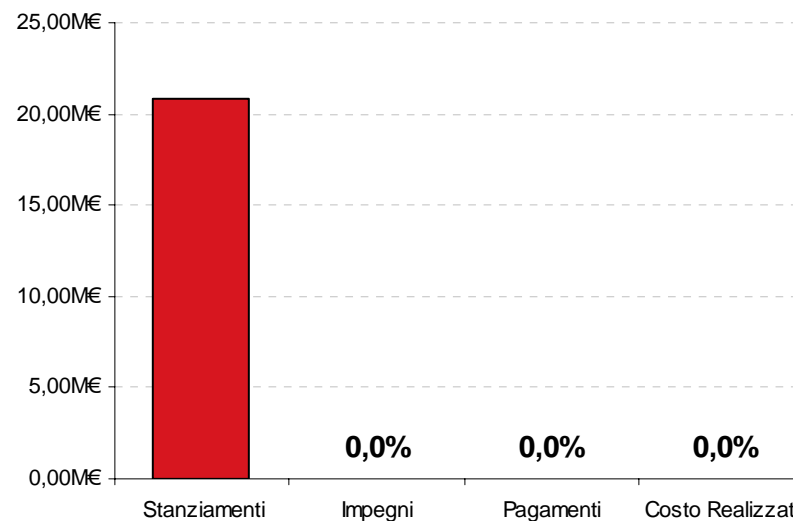

5 VIABILITÀ

APQ ORIGINARIO 11 LUGLIO 2003

35 - 110 - S.S. 129bis Macomer - Bosa tratto Suni-Bosa

Somma stanziata: € 12.911.400,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva in corso

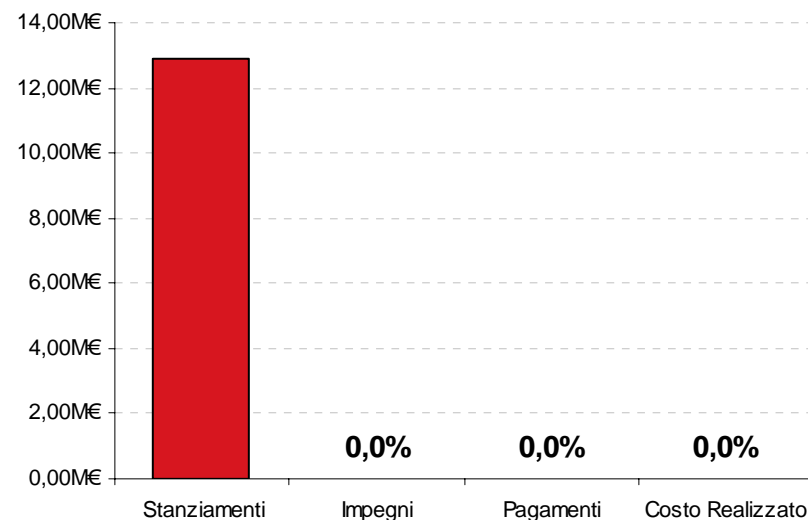

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

1 - 040 - S.S. 131 dcn Barriera centrale 1° lotto tratto Abbasanta-Nuoro

Somma stanziata: € 11.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

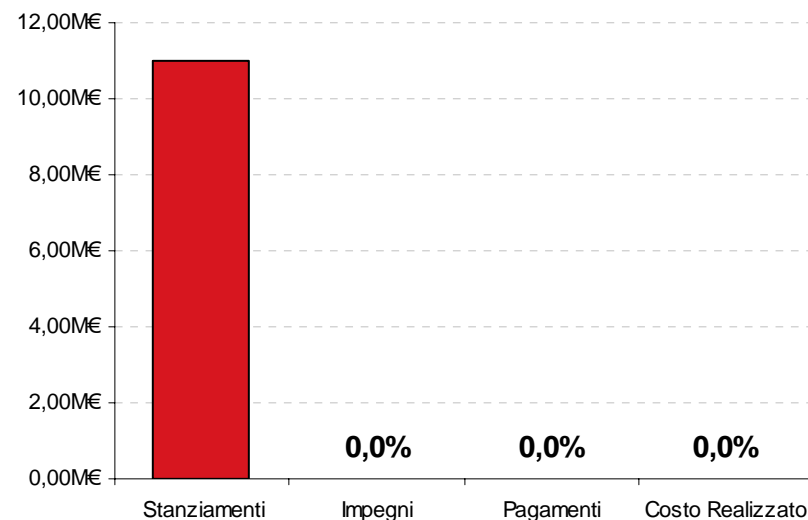

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

2 - 074 - S.S. 125/133 bis Olbia-Palau 2° lotto 1° stralcio

Somma stanziata: € 25.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva in corso

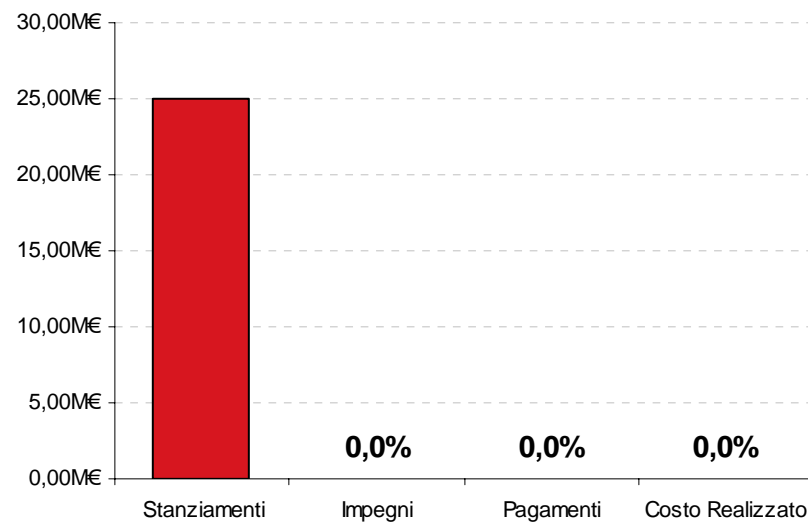

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

3 - 083b - S.S. 195 messa in sicurezza 2° lotto km. 10+500-12+550 3 rotatorie svincolo Maramura, svincolo Capoterra, svincolo Frutti d'Oro

Somma stanziata: € 3.253.631,68

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

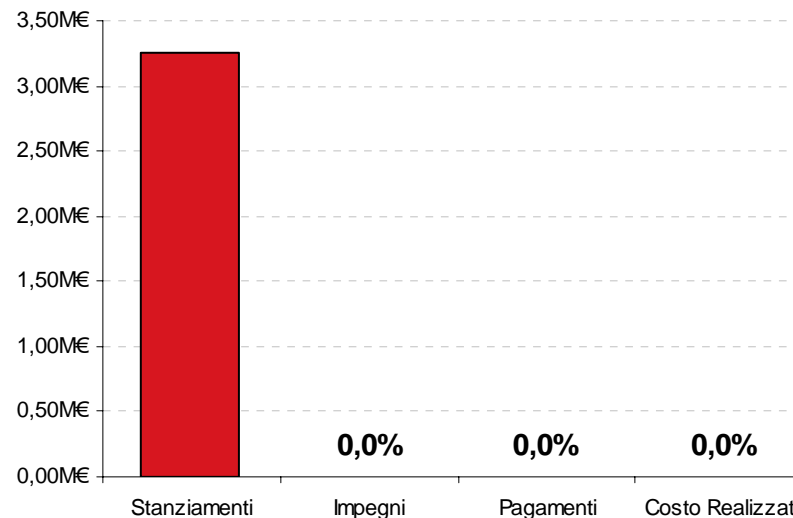

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

4 - 083e - S.S. 195 messa in sicurezza 5° lotto km. 13+500-14+000 rotatorie doppia Torre degli Ulivi – Su Spantu

Somma stanziata: € 1.175.098,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

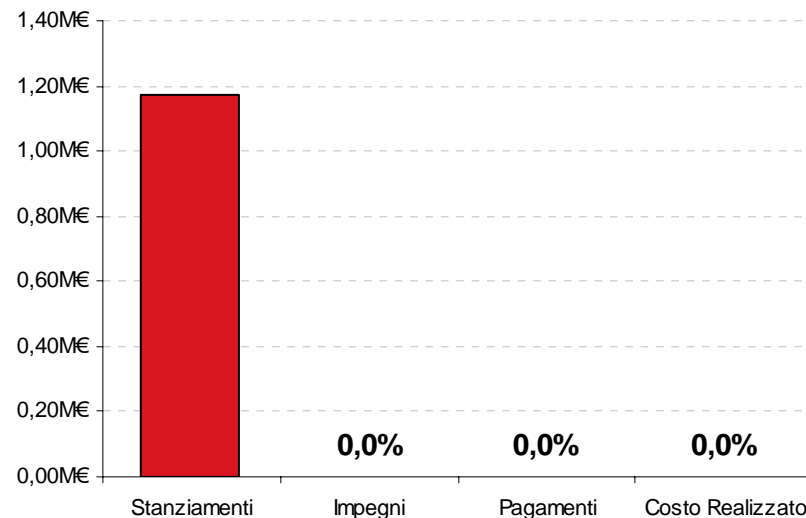

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

5 - 083f - S.S. 195 messa in sicurezza 6° lotto km. 12+500-13+500 intersezione San Girolamo

Somma stanziata: € 1.135.668,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

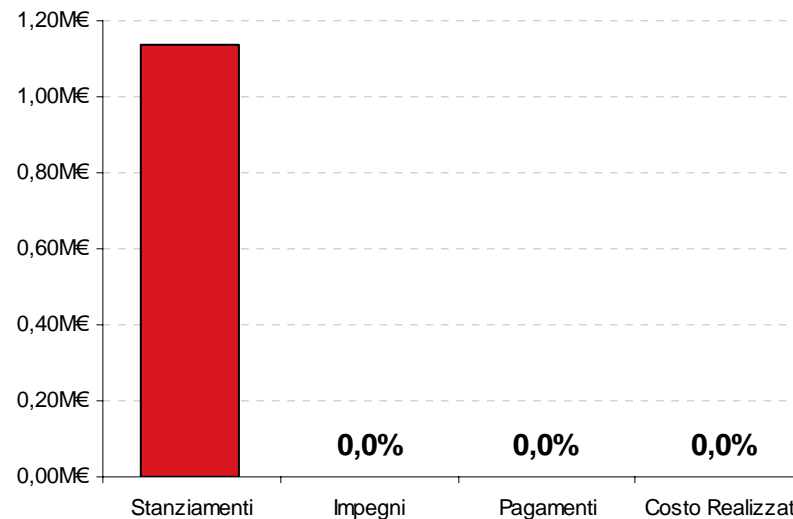

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

6 - 083g - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 1° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi

Somma stanziata: € 1.032.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

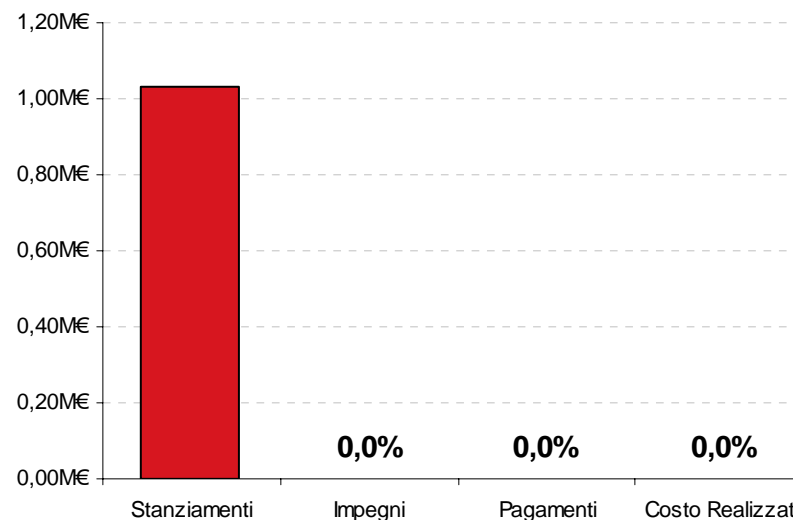

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

7 - 083h - S.S. 195 messa in sicurezza 7° lotto 2° stralcio km. 14+000-15+000 Su Loi.

Somma stanziata: € 556.848,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

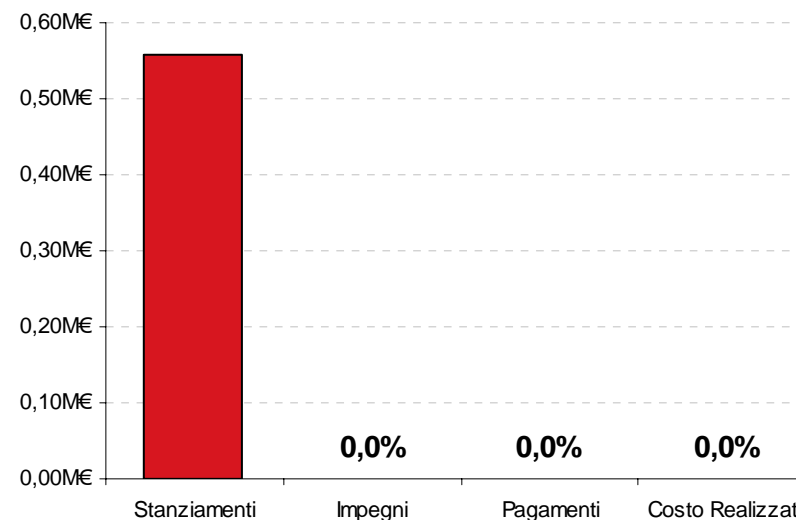

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

8 - 084a - S.S. 195 1° lotto stralcio

Somma stanziata: € 30.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in corso

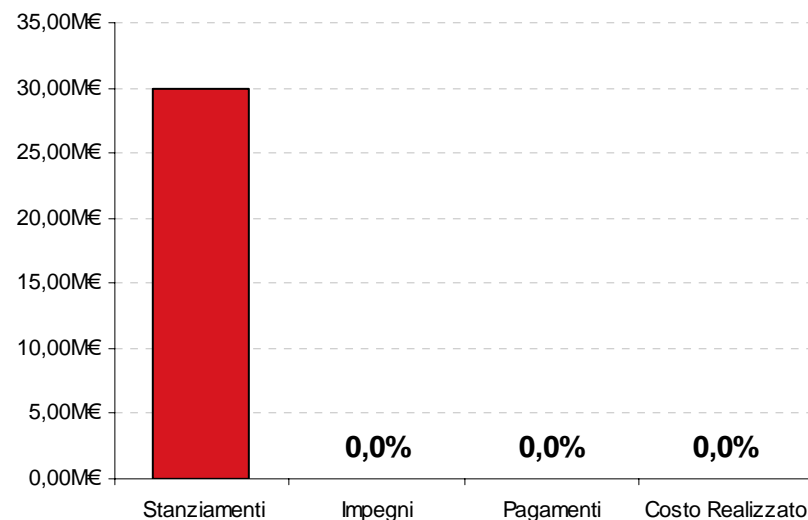

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

9 - 085 new - S.S. 195 tratto Cagliari - Pula 2°, 3° e 5° lotto

Somma stanziata: € 105.699.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in corso

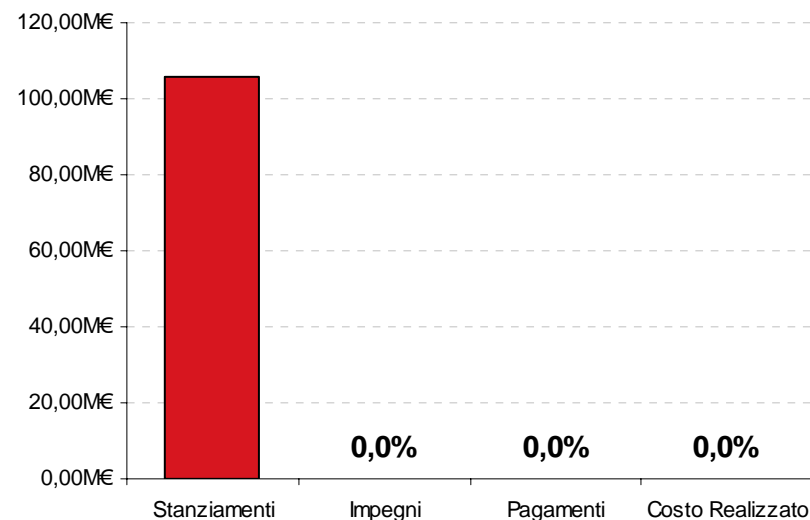

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

10 - 115 - Lavori di messa a norma della S.S. 554, eliminazione degli svincoli a raso (asse attrezzato urbano)

Somma stanziata: € 30.457.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio fattibilità

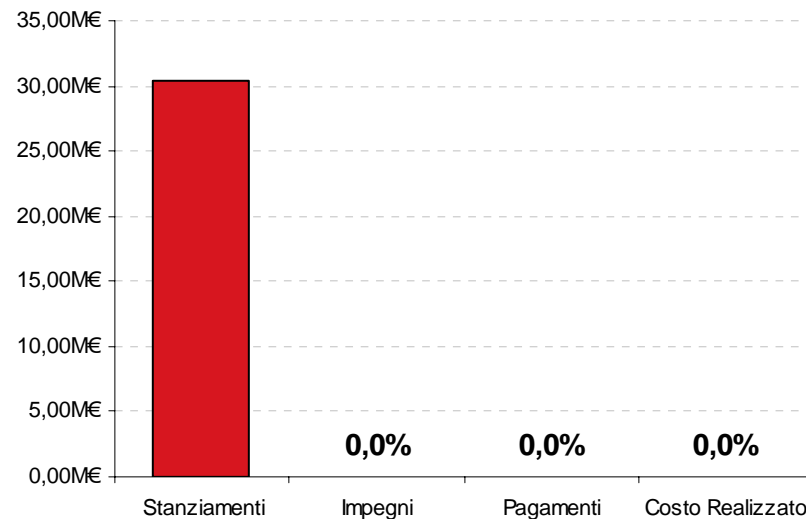

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

11 - 120 - Ammodernamento e riassetto funzionale della rete stradale dell'ANAS (strade di competenza statale e regionale) al fine di conseguire un sostanziale incremento delle velocità di percorrenza con interventi puntuali per l'eliminazione dei nodi critici

Somma stanziata: € 1.100.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio fattibilità

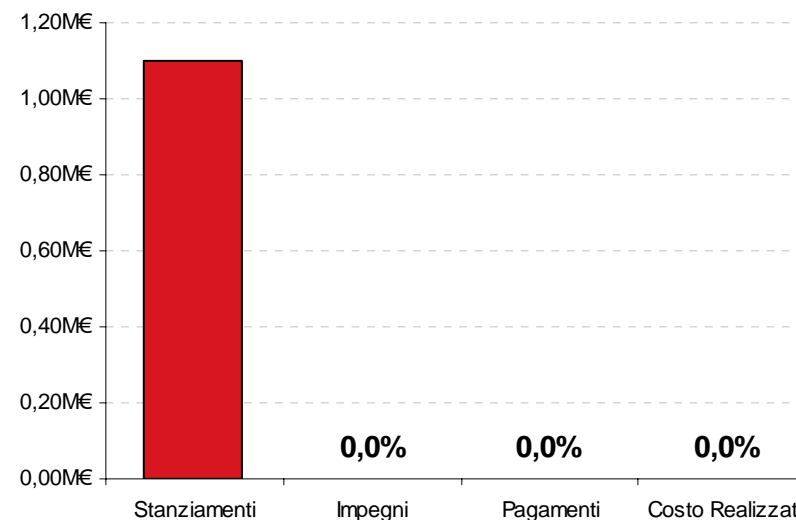

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

12 - 121 - Realizzazione percorsi stradali di collegamento aree interne con i principali assi viari regionali tramite il riassetto funzionale e l'interconnessione delle strade esistenti anche di diversa competenza gestionale

Somma stanziata: € 1.100.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio fattibilità

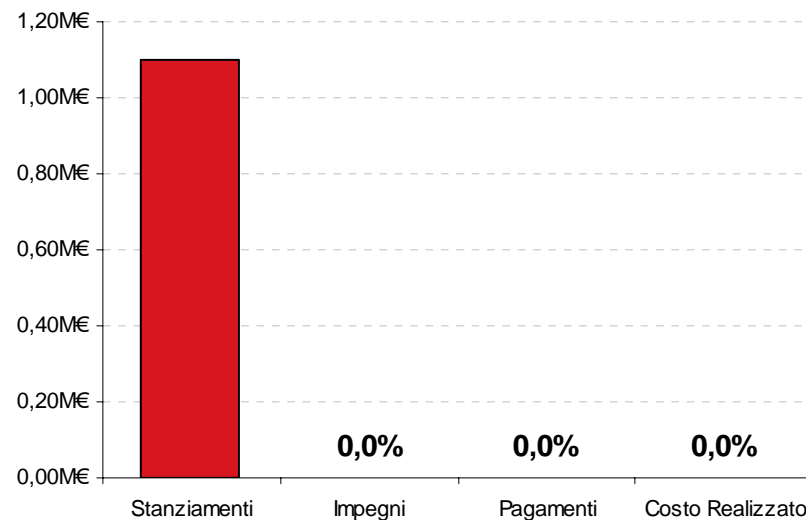

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

13 - 122 - SP 70 "Bassacutena-Porto Pozzo" completamente lavori di ammodernamento

Somma stanziata: € 1.032.913,80

Somma impegnata: € 1.032.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 22.152,89

% realizzato su stanziato: 2,14%

Pagamenti: € 22.152,89

% pagato su stanziato: 2,14%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (2%)

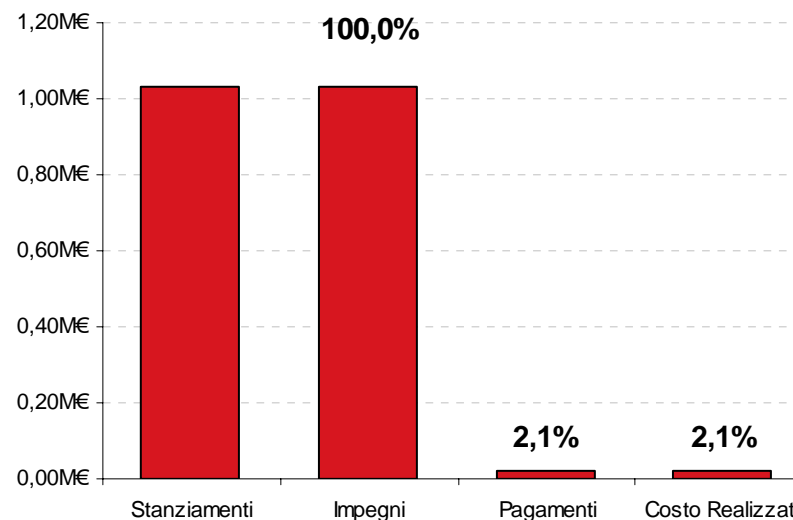

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

14 - 123 - Circonvallazione di Luras, dalla SP 10 inizio abitato alla SP 10 fine abitato

Somma stanziata: € 1.365.717,52

Somma impegnata: € 1.365.717,52

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 69.461,54

% realizzato su stanziato: 5,09%

Pagamenti: € 69.461,54

% pagato su stanziato: 5,09%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (5%)

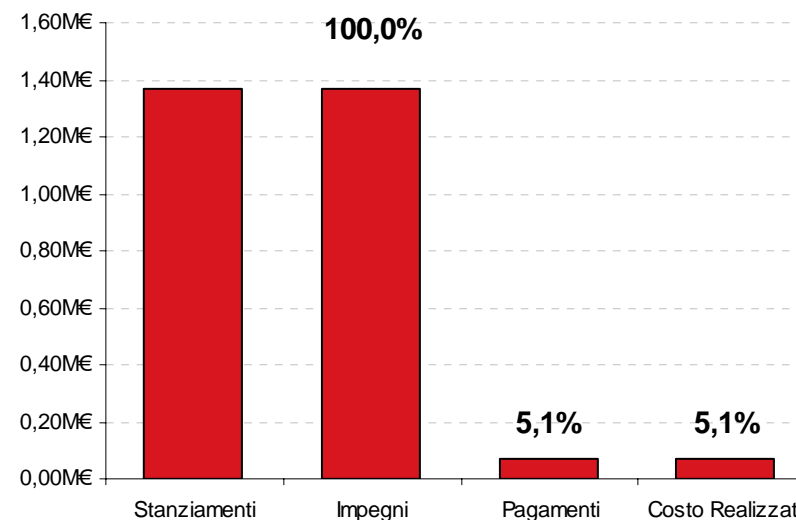

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

15 - 124 - SP 14M sopraelevata di Olbia sud - completamento lavori di adeguamento e miglioramento funzionale

Somma stanziata: € 1.291.142,25

Somma impegnata: € 1.291.142,25

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 17.603,50

% realizzato su stanziato: 1,36%

Pagamenti: € 17.603,50

% pagato su stanziato: 1,36%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (1%)

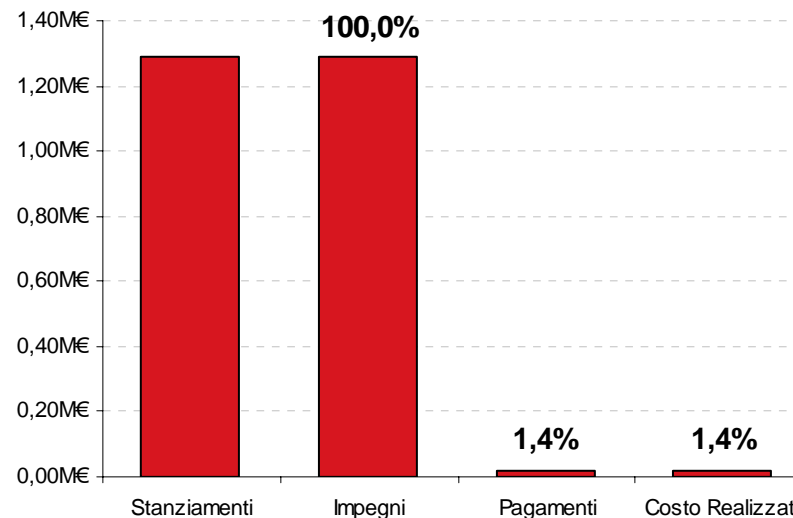

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

16 - 125 - Strada di accesso a Sedini, dalla S.S. 134 alla SP 13M

Somma stanziata: € 9.871.767,00

Somma impegnata: € 9.871.767,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.999.560,90

% realizzato su stanziato: 30,39%

Pagamenti: € 2.999.560,90

% pagato su stanziato: 30,39%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (30%)

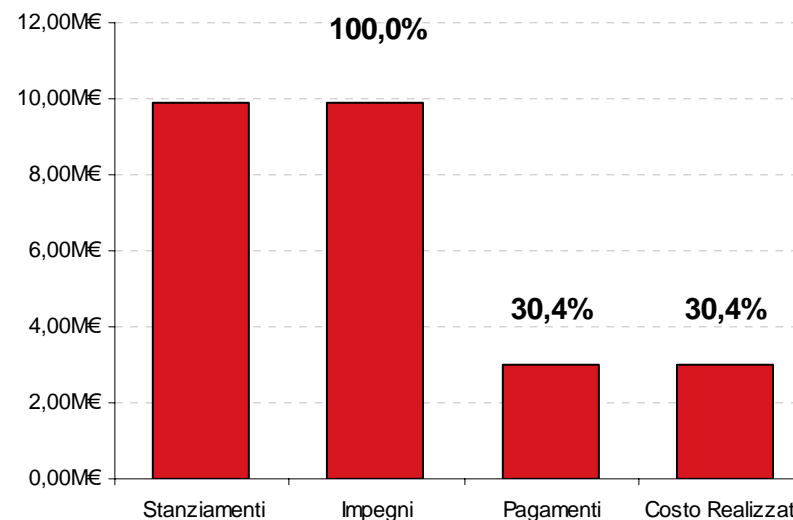

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

17 - 126 - Costruzione della strada di circonvallazione di Abbiadori dalla SP 59/bis alla SP 94

Somma stanziata: € 1.032.913,80

Somma impegnata: € 1.032.913,80

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 56.133,16

% realizzato su stanziato: 5,43%

Pagamenti: € 56.133,16

% pagato su stanziato: 5,43%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (5%)

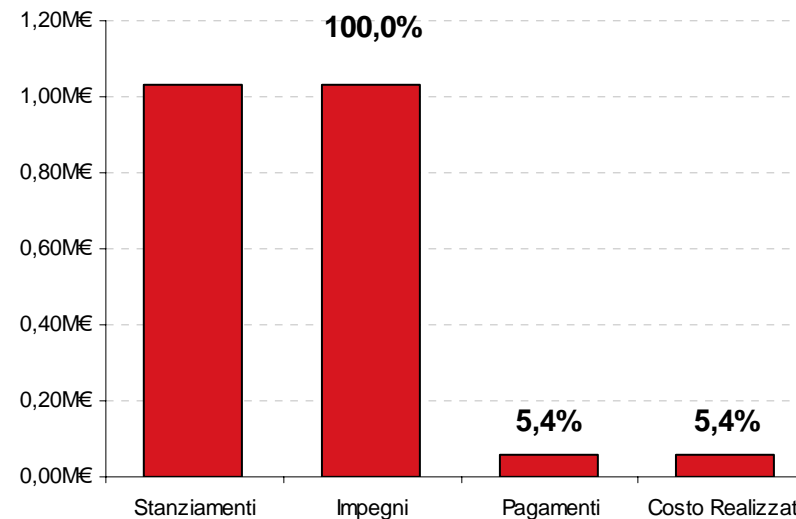

5.1 VIABILITÀ

I ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

18 - 127 - SP 25 Sorso - Sassari, lavori di adeguamento e messa in sicurezza

Somma stanziata: € 1.549.370,70

Somma impegnata: € 1.549.370,70

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 248.836,61

% realizzato su stanziato: 16,06%

Pagamenti: € 248.836,61

% pagato su stanziato: 16,06%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (16%)

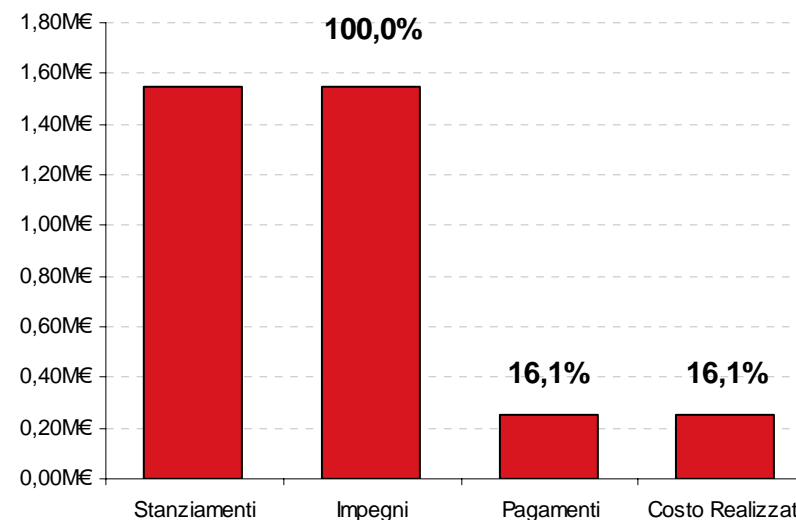

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 14 DICEMBRE 2006

1 - 081 - SS 291 " Lavori di costruzione della nuova SS 291 Olmedo - Intersezione SS 291 esistente, 3° lotto"

Somma stanziata: € 54.666.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

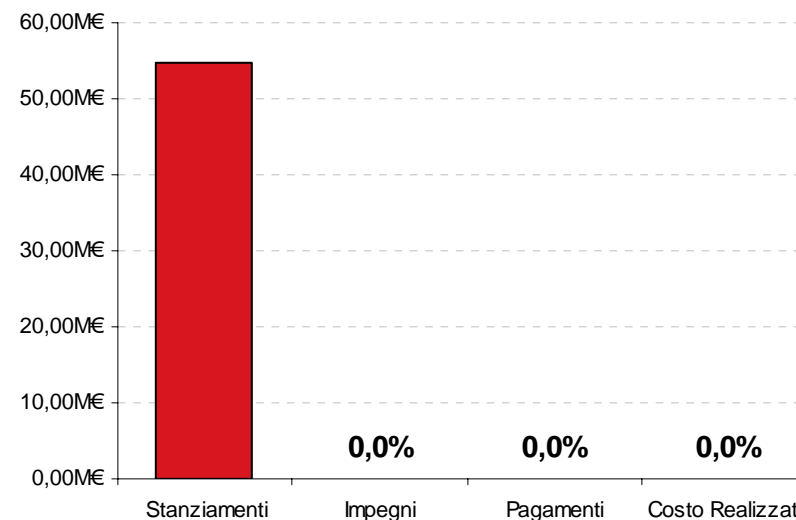

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2006

2 - 128 - Trasversale sarda - Collegamento Oristano/Tortoli - 1° lotto 1° stralcio - Lavori di adeguamento della SP Sarule-Mamoiada

Somma stanziata: € 10.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione preliminare

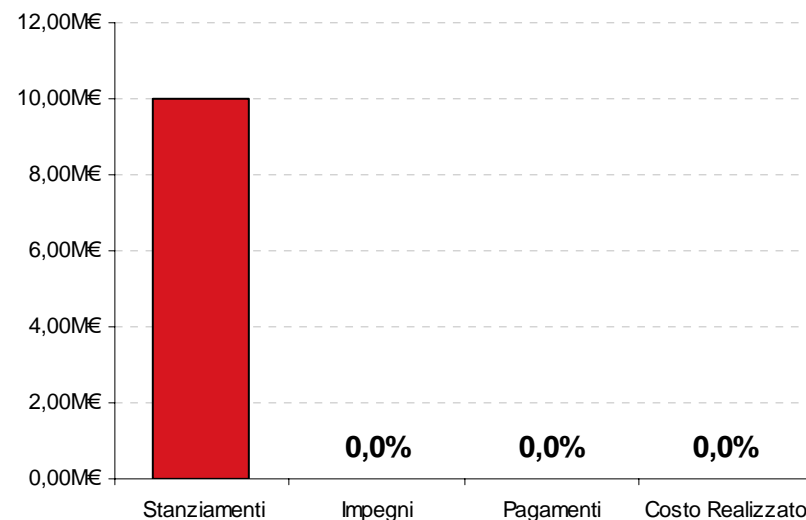

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 16 DICEMBRE 2006

3 - 129 - Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per incrementare le possibilità di accesso alle zone costiere da parte dei comuni interni più prossimi, al fine di integrare e rafforzare le potenzialità di sviluppo turistico

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

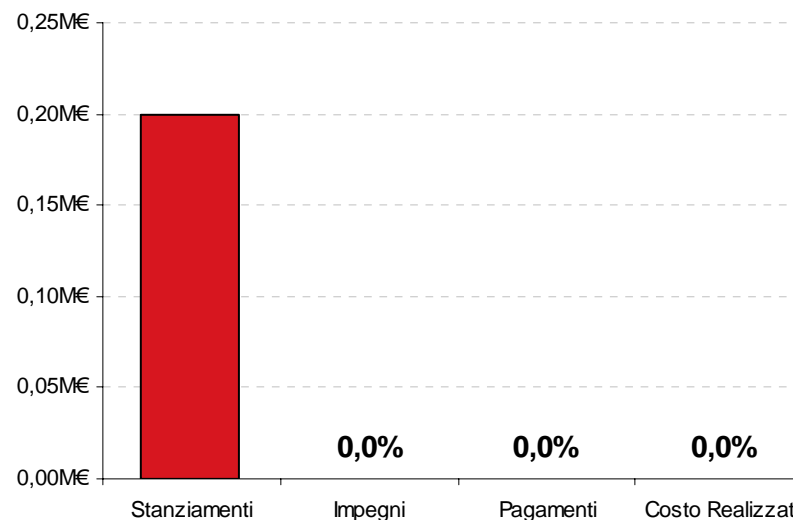

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 2006

4 - 130 - Studio per la razionalizzazione e ottimizzazione delle connessioni viarie tra il Sulcis-Iglesiente e l'Oristanese

Somma stanziata: € 100.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

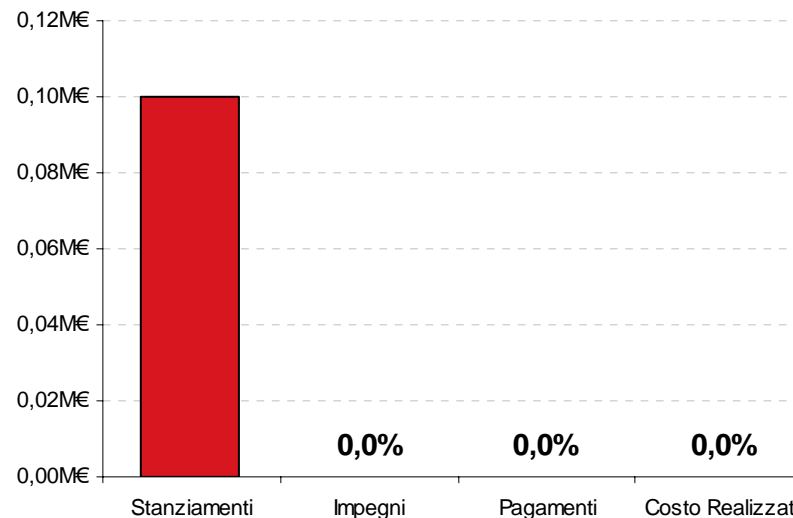

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 18 DICEMBRE 2006

5 - 131 - SS 131 "Cagliari-Sassari" tratto km 23+885 e km 32+412 Sovrappasso sulla SS 131 della strada comunale Muracesus nel territorio di Nuraminis

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione preliminare

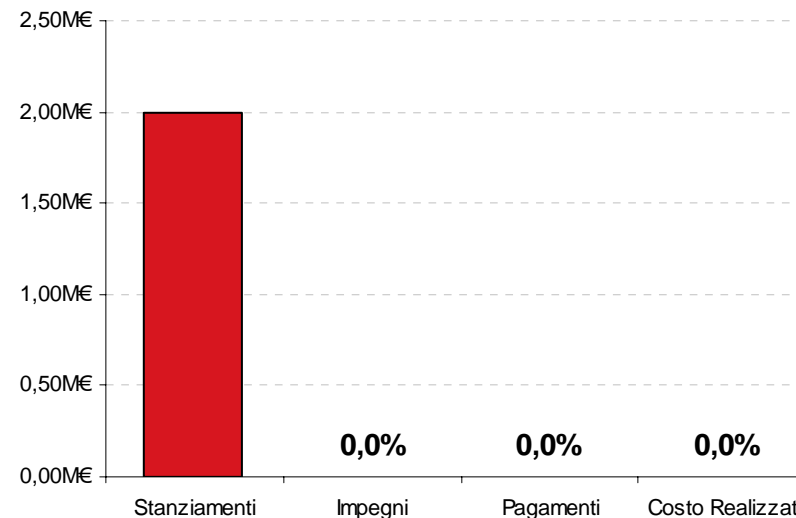

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 19 DICEMBRE 2006

6 - 132 - SS 131 "Cagliari-Sassari" Innesto della variante di Sassari-Truncu Reale-Porto Torres al km 209+400

Somma stanziata: € 2.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

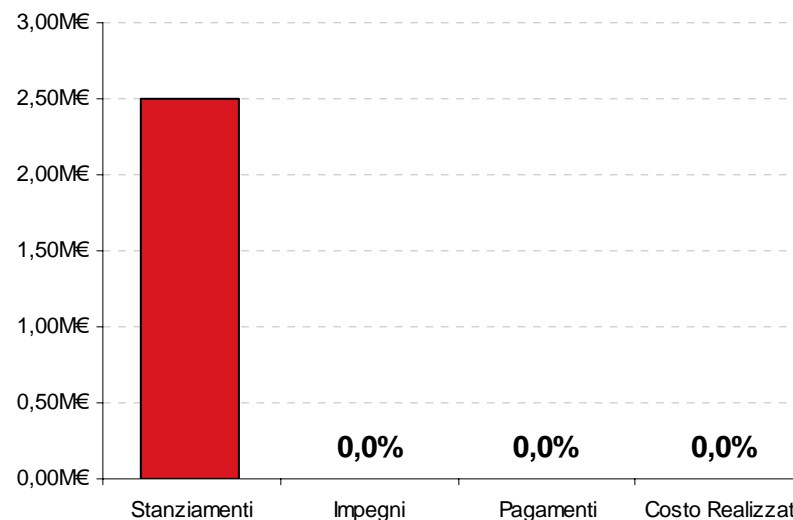

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 20 DICEMBRE 2006

7 - 133 - SS 125 "Cagliari-Olbia" Ponte sul rio Padrongianus al km 311+860

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

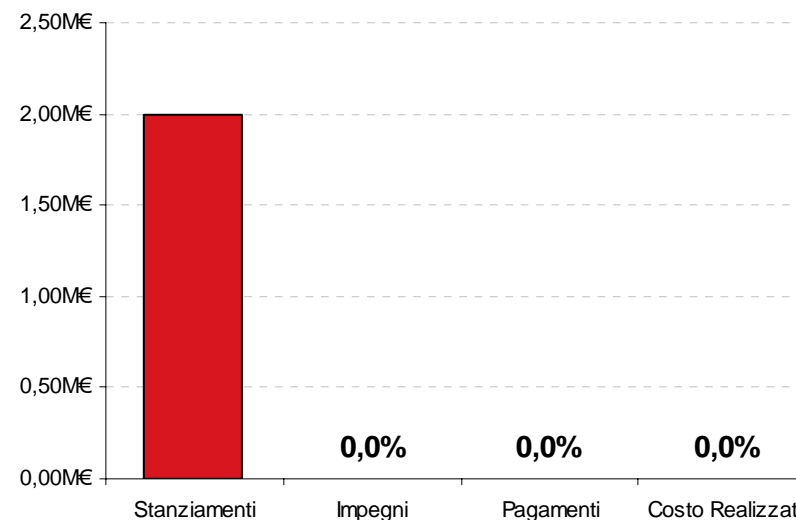

5.2 VIABILITÀ

II ATTO INTEGRATIVO 21 DICEMBRE 2006

8 - 134 - SS 128 "Messa in sicurezza dei punti critici della SS 128 nei tratti Senorbì-Isili

Somma stanziata: € 6.439.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessun interventi

