



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **6 - APQ Mobilità**

**Assessorato dei Trasporti**

**Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006**



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi

6 - Mobilità

# 6 MOBILITÀ

## APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

### Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	<b>APQ Originario</b>
1	1 - AP CA-01 - Dragaggio a -16 metri bacino di evoluzione del porto canale
2	2 - AP CA-02 - Manutenzione straordinaria dente di attracco Molo Rinascita
3	3 - AP CA-03 - I Lotto opere di infrastrutturazione avamposti Porto Canale
4	4 - AP CA-04 - Realizzazione darsena Porto Foxi – Sarroch
5	5 - AP CA-05 - Realizzazione di una struttura sul Molo Ichnusa per l'accoglimento dei crocieristi - Cagliari
6	6 - AP CA-06 - Realizzazione darsena pescherecci - Cagliari
7	7 - AP CA-07 - Adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo lato est - Cagliari
8	8 - AP CA-08 - Manutenzione Straordinaria Fabbricato "Centro Servizi" - Cagliari
9	9 - AP CA-09 - Banchinamento lato di ponente del Porto Canale - I Lotto - Cagliari
10	10 - AP OL-GA01 - Porto di Olbia - Approfondimenti del bacino portuale lato nord
11	11 - AP OL-GA02 - Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione del porto pescherecci
12	12 - ENAC-AL-01 - Aeroporto di Alghero: sistema di controllo 100% bagagli da stiva.
13	13 - ENAC-AL-02 - Aeroporto di Alghero - Riqualfica via di rullaggio 1° lotto
14	14 - ENAC-CA-01 - Aeroporto di Cagliari Aerostazione passeggeri 2^ fase
15	15 - ENAC-CA-02 - Aeroporto di Cagliari: Sistema controllo 100% bagagli da stiva
16	16 - ENAC-CA-03 - Aeroporto Cagliari: Riqualficazione aeroporto classe ICAO (pista principale)
17	17 - ENAC-OL-01 - Aeroporto di Olbia: Sistema di controllo 100% bagagli da stiva
18	18 - ENAV-AL/01 - Aeroporto di Alghero: ammodernamento sistema ATC
19	19 - ENAV-OL/01 - Ammodernamento Sistema ATC-Aeroporto Olbia
20	20 - MIT 01 - Porto di Porto Torres - Realizzazione di una struttura da adibire a terminal portuale a servizio dei vettori industriali
21	21 - MIT 02 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo necessario al mantenimento dei fondali del porto commerciale
22	22 - MIT 03 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo del fondale antistante la nuova banchina ASI
23	23 - MIT 04 - Porto di Porto Torres - Impianto di condizionamento nell'edificio sede della Capitaneria di Porto
24	24 - MIT 05 - Porto di Olbia - Sistemazione del Lungomare via Genova molo Brin
25	25 - MIT 06 - Porto di Olbia - Ripristino e completamento delle soglie guardiane sulla banchina dell'Isola Bianca
26	26 - MIT 07 - Porto di Porto Torres - Fornitura ed installazione parabordi nel terzo accosto del porto industriale
27	27 - MIT 08 - Porto di Porto Torres - (SS A 407) - Nuovo Molo di Levante per costruire l'avamposto del porto commerciale



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
28	28 - MIT 09 - Cagliari (CA A 301) - Lavori di manutenzione straordinaria ex deposito AGIP con nuova destinazione ad abitazione
29	29 - MIT 10 - Cagliari (CA A 288) - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria edificio della Capitaneria di Porto di Piazza Deffenu
30	30 - MIT 11 - Cagliari - Pavimentazione dell'area demaniale in uso alla Guardia di Finanza sita in località Su Siccu
31	31 - MIT 12 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo
32	32 - MIT 13 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione della caserma Barletta in uso Squadriglio Navale Guardia di Finanza
33	33 - RAS 01 - Ottimizzazione accessibilità Stazione Ferroviaria di Macomer tramite sottovia carrabile
34	34 - RAS 02/a - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P 21/04/99 per il risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale
35	35 - RAS 02/b - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P.1 21/04/99 per il risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale
36	36 - RAS 03/a - Tortolì - Adeguamento aeroporto
37	37 - RAS 03/b - Tortolì - Adeguamento aeroporto
38	38 - RAS 04 - Ampliamento piazzale di sosta aeromobili e relative strutture logistiche (Lotto 1°) Aeroporto Olbia-Costa Smeralda
39	39 - RAS 05 - Lavori di completamento dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda
40	40 - RAS 06 - Ristrutturazione vecchia aerostazione Aeroporto Alghero-Fertilia
41	41 - RAS 08 - Zona di sicurezza (resa) testata 32 pista principale mediante colmata stagno Aeroporto Cagliari Elmas
42	42 - RAS 09 - Adeguamento pista di volo sussidiaria, comprese aree di sicurezza di testata (resa) e tombamento canale di guardia Aeroporto Cagliari-Elmas
43	43 - RFI 01 - Ammodernamento e velocizzazione Rete sarda - Telecomando della rete sarda (SCC)
44	44 - RFI 02 - Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda - Variante Chilivani
45	45 - RFI 03 - Raddoppio Decimomannu - San Gavino
46	46 - RFI 04 - Riqualificazione e mantenimento stazioni/fermate - Macomer - Oristano - Abbasanta - Siliqua - Villamassargia e 1° fase nuova stazione di Olbia nonché 1° fase interventi servizio metropolitano CA Decimomannu
47	<b>I Atto Integrativo</b>
47	1 - ENAC AL05 - Aeroporto di Alghero: Sistema di controllo perimetrale e completamenti operativi
48	2 - ENAC OL04 - Aeroporto di Olbia: Completamento nuovo piazzale di sosta aeromobili e sistema di controllo perimetrale
49	3 - ENACAL0301 - Aeroporto di Alghero: Ampliamento piazzali sosta aeromobili
50	4 - ENACAL0302 - Aeroporto di Alghero: Riqualifica pista di volo
51	5 - ENACAL0303 - Aeroporto di Alghero: Completamento riqualifica via di rullaggio



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
<b>52</b>	<b>II Atto Integrativo</b>
52	1 - RAS 04-INT - Aeroporto di Oristano Fenosu - Adeguamento pista di volo
53	2 - RAS 05-INT - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - Materiale rotabile: acquisto n. 3 composizioni del treno metropolitano + n. 1 locotrattore - di proprietà regionale
54	3 - RAS 06-INT - Stazione intermodale passeggeri Carbonia - integrazione treno-bus e interventi di sostegno alla pendolarità
55	4 - RAS 07-INT - Lotto funzionale infrastrutture trasporto pubblico Comune di Nuoro (deposito, parcheggi, uffici)
56	5 - RAS 08-INT - Ammodernamento e velocizzazione tratta ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia e rivitalizzazione stazioni impresenziate
57	6 - RAS 09-INT - Servizio Metropolitano su Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile - Acquisto n. 1 treno tipo "Minuetto" proprietà regionale
<b>58</b>	<b>III Atto Integrativo</b>
58	1 - CIPE35/01 - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - acquisto materiale rotabile - tipo "Minuetto"
59	2 - CIPE35/01b - Miglioramento dell'accessibilità alle località di servizio nella tratta ferroviaria Sassari e Porto Torres
60	3 - CIPE35/02 - Oristano - Centro Intermodale passeggeri + Stazione interscambio
61	4 - CIPE35/03 - Centro intermodale passeggeri – Macomer
62	5 - CIPE35/04 - Centro intermodale passeggeri Nuoro
63	6 - CIPE35/05 - Stazione di interscambio San Gavino Sanluri - Recupero e adeguamento stazione d'interscambio FdS
64	7 - CIPE35/06 - Iglesias - Centro intermodale Passeggeri - 1° Lotto
65	8 - CIPE35/07 - Collegamento aeroporto di Alghero linea FdS Alghero - Sassari – progettazione e 1° lotto
66	9 - CIPE35/08 - Circonvallazione ferroviaria di Olbia - collegamento area industriale - Studio di fattibilità e adeguamento Progetto preliminare - 1^ fase
67	10 - CIPE35/09a - Cagliari Elmas - Collegamento fermata RFI con Aeroporto - parte SO.G.AER S.p.A.
68	11 - CIPE35/09b - Realizzazione fermata RFI - Aeroporto di Elmas - parte R.F.I.
69	12 - CIPE35/10 - Servizio metropolitana leggera su area vasta di Cagliari - Studio di fattibilità
70	13 - LLPP/01 - Realizzazione del banchinamento per il secondo attracco per navi traghetto a ridosso del molo di levante del porto di Arbatax
71	14 - LLPP/02 - Lavori di completamento del porto turistico di Porto Torres
72	15 - LLPP/03 - Lavori di completamento dei banchinamenti interni del porto di Carloforte
73	16 - LLPP/04 - Dragaggio sistema portuale del Basso Sulcis porti di S. Antioco - Portovesme - Carloforte – Calasetta Sarroch-Perd'e Sali
74	17 - LLPP/05 - Interventi per la messa in sicurezza secondo i parametri ISPS dei porti di Carloforte - Calasetta e Portovesme
75	18 - LLPP/06 - Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala Mangiavolpe a La Maddalena
76	19 - LLPP/07 - Studio di fattibilità sul completamento della rete portuale turistica isolana con riferimento ai quadranti Nord-Occidentale, Nord-Orientale, Sud-Occidentale e Sud-Orientale



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

---

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
77	20 - RFI-06 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari
78	21 - RFI-07 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura di Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari
79	22 - RFI-08 - Soppressione passaggi a livello
80	23 - RFI-09 - Ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria (FF.S.) <i>Cagliari - Oristano</i>



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 1 - Sistema Portuale - AP CA-01 - Dragaggio a -16 metri bacino di evoluzione del porto canale

**Somma stanziata:** € 15.622.821,20

**Somma impegnata:** € 15.622.821,20

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 14.852.821,20

% realizzato su stanziato: 95,07%

**Pagamenti:** € 12.674.285,97

% pagato su stanziato: 81,13%

**Stato di attuazione:** Collaudo

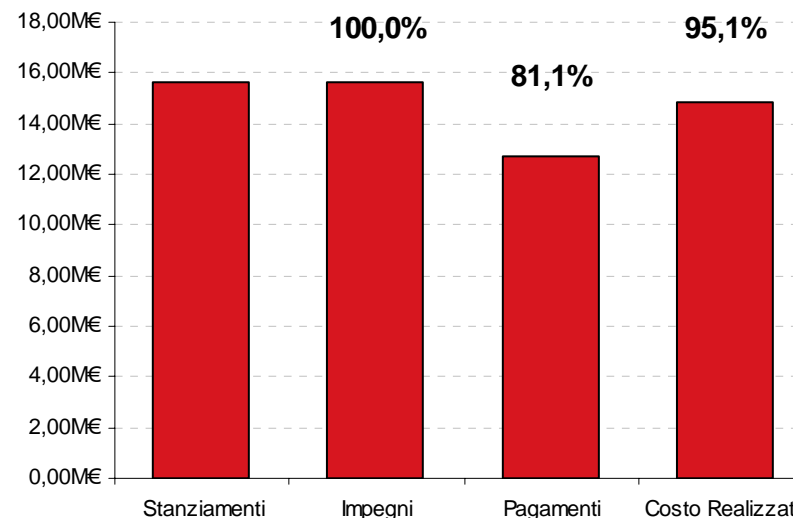

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

## 2 – Sistema Portuale - AP CA-02 - Manutenzione straordinaria dente di attracco Molo Rinascita

Somma stanziata: € 1.552.852,00

Somma impegnata: € 1.552.852,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.552.852,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Collaudo

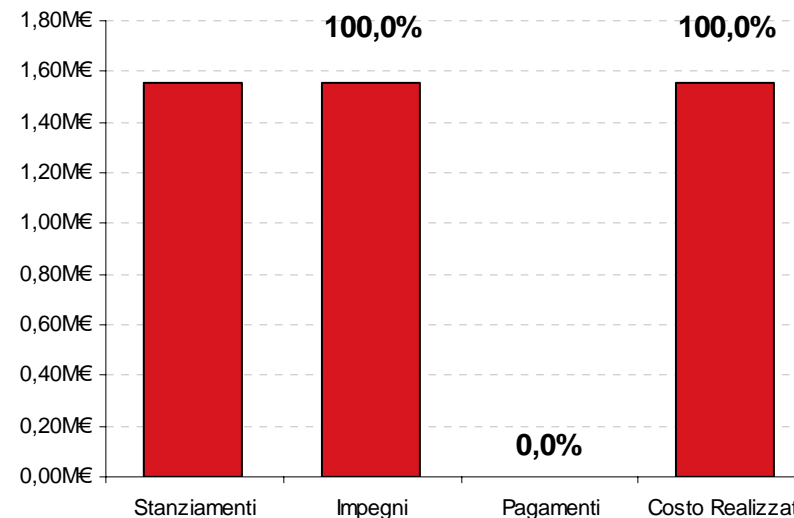

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

### 3 - Sistema Portuale - AP CA-03 - I Lotto opere di infrastrutturazione avamposti Porto Canale

**Somma stanziata:** € 9.894.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione definitiva

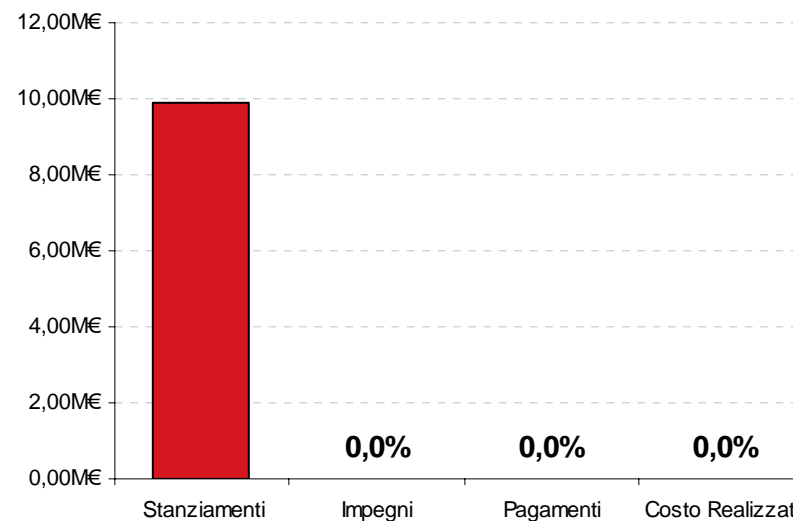



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 4 - Sistema Portuale - AP CA-04 - Realizzazione darsena Porto Foxi – Sarroch

**Somma stanziata:** € 5.145.963,81

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione definitiva

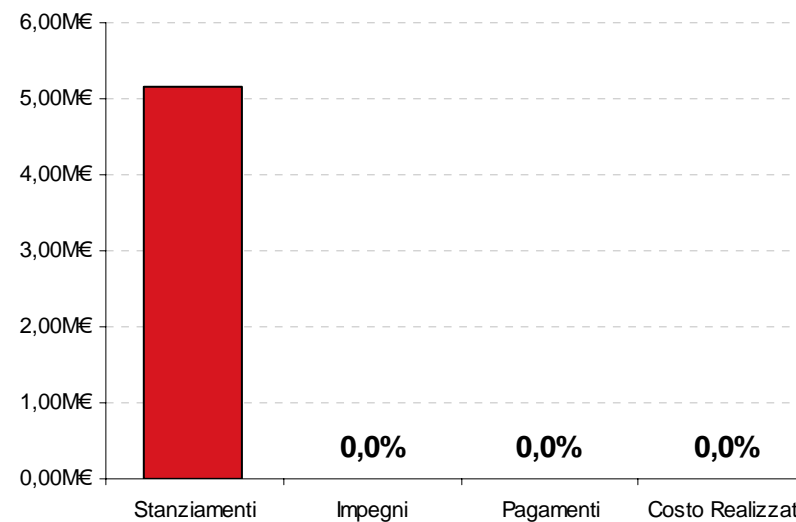

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 5- Sistema Portuale - AP CA-05 - Realizzazione di una struttura sul Molo Ichnusa per l'accoglimento dei crocieristi - Cagliari

Somma stanziata: € 4.339.584,00

Somma impegnata: € 3.818.779,01

% impegnato su stanziato: 88%


Costo realizzato: € 3.700.000,00

% realizzato su stanziato: 85,26%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 85%

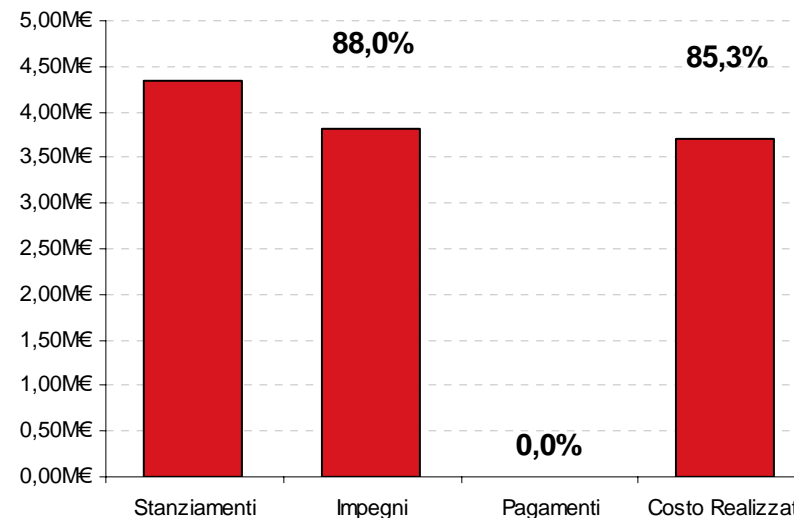

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 6- Sistema Portuale - AP CA-06 - Realizzazione darsena pescherecci - Cagliari

**Somma stanziata:** € 6.992.486,08

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione definitiva

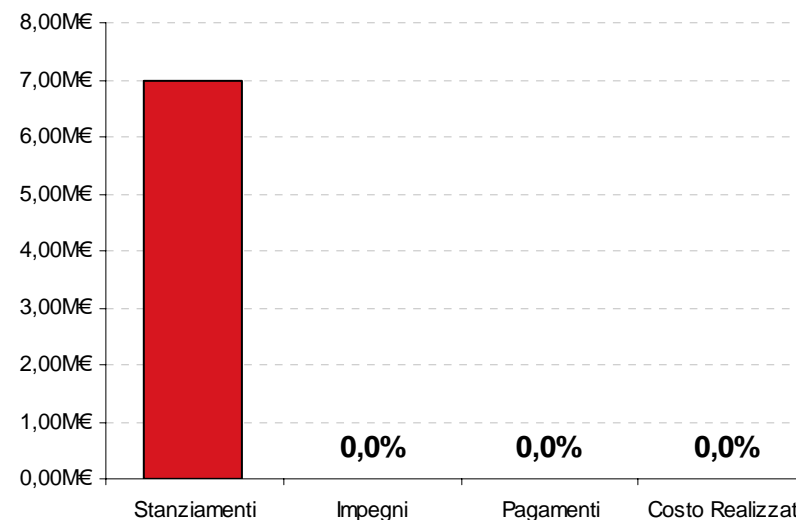

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 7- Sistema Portuale - AP CA-07 - Adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo lato est - Cagliari

Somma stanziata: € 7.331.604,84

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

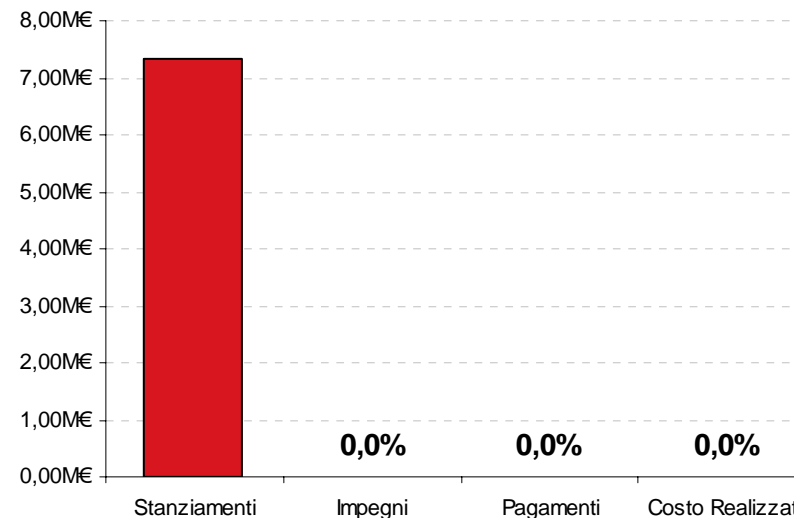

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 8- Sistema Portuale - AP CA-08 - Manutenzione Straordinaria Fabbricato "Centro Servizi" - Cagliari

Somma stanziata: € 1.177.594,42

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

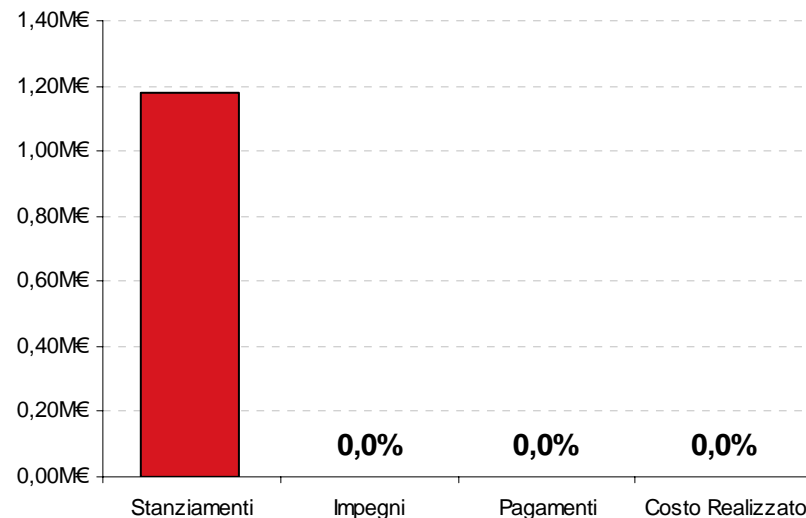

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 9- Sistema Portuale - AP CA-09 - Banchinamento lato di ponente del Porto Canale - I Lotto - Cagliari

Somma stanziata: € 23.797.152,90

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto lavori

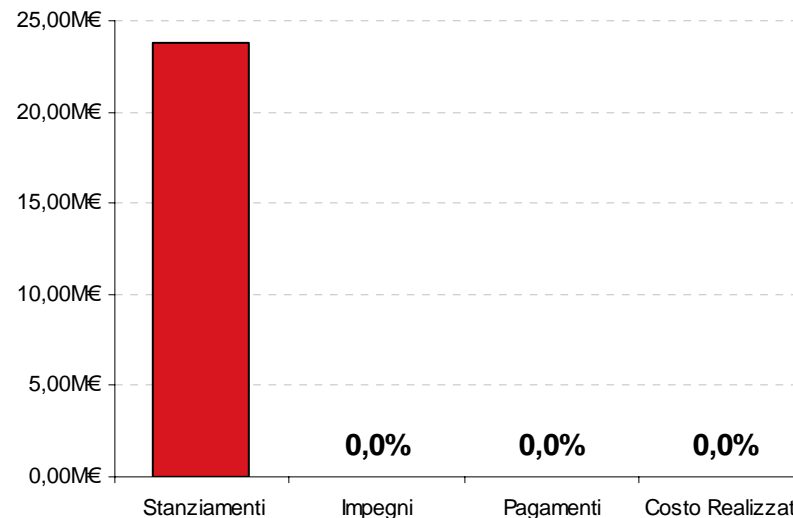

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 10- Sistema Portuale - AP OL-GA01 - Porto di Olbia - Approfondimenti del bacino portuale lato nord

Somma stanziata: € 15.450.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione preliminare

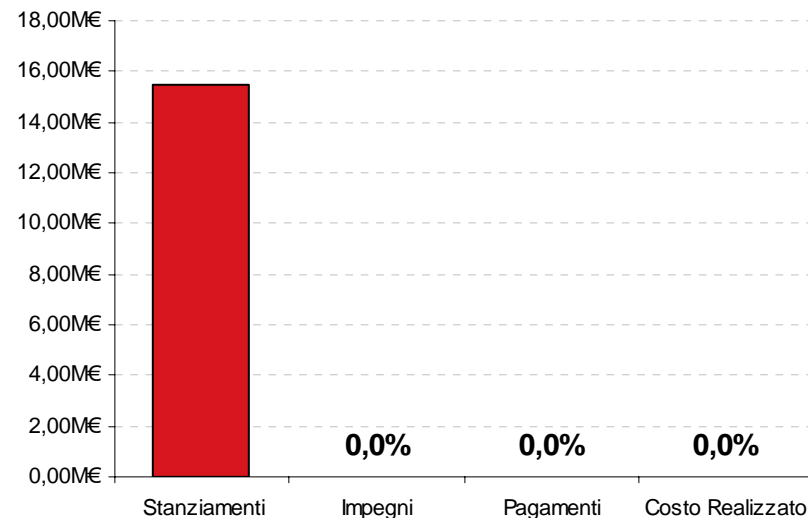

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 11- Sistema Portuale - AP OL-GA02 - Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione del porto pescherecci

Somma stanziata: € 3.300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

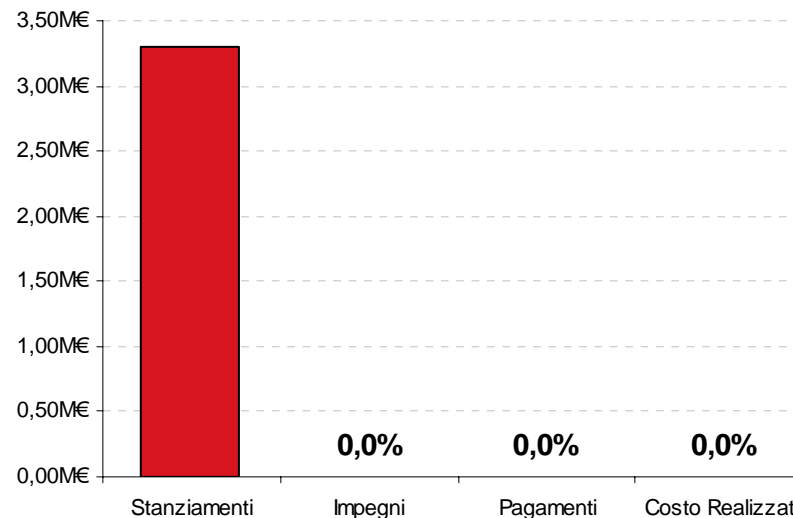



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 12- Sistema Portuale - ENAC-AL-01 - Aeroporto di Alghero: sistema di controllo 100% bagagli da stiva.

**Somma stanziata:** € 331.782,99

**Somma impegnata:** € 331.782,99

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 331.782,99

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 331.782,99

% pagato su stanziato: 100%

**Stato di attuazione:** Concluso

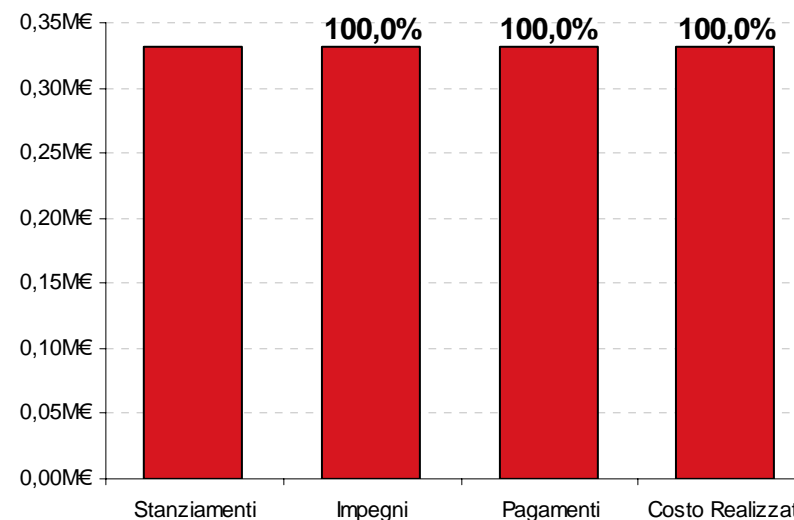

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

### 13- Sistema Portuale - ENAC-AL-02 - Aeroporto di Alghero - Riqualfica via di rullaggio 1° lotto

Somma stanziata: € 3.616.500,08

Somma impegnata: € 3.616.500,08

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.616.500,08

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 3.446.822,47

% pagato su stanziato: 95,31%

Stato di attuazione: Collaudo

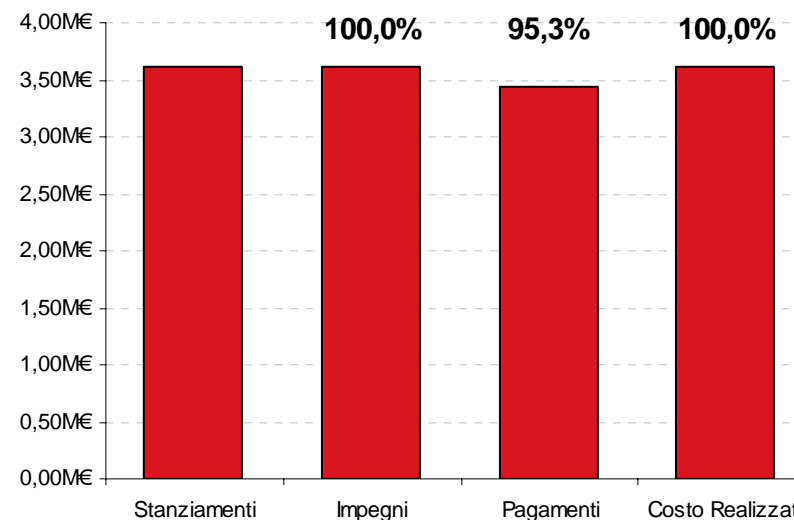

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 14- Sistema Portuale - ENAC-CA-01 - Aeroporto di Cagliari Aerostazione passeggeri 2<sup>a</sup> fase

**Somma stanziata:** € 43.500.000,00

**Somma impegnata:** € 43.500.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 43.500.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 41.276.221,93

% pagato su stanziato: 94,89%

**Stato di attuazione:** Concluso

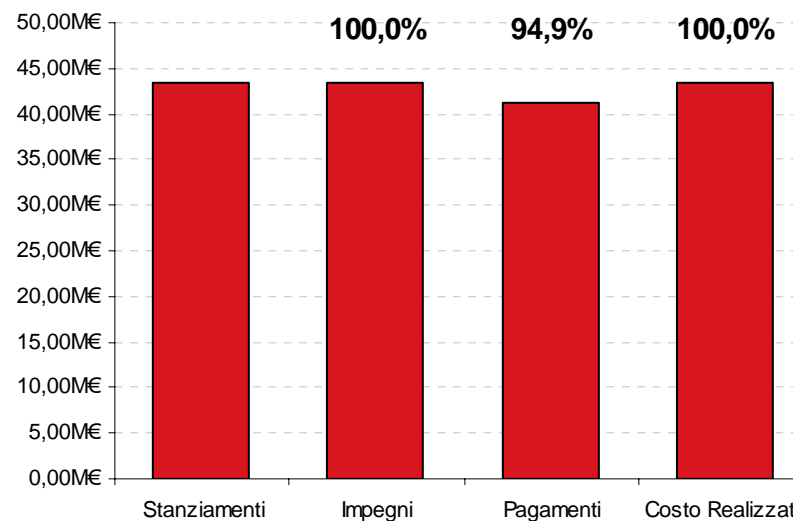

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 15- Sistema Portuale - ENAC-CA-02 - Aeroporto di Cagliari: Sistema controllo 100% bagagli da stiva

Somma stanziata: € 446.000,00

Somma impegnata: € 446.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 446.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 433.120,00

% pagato su stanziato: 97,11%

Stato di attuazione: Concluso

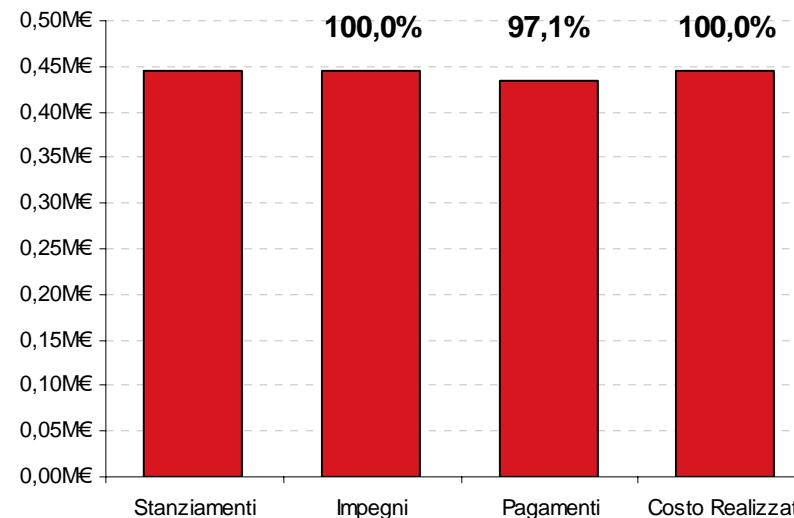

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 16- Sistema Portuale - ENAC-CA-03 - Aeroporto Cagliari: Riqualificazione aeroporto classe ICAO (pista principale)

Somma stanziata: € 25.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto lavori

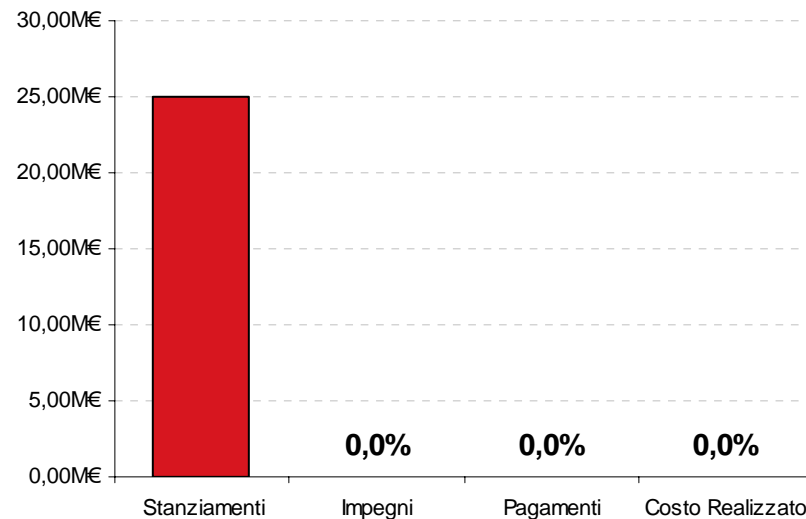

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 17- Sistema Portuale - ENAC-OL-01 - Aeroporto di Olbia: Sistema di controllo 100% bagagli da stiva

Somma stanziata: € 3.029.000,00

Somma impegnata: € 3.029.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.029.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Concluso

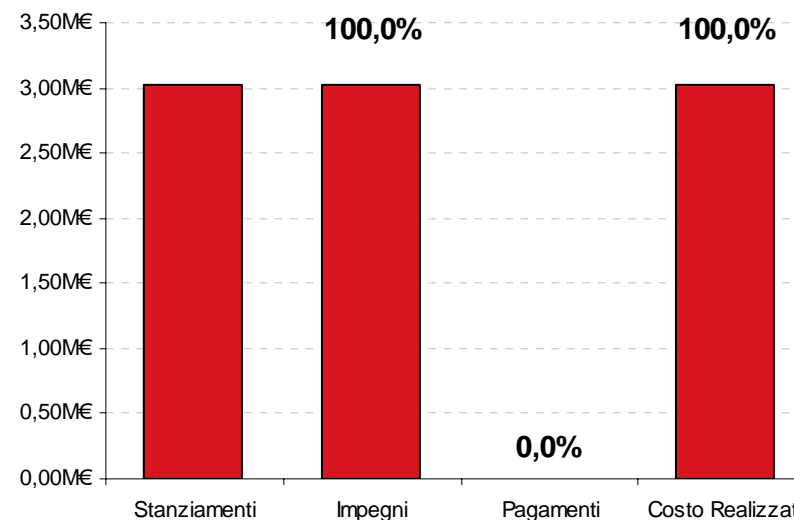

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 18- Sistema Portuale - ENAV-AL/01 - Aeroporto di Alghero: ammodernamento sistema ATC

**Somma stanziata:** € 8.983.436,15

**Somma impegnata:** € 8.983.436,15

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 8.983.436,15

% realizzato su stanziato: 100%

**Pagamenti:** € 8.983.436,15

% pagato su stanziato: 100%

**Stato di attuazione:** Concluso

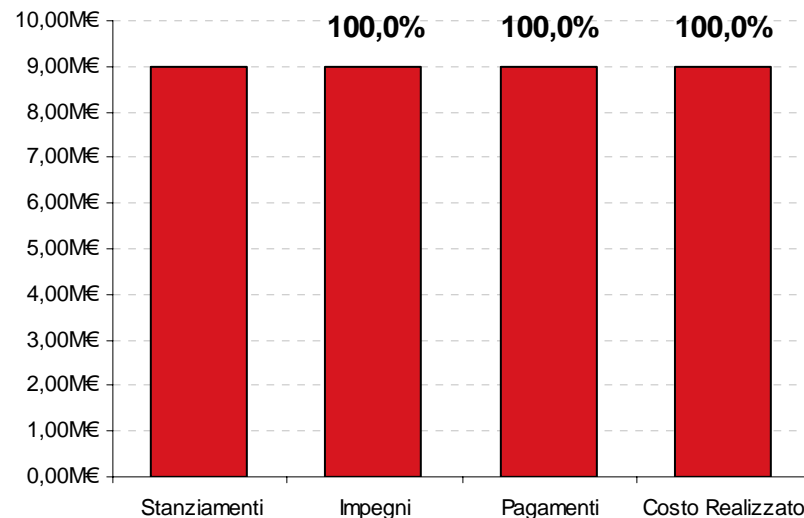

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 19- Sistema Portuale - ENAV-OL/01 - Ammodernamento Sistema ATC-Aeroporto Olbia

**Somma stanziata:** € 26.101.717,04

**Somma impegnata:** € 26.101.717,04

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 23.902.562,33

% realizzato su stanziato: 91,57%

**Pagamenti:** € 23.902.562,33

% pagato su stanziato: 91,57%

**Stato di attuazione:** Collaudo

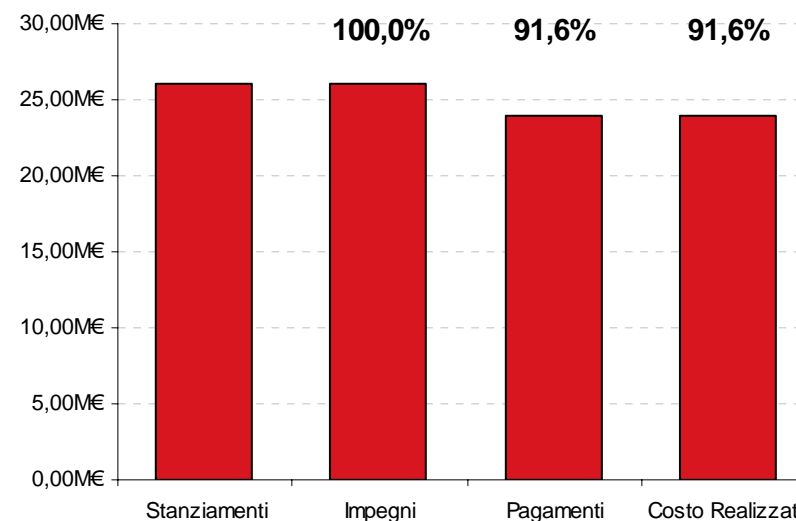



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 20- Sistema Portuale - MIT 01 - Porto di Porto Torres - Realizzazione di una struttura da adibire a terminal portuale a servizio dei vettori industriali

Somma stanziata: € 2.635.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

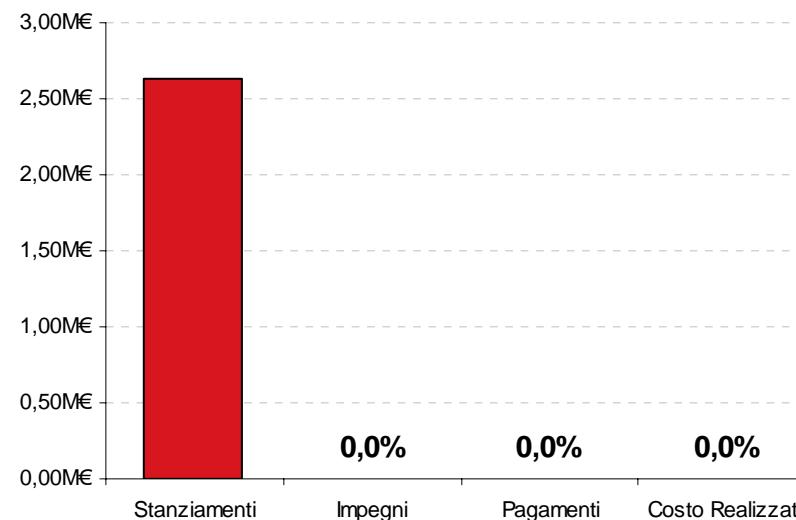

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 21- Sistema Portuale - MIT 02 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo necessario al mantenimento dei fondali del porto commerciale

Somma stanziata: € 2.616.874,63

Somma impegnata: € 2.616.874,63

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.409.534,24

% realizzato su stanziato: 92,08%

Pagamenti: € 2.413.015,48

% pagato su stanziato: 92,21%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 92%

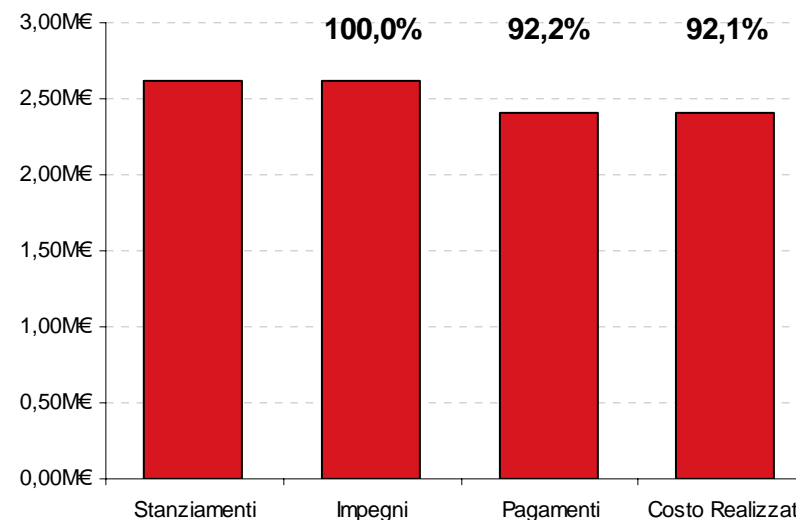

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 22- Sistema Portuale - MIT 03 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo del fondale antistante la nuova banchina ASI

Somma stanziata: € 2.240.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

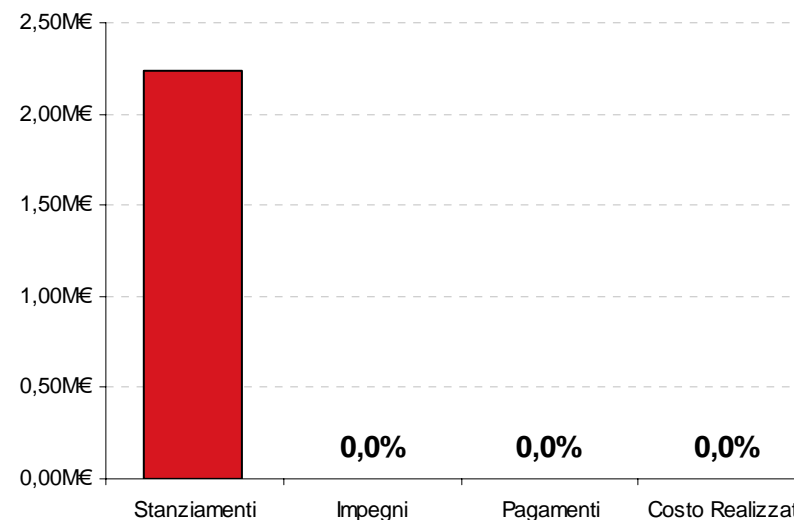

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 23- Sistema Portuale - MIT 04 - Porto di Porto Torres - Impianto di condizionamento nell'edificio sede della Capitaneria di Porto

Somma stanziata: € 165.666,62

Somma impegnata: € 165.666,62

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 165.666,62

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 165.666,62

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

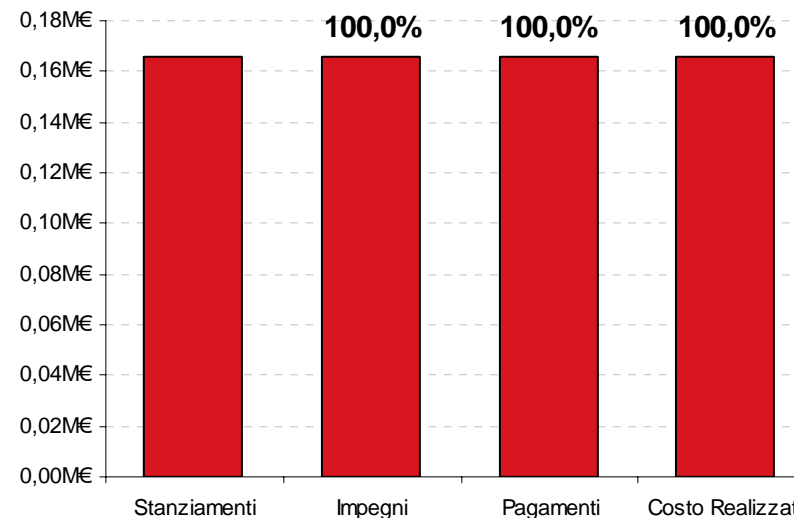

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 24- Sistema Portuale - MIT 05 - Porto di Olbia - Sistemazione del Lungomare via Genova molo Brin

Somma stanziata: € 12.395.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

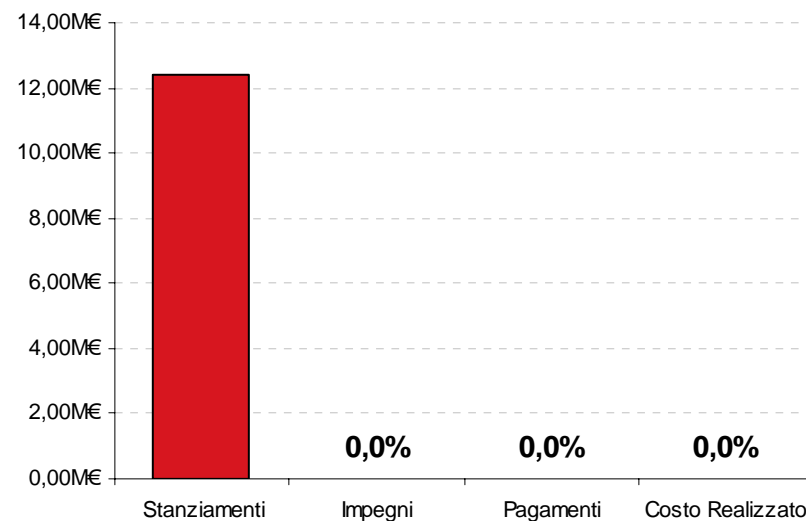

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 25- Sistema Portuale - MIT 06 - Porto di Olbia - Ripristino e completamento delle soglie guardiane sulla banchina dell'Isola Bianca

Somma stanziata: € 3.085.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

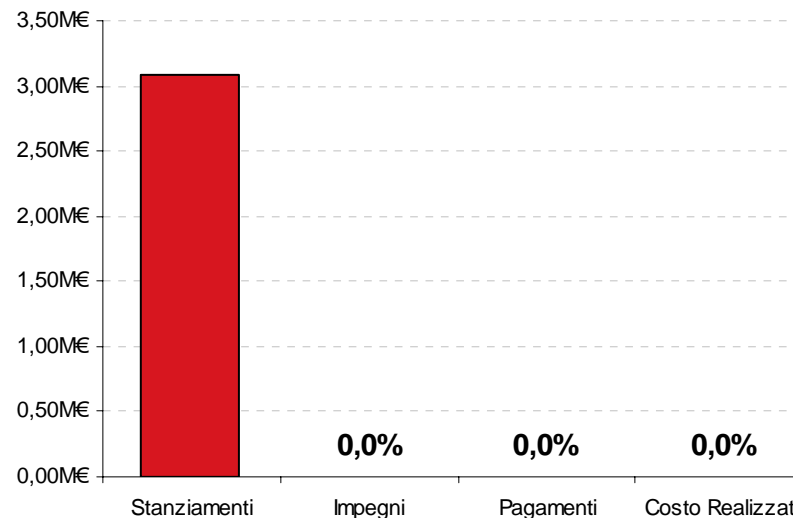

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 26- Sistema Portuale - MIT 07 - Porto di Porto Torres - Fornitura ed installazione parabordi nel terzo accosto del porto industriale

Somma stanziata: € 750.000,00

Somma impegnata: € 750.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 750.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 750.000,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

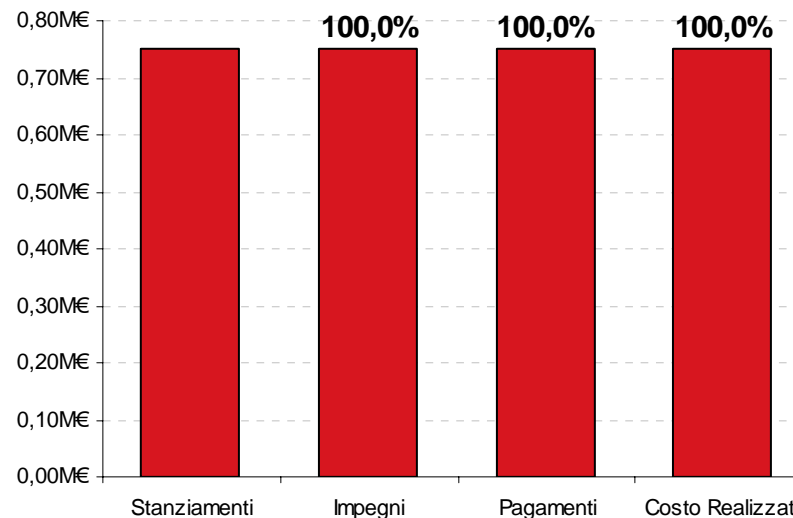

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 27- Sistema Portuale - MIT 08 - Porto di Porto Torres - (SS A 407) - Nuovo Molo di Levante per costruire l'avamposto del porto commerciale

Somma stanziata: € 17.405.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

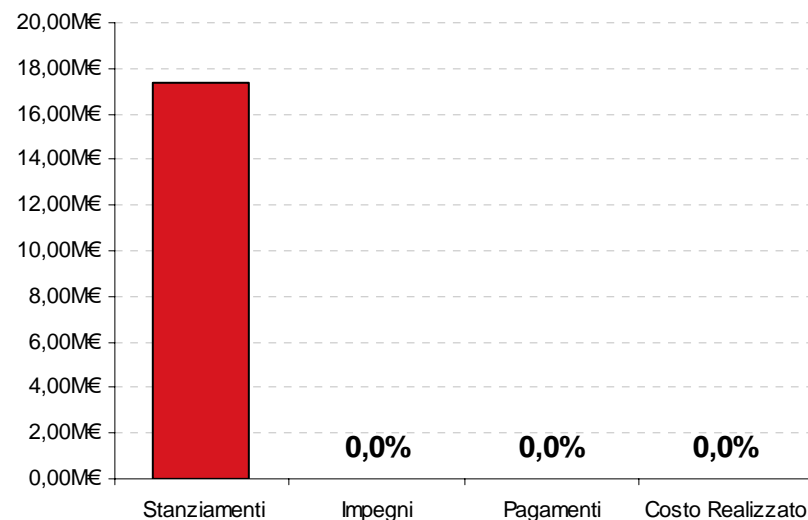



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 28- Sistema Portuale - MIT 09 - Cagliari (CA A 301) - Lavori di manutenzione straordinaria ex deposito AGIP con nuova destinazione ad abitazione

Somma stanziata: € 178.778,00

Somma impegnata: € 178.778,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 178.778,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 178.778,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

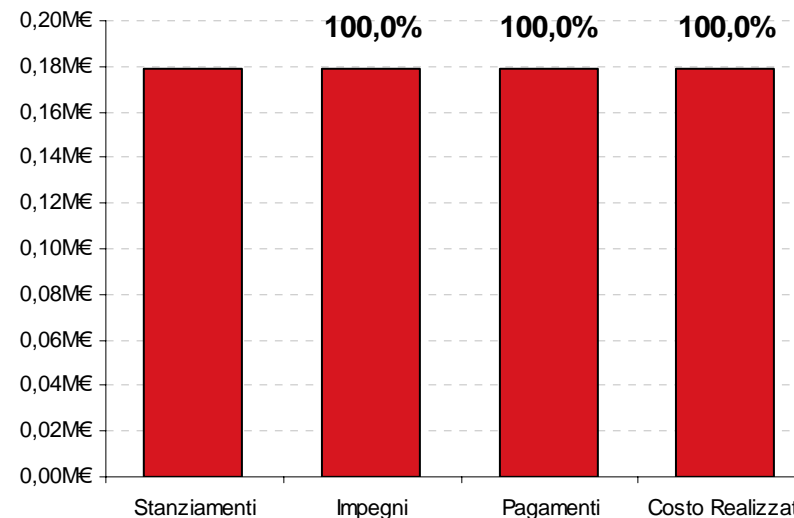

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 29- Sistema Portuale - MIT 10 - Cagliari (CA A 288) - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria edificio della Capitaneria di Porto di Piazza Deffenu

Somma stanziata: € 173.436,43

Somma impegnata: € 173.436,43

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 173.436,43

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 173.436,43

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

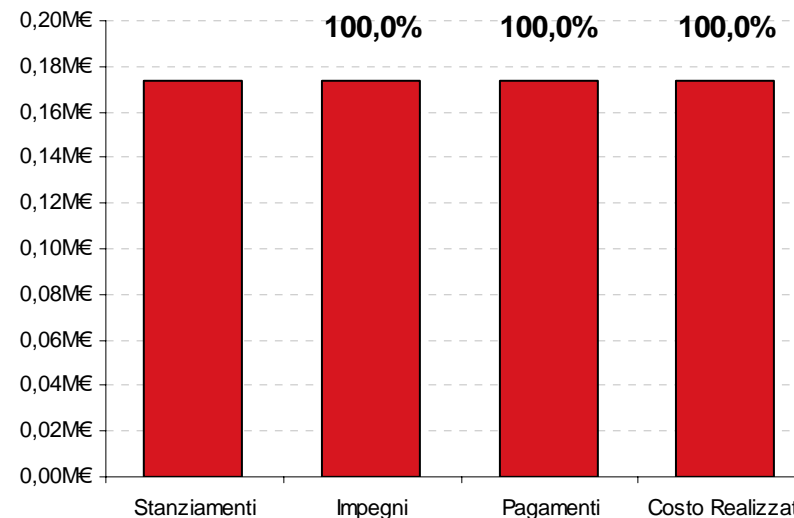

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 30- Sistema Portuale - MIT 11 - Cagliari - Pavimentazione dell'area demaniale in uso alla Guardia di Finanza sita in località Su Siccu

Somma stanziata: € 419.542,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

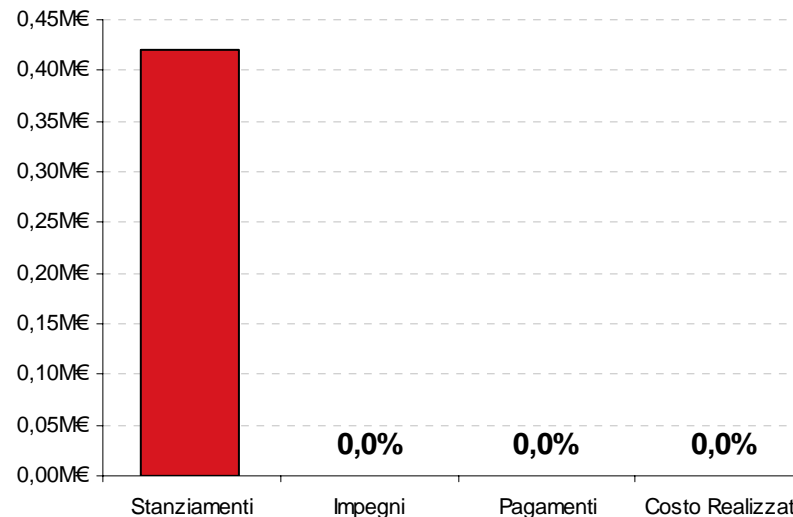

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 31- Sistema Portuale - MIT 12 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo

Somma stanziata: € 192.106,45

Somma impegnata: € 192.106,45

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 89.969,45

% realizzato su stanziato: 46,83%

Pagamenti: € 89.969,45

% pagato su stanziato: 46,83%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 46%

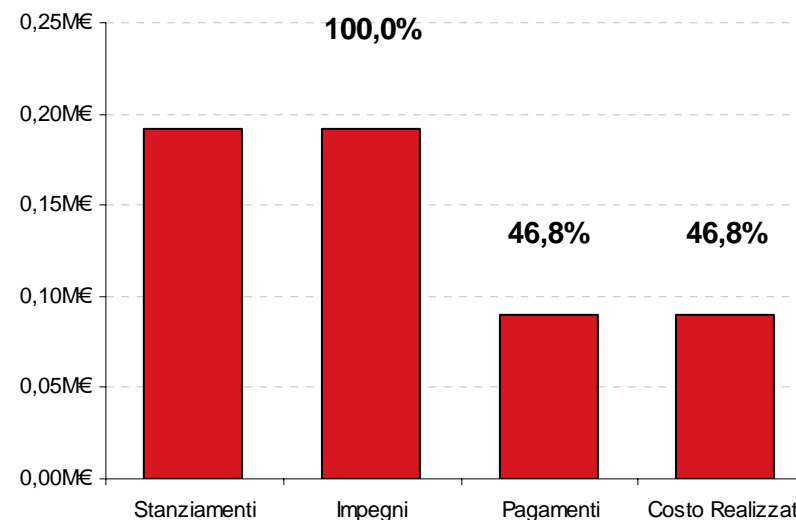

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 32- Sistema Portuale - MIT 13 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione della caserma Barletta in uso Squadriglio Navale Guardia di Finanza

Somma stanziata: € 182.650,00

Somma impegnata: € 0,00


% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

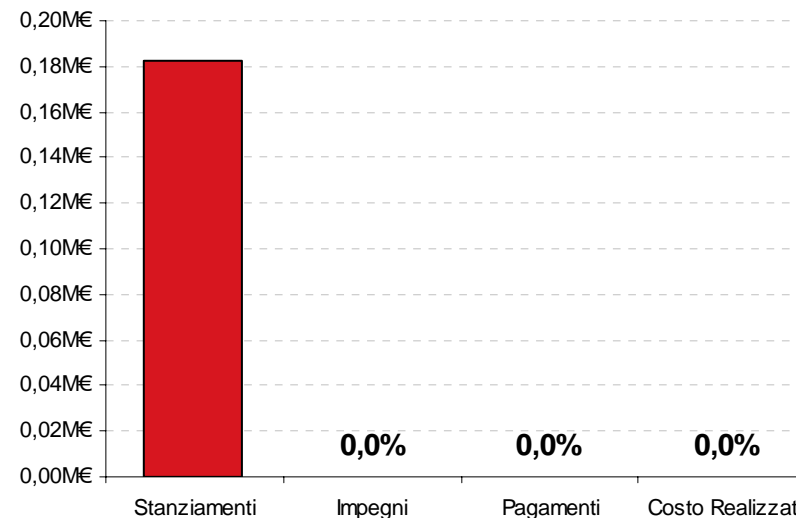

Stato di attuazione: Esecuzione lavori



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 33 - Sistema ferroviario - RAS 01 - Ottimizzazione accessibilità Stazione Ferroviaria di Macomer tramite sottovia carrabile

Somma stanziata: € 2.900.000,00

Somma impegnata: € 2.551.312,29

% impegnato su stanziato: 87,98%


Costo realizzato: € 286.870,03

% realizzato su stanziato: 9,89%

Pagamenti: € 286.870,03

% pagato su stanziato: 9,89%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 10%

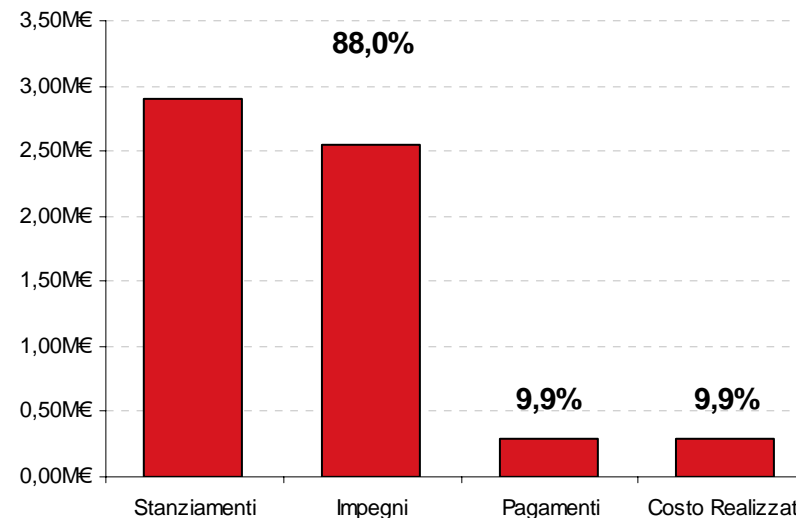

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 34 - Sistema ferroviario - RAS 02/a - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P 21/04/99 per il risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale

Somma stanziata: € 18.480,00

Somma impegnata: € 18.480,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 18.480,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 18.480,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

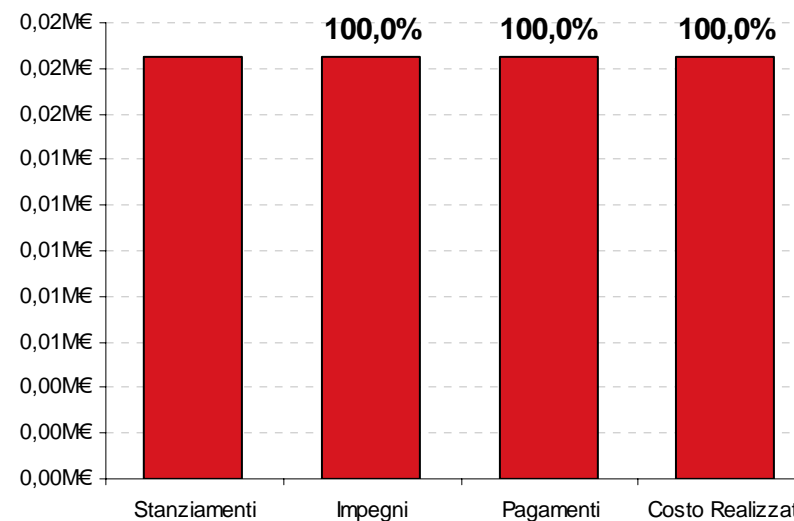

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 35 - Sistema ferroviario - RAS 02/b - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P.I 21/04/99 per il risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) e conseguente passaggio alla gestione regionale

Somma stanziata: € 399.520,00

Somma impegnata: € 5.500,00

% impegnato su stanziato: 1,38%


Costo realizzato: € 4.400,00

% realizzato su stanziato: 1,1%

Pagamenti: € 4.400,00

% pagato su stanziato: 1,1%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 1%

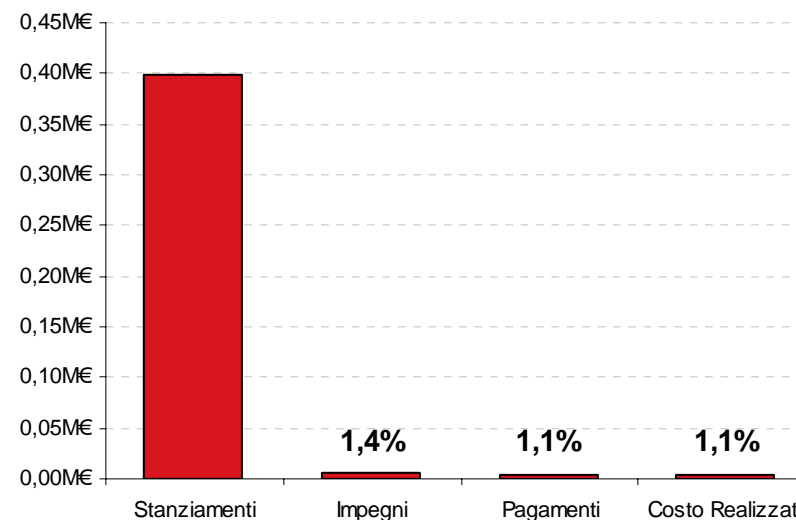



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 36 -Sistema aeroportuale - RAS 03/a - Tortoli - Adeguamento aeroporto

**Somma stanziata:** € 99.000,00

**Somma impegnata:** € 99.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 59.298,26

% realizzato su stanziato: 59,9%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Esecuzione lavori 59%

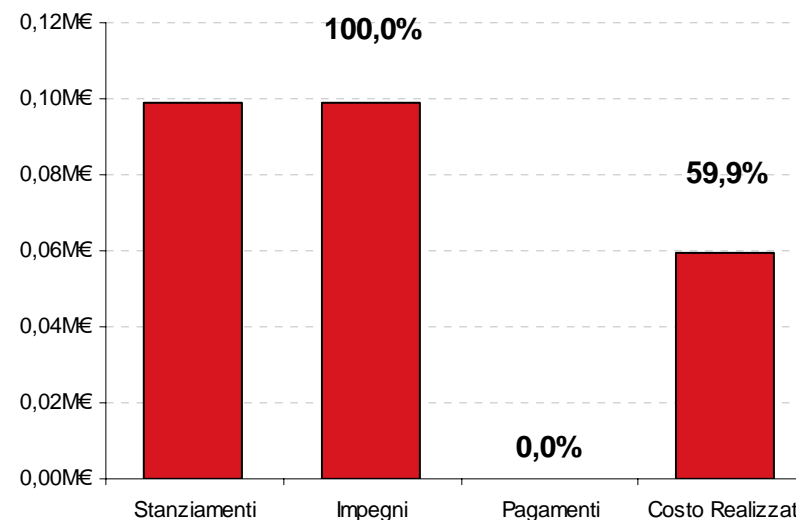

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 37 - Sistema aeroportuale - RAS 03/b - Tortoli - Adeguamento aeroporto

**Somma stanziata:** € 3.072.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** In fase di appalto

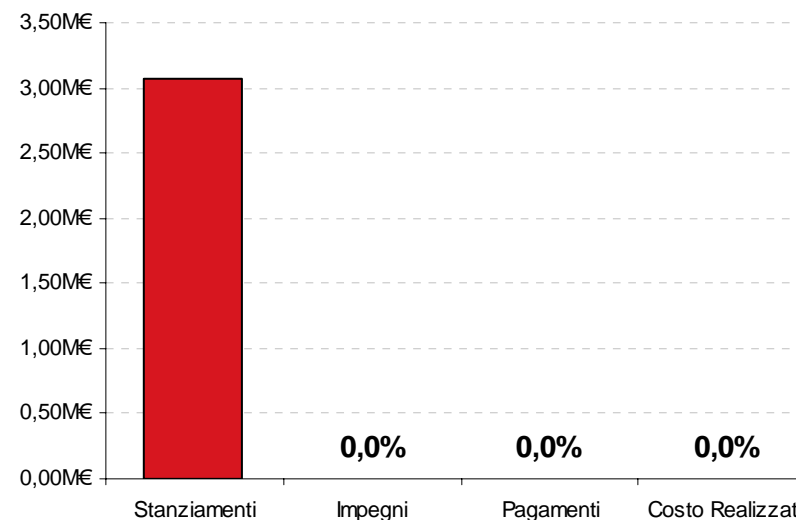

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

### 38-Sistema aeroportuale - RAS 04 - Ampliamento piazzale di sosta aeromobili e relative strutture logistiche (Lotto 1°) Aeroporto Olbia-Costa Smeralda

Somma stanziata: € 8.000.000,00

Somma impegnata: € 4.870.000,00

% impegnato su stanziato: 60,88%


Costo realizzato: € 2.700.000,00

% realizzato su stanziato: 33,75%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 33%

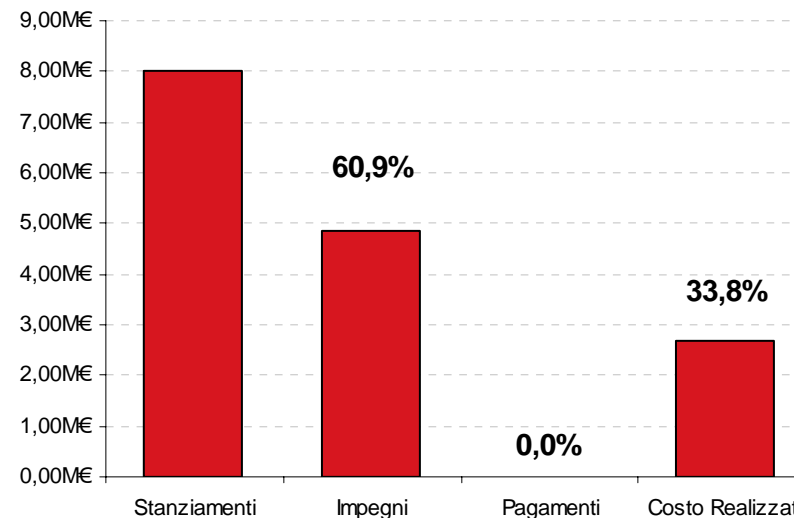

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 39 - Sistema aeroportuale - RAS 05 - Lavori di completamento dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda

Somma stanziata: € 760.000,00

Somma impegnata: € 760.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 580.000,00

% realizzato su stanziato: 76,32%

Pagamenti: € 598.000,00

% pagato su stanziato: 78,68%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 76%

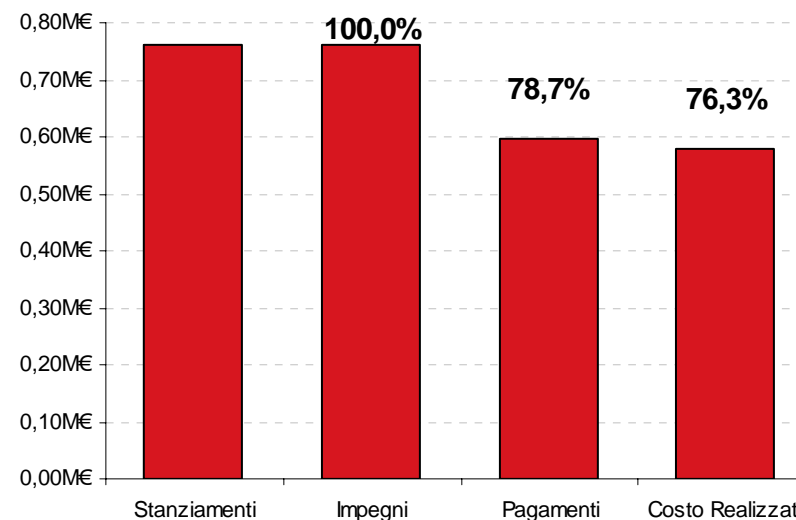

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 40 - Sistema aeroportuale - RAS 06 - Ristrutturazione vecchia aerostazione Aeroporto Alghero-Fertilia

Somma stanziata: € 4.376.893,62

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

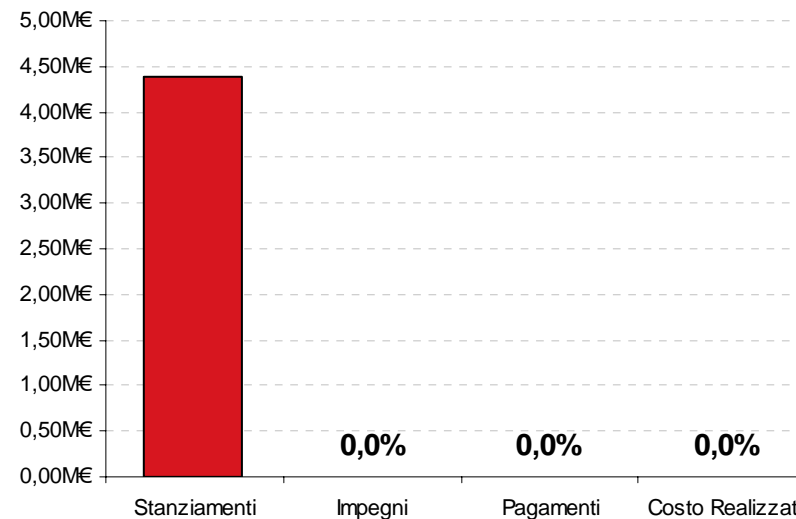

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 41-Sistema aeroportuale - RAS 08 - Zona di sicurezza (resa) testata 32 pista principale mediante colmata stagno Aeroporto Cagliari Elmas

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 2.000.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.600.000,00

% realizzato su stanziato: 80%

Pagamenti: € 1.600.000,00

% pagato su stanziato: 80%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 80%

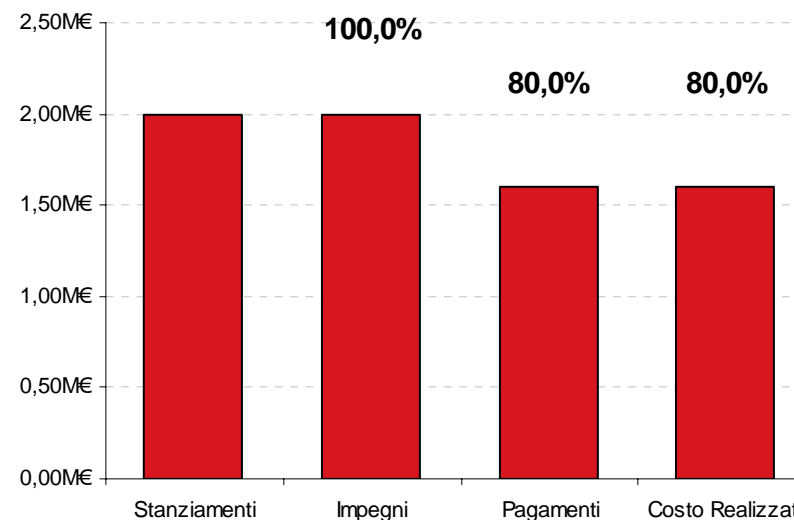

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 42 – Sistema aeroportuale - RAS 09 - Adeguamento pista di volo sussidiaria, comprese aree di sicurezza di testata (resa) e tombamento canale di guardia Aeroporto Cagliari-Elmas

Somma stanziata: € 5.000.000,00

Somma impegnata: € 5.000.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.000.000,00

% realizzato su stanziato: 40%

Pagamenti: € 2.000.000,00

% pagato su stanziato: 40%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 40%

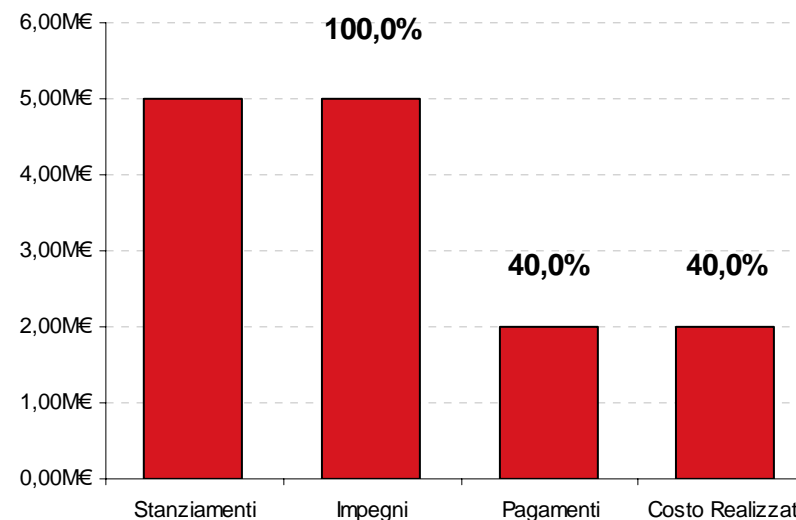

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 43 – Sistema ferroviario - RFI 01 - Ammodernamento e velocizzazione Rete sarda - Telecomando della rete sarda (SCC)

Somma stanziata: € 90.811.000,00

Somma impegnata: € 90.237.754,00

% impegnato su stanziato: 99,37%


Costo realizzato: € 90.237.754,00

% realizzato su stanziato: 99,37%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Collaudo

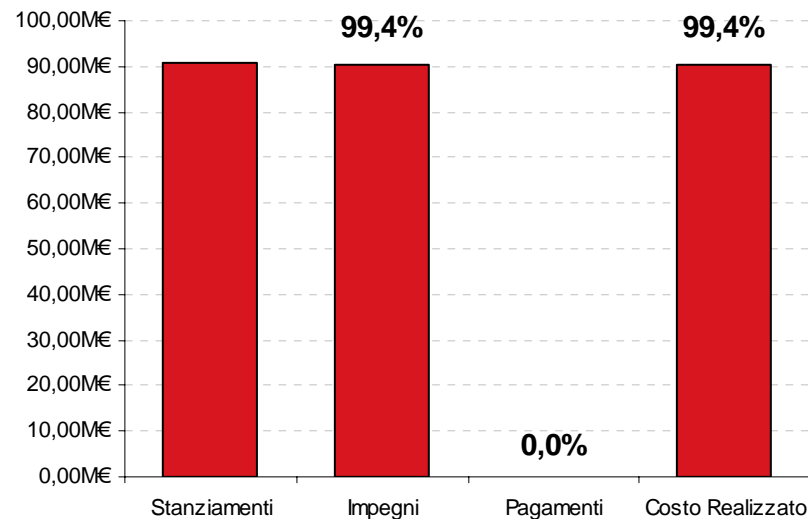



## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 44- Sistema ferroviario - RFI 02 - Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda - Variante Chilivani

Somma stanziata: € 3.700.000,00

Somma impegnata: € 3.700.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 3.700.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Concluso

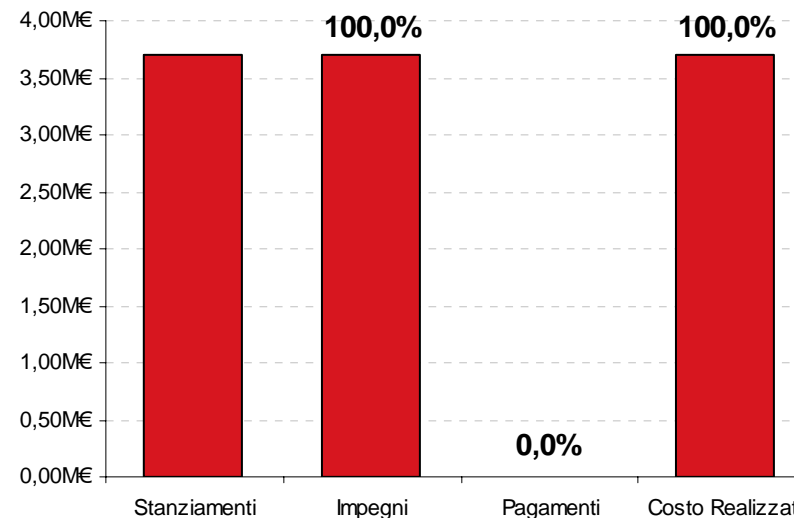

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 45- Sistema ferroviario - RFI 03 - Raddoppio Decimomannu - San Gavino

**Somma stanziata:** € 215.000.000,00

**Somma impegnata:** € 104.964.890,00

% impegnato su stanziato: 48,82%


**Costo realizzato:** € 104.964.890,00

% realizzato su stanziato: 48,82%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Esecuzione lavori 49%

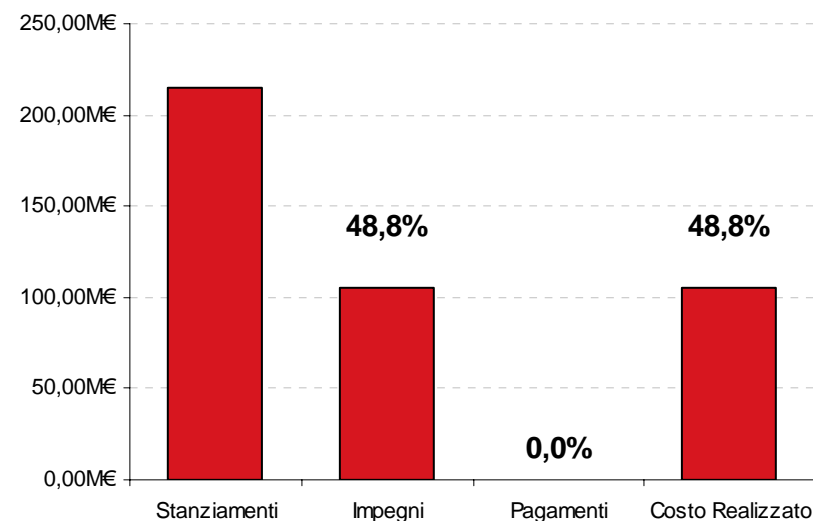

## 6 MOBILITÀ

### APQ ORIGINARIO 18 MARZO 2004

#### 46- Sistema ferroviario - RFI 04 - Riqualificazione e mantenimento stazioni/fermate - Macomer - Oristano - Abbasanta - Siliqua - Villamassargia e 1° fase nuova stazione di Olbia nonché 1° fase interventi servizio metropolitano CA Decimomannu

Somma stanziata: € 23.239.000,00

Somma impegnata: € 11.971.748,00

% impegnato su stanziato: 51,52%


Costo realizzato: € 8.367.200,00

% realizzato su stanziato: 36%

Pagamenti: € 6.100.342,00

% pagato su stanziato: 26,25%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 36%

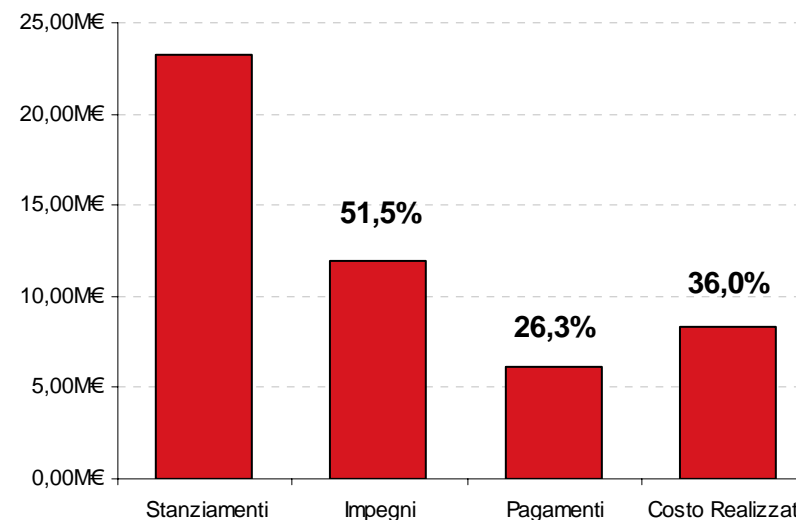

## 6.1 MOBILITÀ

### I ATTO INTEGRATIVO 06 LUGLIO 2005

#### 1 Sistema aeroportuale - ENAC AL05 - Aeroporto di Alghero: Sistema di controllo perimetrale e completamenti operativi

**Somma stanziata:** € 5.700.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Appalto

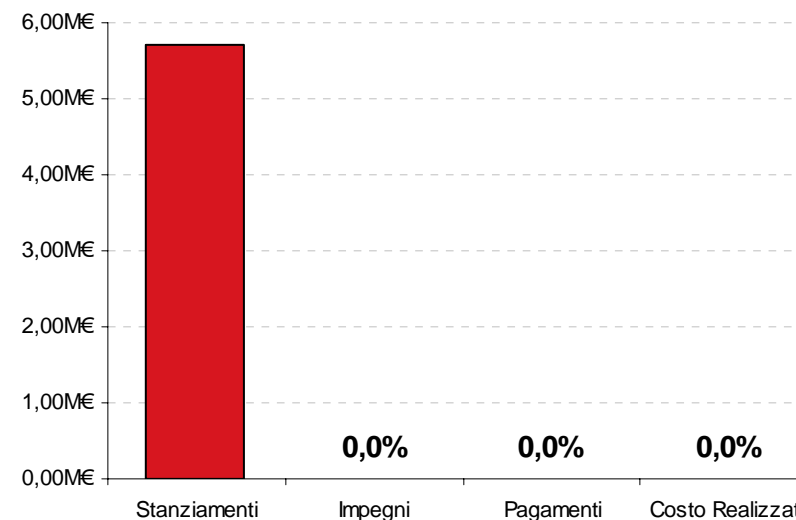

## 6.1 MOBILITÀ

### I ATTO INTEGRATIVO 06 LUGLIO 2005

## 2 Sistema aeroportuale - ENAC OL04 - Aeroporto di Olbia: Completamento nuovo piazzale di sosta aeromobili e sistema di controllo perimetrale

Somma stanziata: € 8.000.000,00

Somma impegnata: € 600.000,00

% impegnato su stanziato: 7,5%


Costo realizzato: € 600.000,00

% realizzato su stanziato: 7,5%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

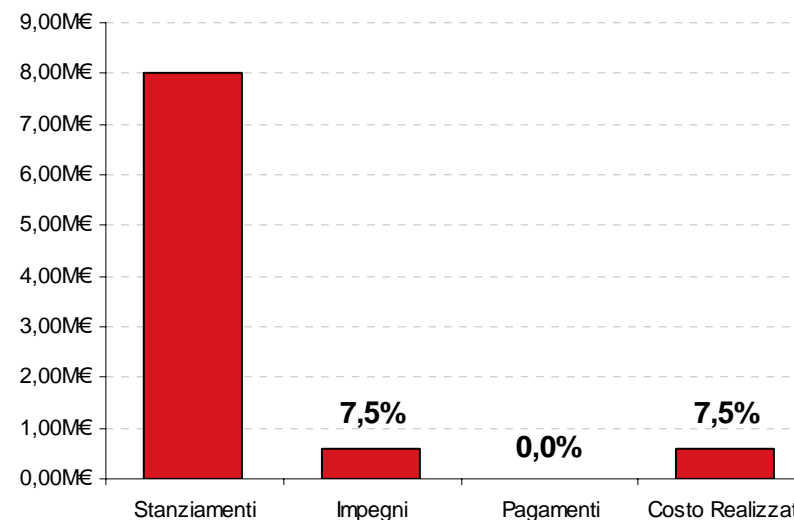

## 6.1 MOBILITÀ

### I ATTO INTEGRATIVO 06 LUGLIO 2005

### 3 Sistema aeroportuale - ENACAL0301 - Aeroporto di Alghero: Ampliamento piazzali sosta aeromobili

Somma stanziata: € 6.280.777,77

Somma impegnata: € 6.280.777,77

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 4.488.824,96

% realizzato su stanziato: 71,47%

Pagamenti: € 2.096.542,97

% pagato su stanziato: 33,38%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 71%

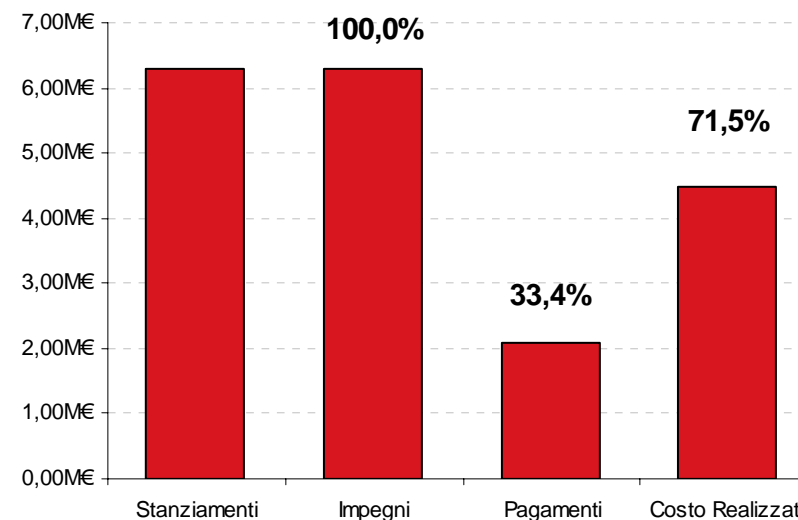

## 6.1 MOBILITÀ

### I ATTO INTEGRATIVO 06 LUGLIO 2005

#### 4 Sistema aeroportuale - ENACAL0302 - Aeroporto di Alghero: Riqualfica pista di volo

**Somma stanziata:** € 5.727.301,53

**Somma impegnata:** € 5.727.301,53

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 4.982.922,03

% realizzato su stanziato: 87%

**Pagamenti:** € 3.045.449,57

% pagato su stanziato: 53,17%

**Stato di attuazione:** Esecuzione lavori 87%

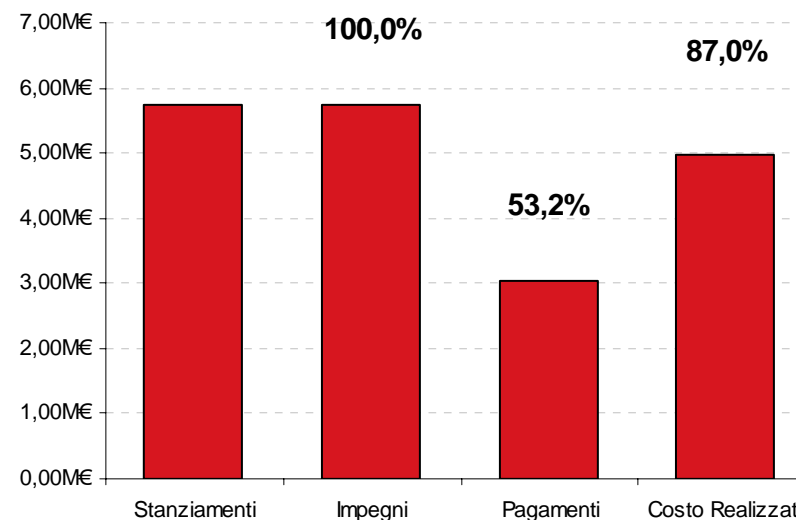

## 6.1 MOBILITÀ

### I ATTO INTEGRATIVO 06 LUGLIO 2005

#### 5 Sistema aeroportuale - ENACAL0303 - Aeroporto di Alghero: Completamento riqualifica via di rullaggio

**Somma stanziata:** € 6.100.908,85

**Somma impegnata:** € 6.100.809,85

% impegnato su stanziato: 100%


**Costo realizzato:** € 5.109.050,62

% realizzato su stanziato: 83,74%

**Pagamenti:** € 3.054.489,85

% pagato su stanziato: 50,07%

**Stato di attuazione:** Esecuzione lavori 83%

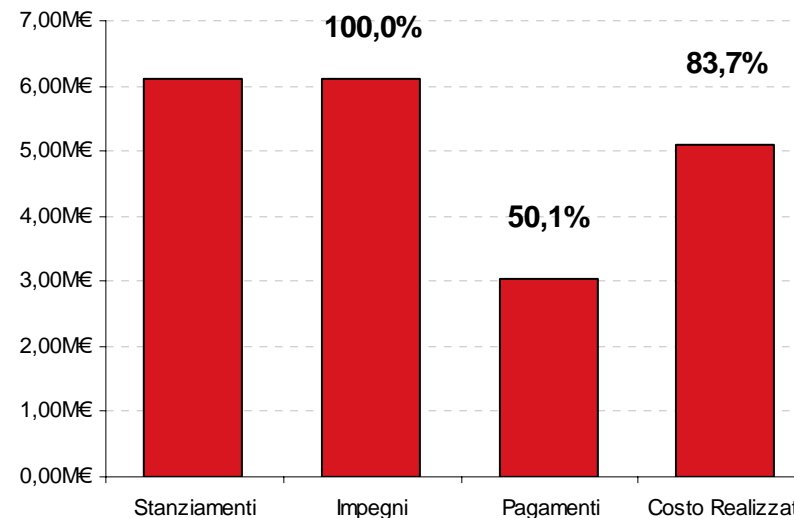



## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 1 Sistema aeroportuale - RAS 04-INT - Aeroporto di Oristano Fenu - Adeguamento pista di volo

**Somma stanziata:** € 287.080,98

**Somma impegnata:** € 284.252,98

% impegnato su stanziato: 99,01%


**Costo realizzato:** € 282.080,98

% realizzato su stanziato: 98,26%

**Pagamenti:** € 282.080,98

% pagato su stanziato: 98,26%

**Stato di attuazione:** Concluso

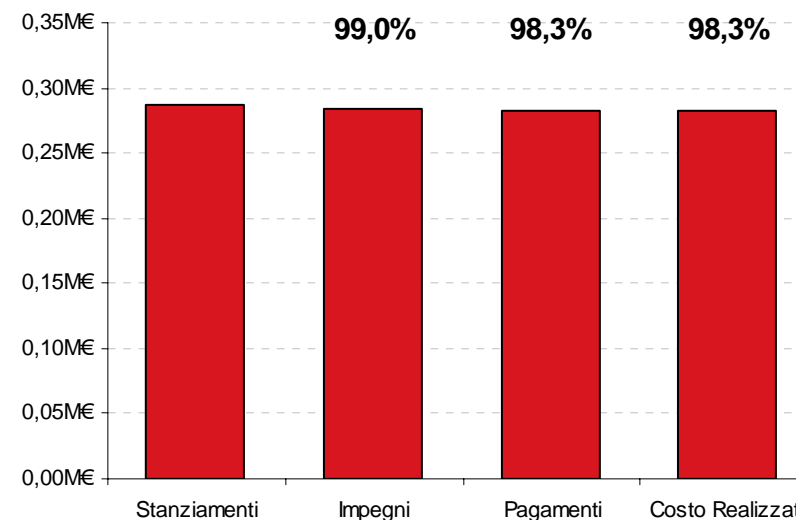

## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 2 Sistema ferroviario - RAS 05-INT - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - Materiale rotabile: acquisto n. 3 composizioni del treno metropolitano + n. 1 locotratto - di proprietà regionale

Somma stanziata: € 7.223.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

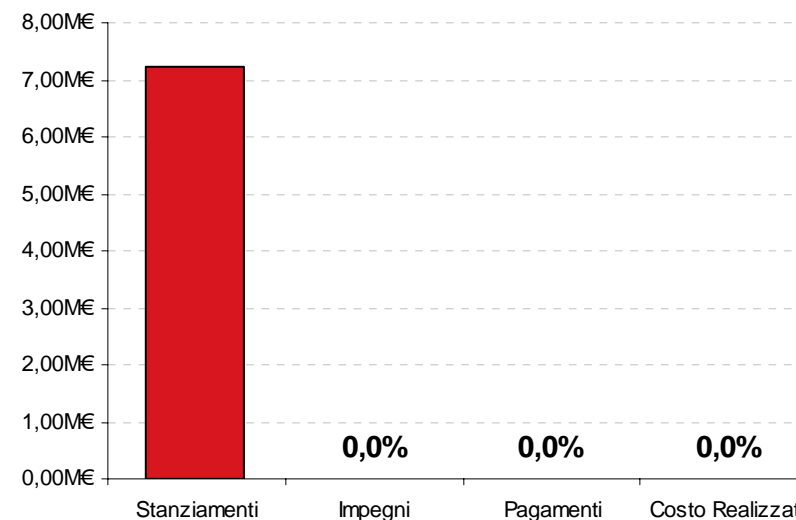

## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 3 - Sistema ferroviario - RAS 06-INT - Stazione intermodale passeggeri Carbonia - integrazione treno-bus e interventi di sostegno alla pendolarità

**Somma stanziata:** € 8.800.000,00

**Somma impegnata:** € 482.249,40

% impegnato su stanziato: 5,48%


**Costo realizzato:** € 407.894,80

% realizzato su stanziato: 4,64%

**Pagamenti:** € 71.638,24

% pagato su stanziato: 0,81%

**Stato di attuazione:** Appalto lavori

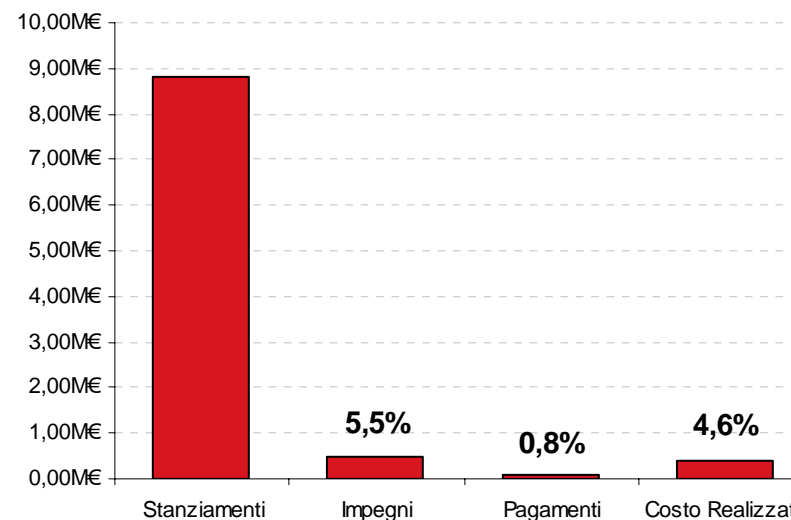

## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 4 – Sistema intermodale - RAS 07-INT - Lotto funzionale infrastrutture trasporto pubblico Comune di Nuoro (deposito, parcheggi, uffici)

**Somma stanziata:** € 1.200.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione preliminare

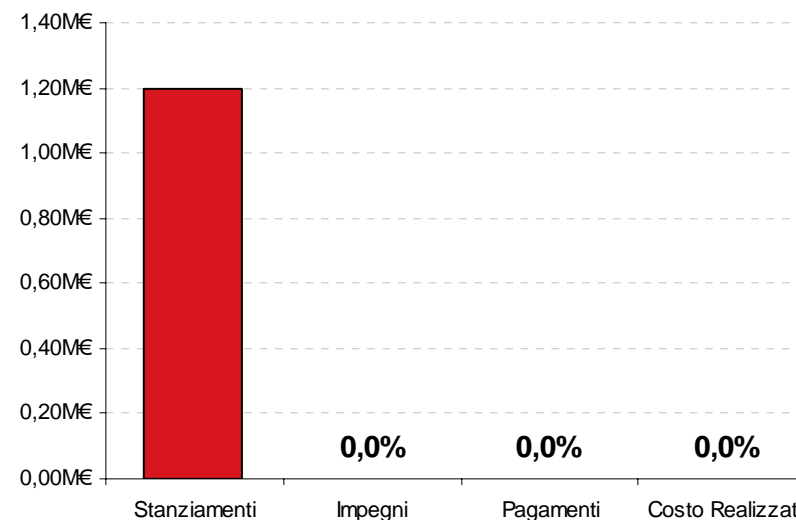

## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 5 – Sistema ferroviario- RAS 08-INT - Ammodernamento e velocizzazione tratta ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia e rivitalizzazione stazioni impresenziate

**Somma stanziata:** € 30.528.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** Progettazione

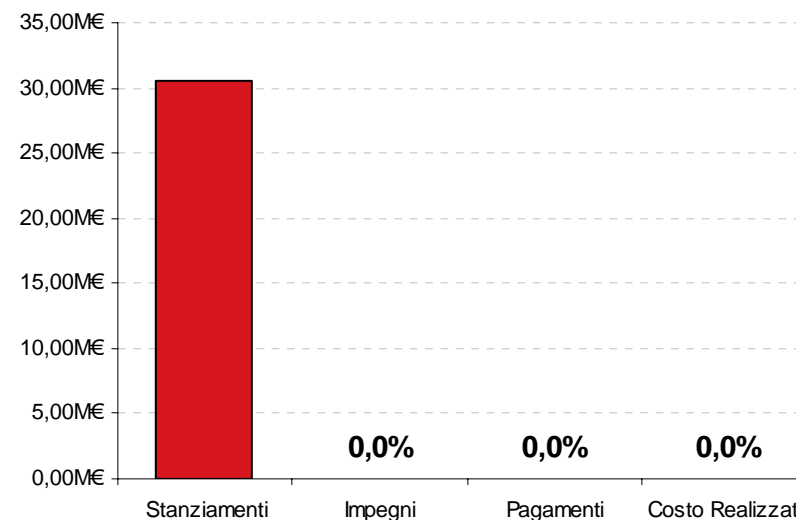

## 6.2 MOBILITÀ

### II ATTO INTEGRATIVO 22 DICEMBRE 2005

#### 6 - Sistema intermodale - RAS 09-INT - Servizio Metropolitano su Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile - Acquisto n. 1 treno tipo "Minuetto" proprietà regionale

Somma stanziata: € 3.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva

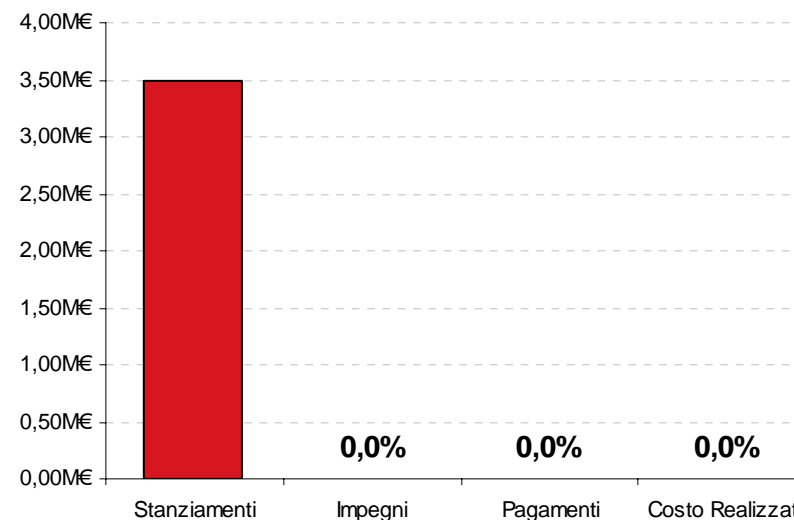

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 1 – Sistema ferroviario - CIPE35/01 - Servizio metropolitano su area vasta di Cagliari - acquisto materiale rotabile - tipo "Minuetto"

Somma stanziata: € 10.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessuna attività

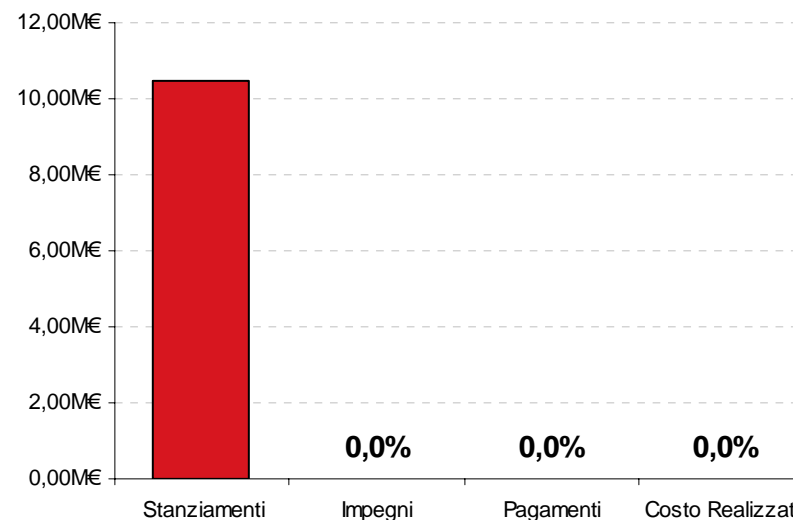

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 2 - Sistema ferroviario - CIPE35/01b - Miglioramento dell'accessibilità alle località di servizio nella tratta ferroviaria Sassari e Porto Torres

Somma stanziata: € 71.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessuna attività

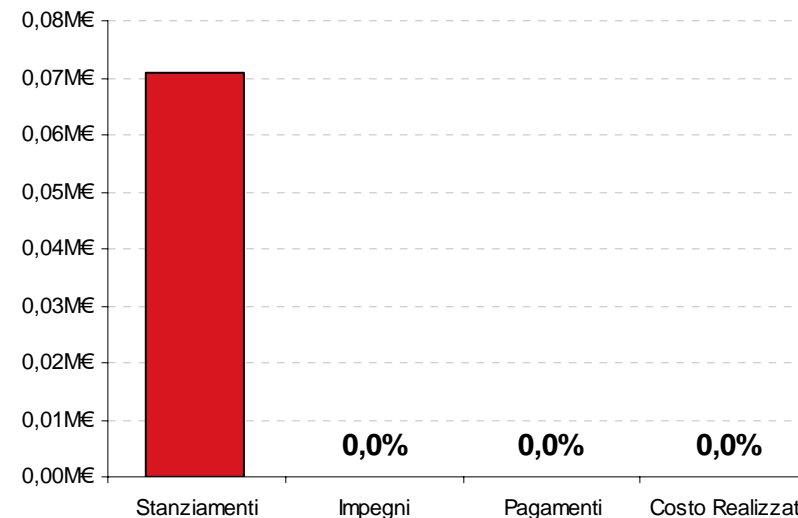



## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 3 - Sistema intermodale - CIPE35/02 - Oristano - Centro Intermodale passeggeri - Stazione interscambio

Somma stanziata: € 4.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessuna attività

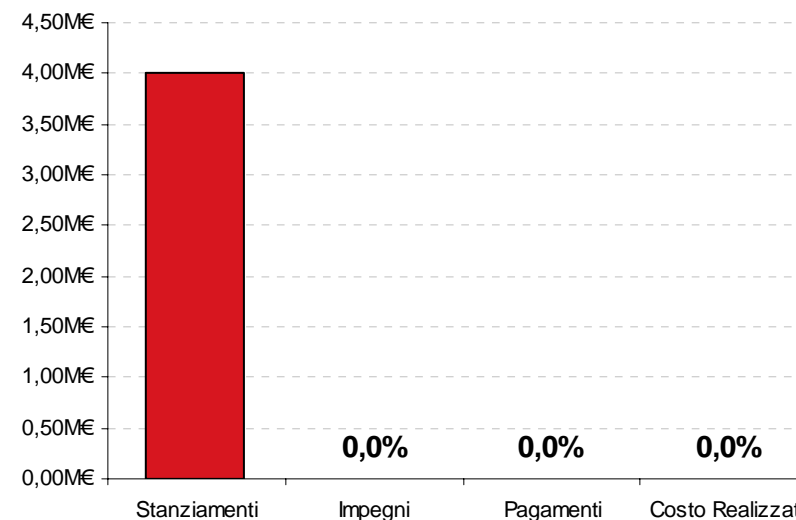

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 4 - Sistema intermodale - CIPE35/03 - Centro intermodale passeggeri – Macomer

**Somma stanziata:** € 1.450.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

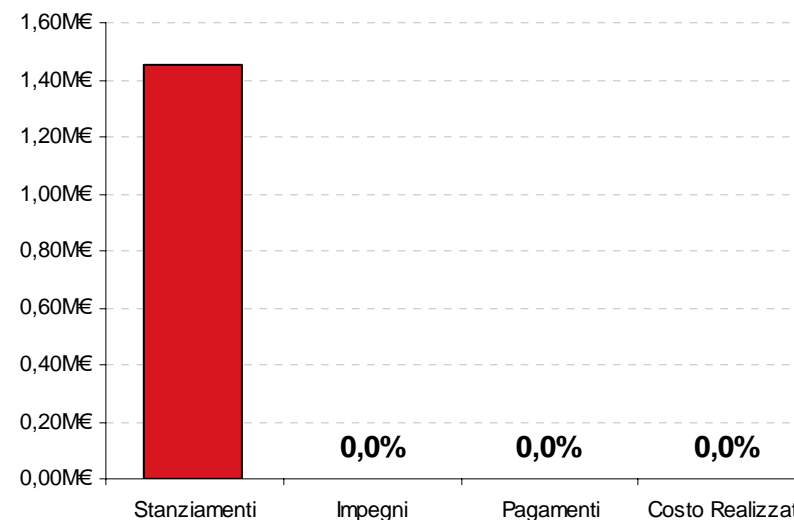

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 5 – Sistema intermodale - CIPE35/04 - Centro intermodale passeggeri Nuoro

**Somma stanziata:** € 2.800.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

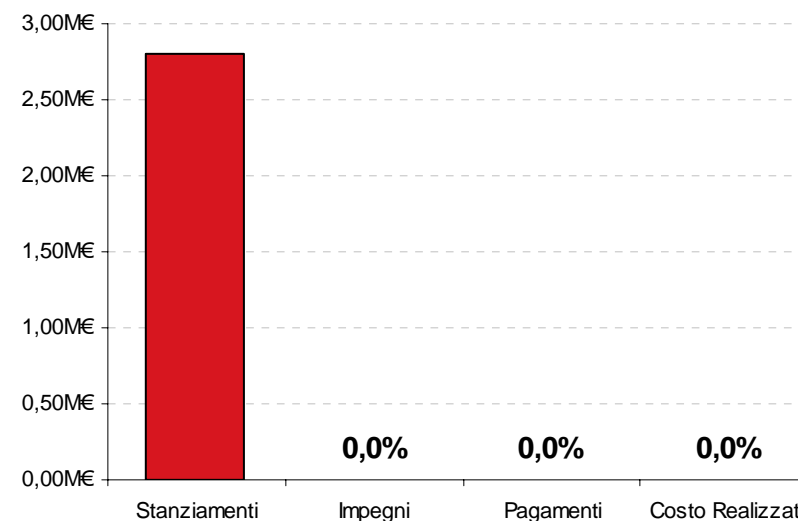

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 6 - Sistema intermodale - CIPE35/05 - Stazione di interscambio San Gavino Sanluri - Recupero e adeguamento stazione d'interscambio FdS

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** progettazione esecutiva in corso

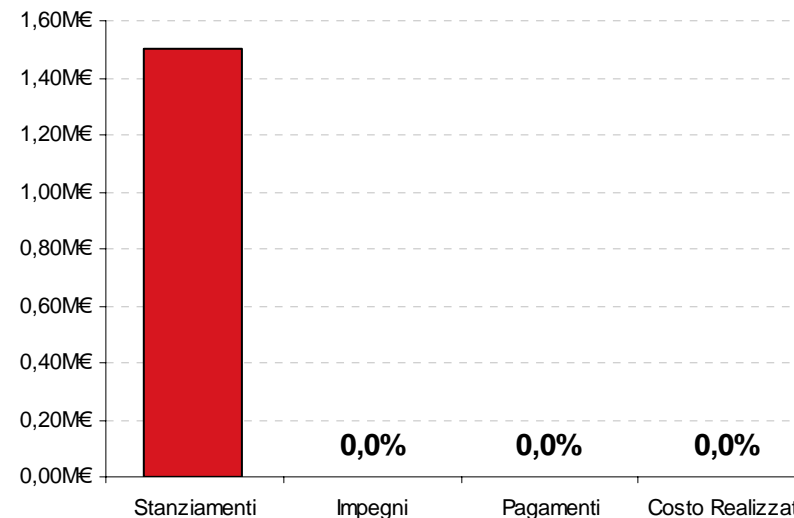

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 7 – Sistema intermodale - CIPE35/06 - Iglesias - Centro intermodale Passeggeri - 1° Lotto

**Somma stanziata:** € 1.533.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

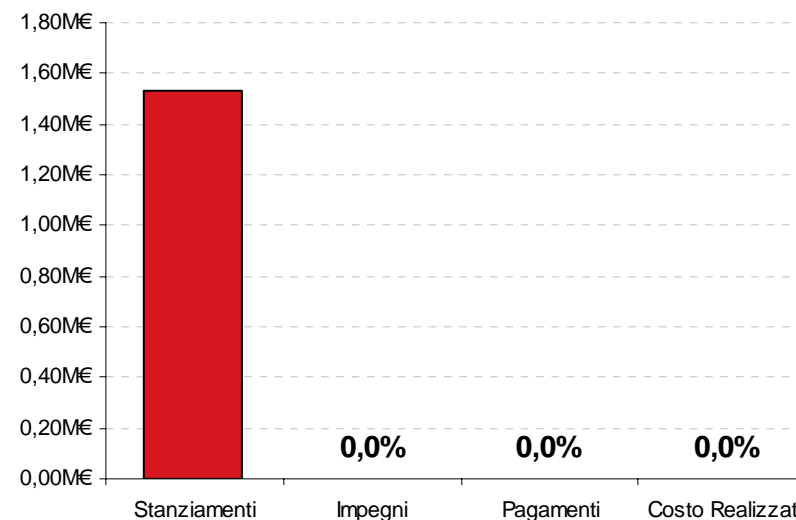

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 8 – Sistema aeroportuale - CIPE35/07 - Collegamento aeroporto di Alghero linea FdS Alghero - Sassari – progettazione e 1° lotto

Somma stanziata: € 8.610.658,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessuna attività

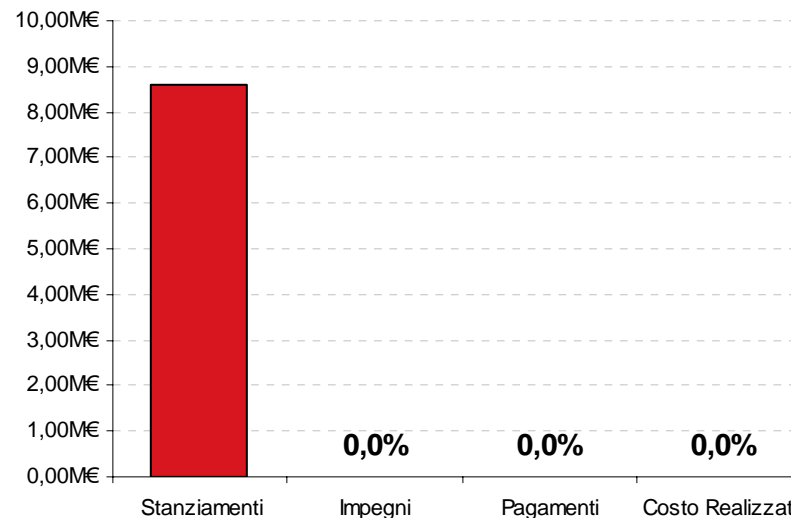

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 9 - Sistema ferroviario - CIPE35/08 - Circonvallazione ferroviaria di Olbia - collegamento area industriale - Studio di fattibilità e adeguamento Progetto preliminare - 1 ^ fase

**Somma stanziata:** € 500.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

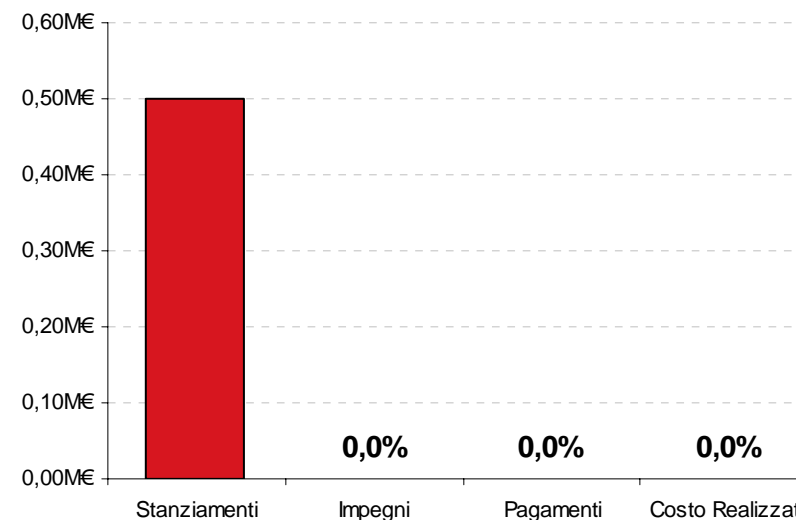

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 10 – Sistema intermodale - CIPE35/09a - Cagliari Elmas - Collegamento fermata RFI con Aeroporto - parte SO.G.AER S.p.A.

Somma stanziata: € 4.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** progettazione definitiva in corso

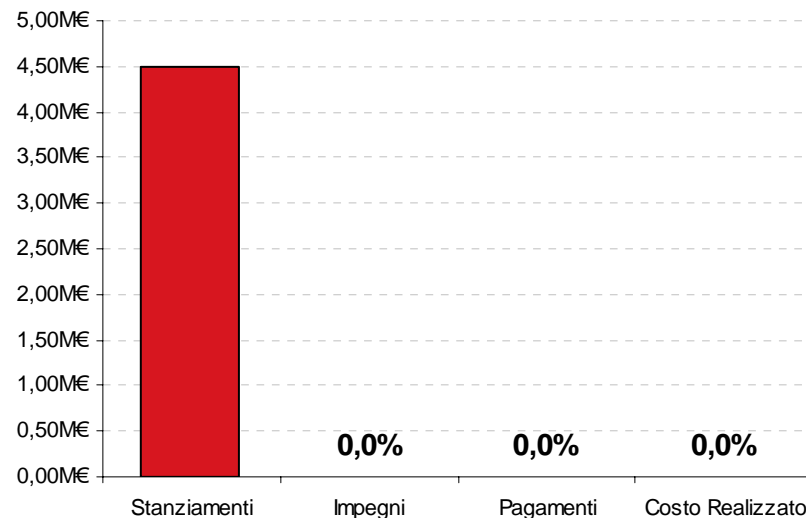



## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 11 – Sistema intermodale - CIPE35/09b - Realizzazione fermata RFI - Aeroporto di Elmas - parte R.F.I.

**Somma stanziata:** € 8.100.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

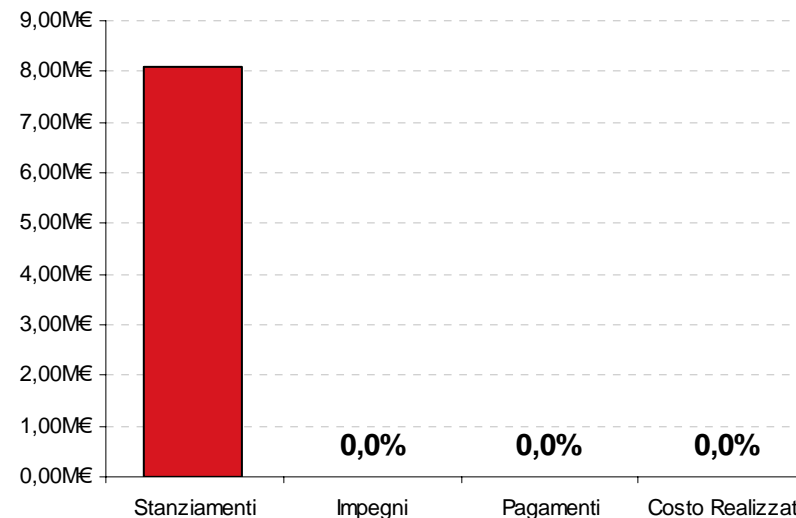

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 12 – Sistema ferroviario - CIPE35/10 - Servizio metropolitana leggera su area vasta di Cagliari - Studio di fattibilità

**Somma stanziata:** € 300.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

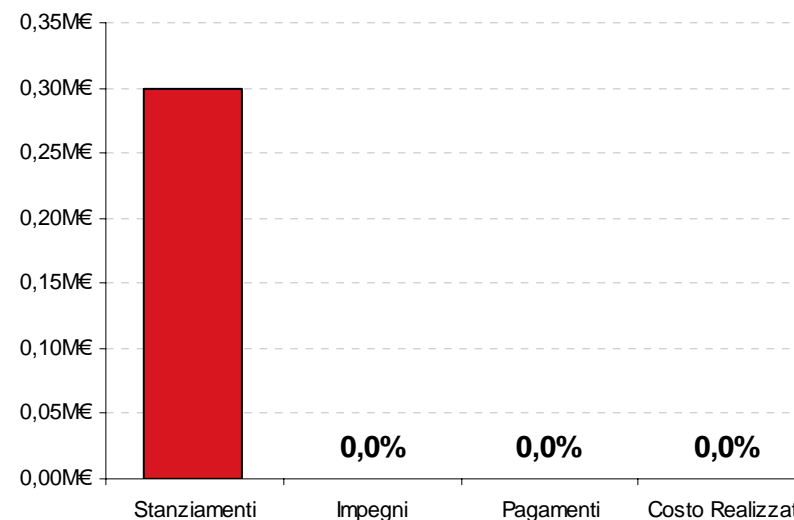

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 13 -Sistema portuale - LLPP/01 - Realizzazione del banchinamento per il secondo attracco per navi traghetto a ridosso del molo di levante del porto di Arbatax

Somma stanziata: € 4.582.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: progettazione esecutiva in corso

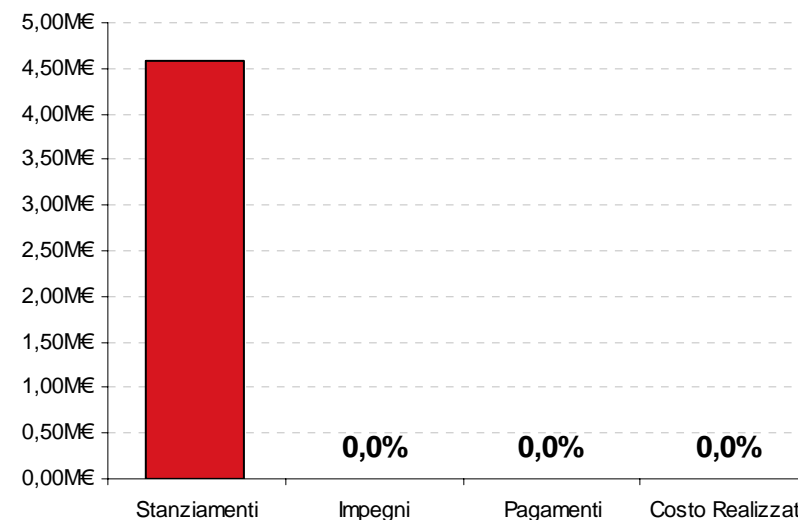

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 14 - Sistema portuale - LLPP/02 - Lavori di completamento del porto turistico di Porto Torres

Somma stanziata: € 3.500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** progettazione esecutiva in corso

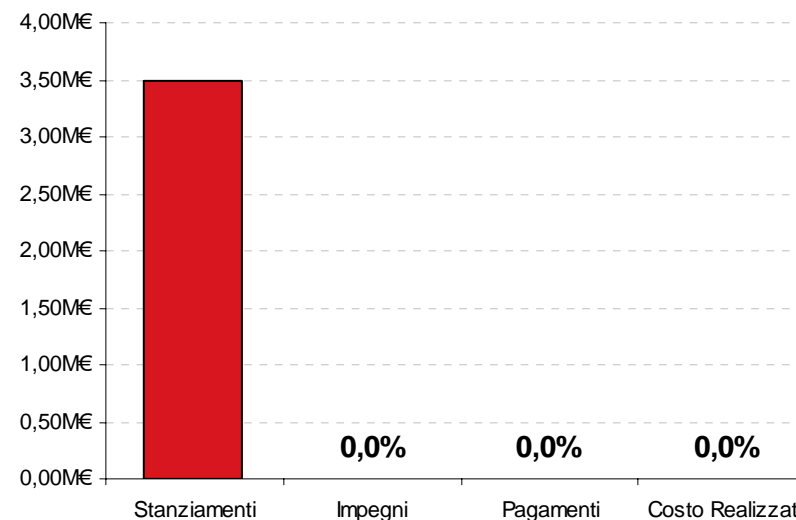

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 15 - Sistema portuale - LLPP/03 - Lavori di completamento dei banchinamenti interni del porto di Carloforte

**Somma stanziata:** € 2.500.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

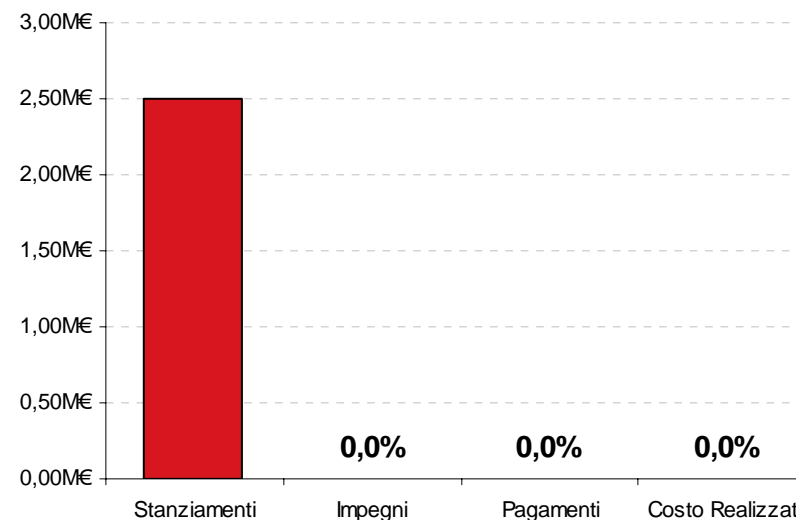

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 16 - Sistema portuale - LLPP/04 - Dragaggio sistema portuale del Basso Sulcis porti di S. Antioco - Portovesme - Carloforte – Calasetta Sarroch-Perd'e Sali

Somma stanziata: € 3.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessuna attività

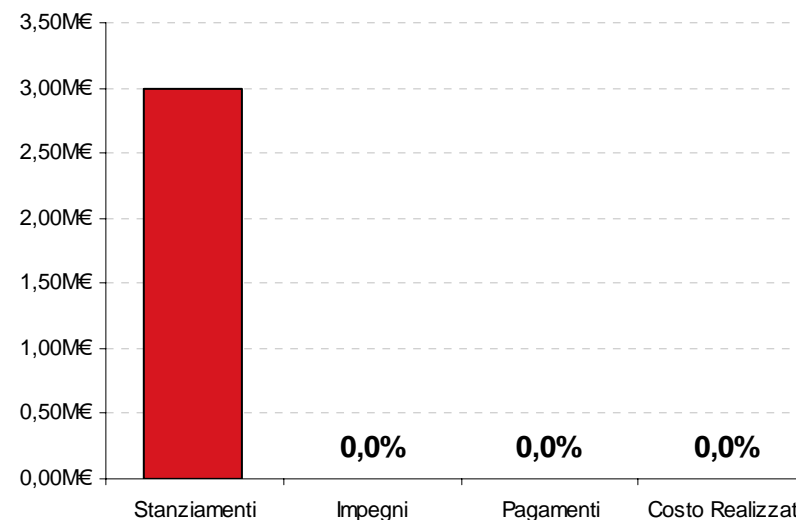

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 17 - Sistema portuale - LLPP/05 - Interventi per la messa in sicurezza secondo i parametri ISPS dei porti di Carloforte - Calasetta e Portovesme

**Somma stanziata:** € 960.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** progettazione definitiva in corso

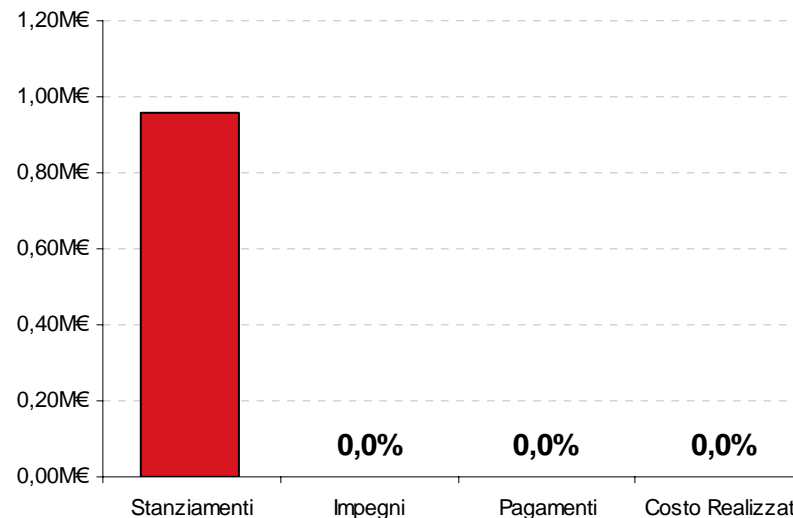

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 18 - Sistema portuale - LLPP/06 - Lavori di realizzazione del porto turistico di Cala Mangiavolpe a La Maddalena

**Somma stanziata:** € 7.468.663,98

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** progettazione preliminare conclusa

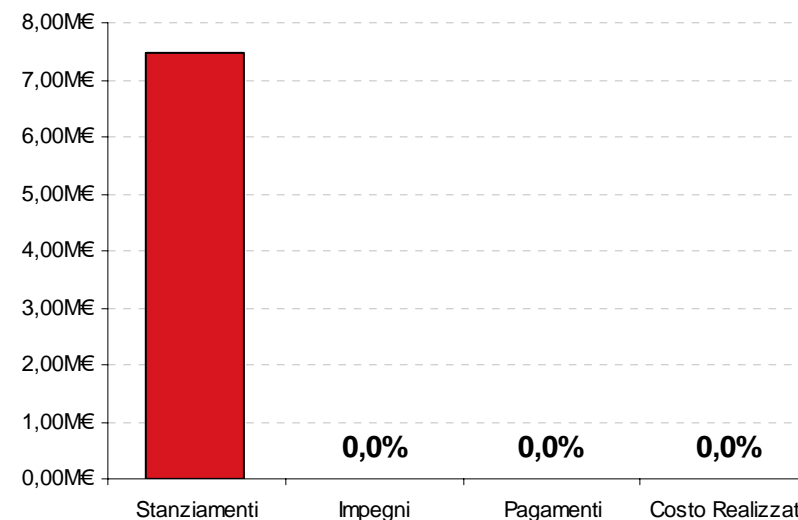



## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 19 - Sistema portuale - LLPP/07 - Studio di fattibilità sul completamento della rete portuale turistica isolana con riferimento ai quadranti Nord-Occidentale, Nord-Orientale, Sud-Occidentale e Sud-Orientale

**Somma stanziata:** € 300.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

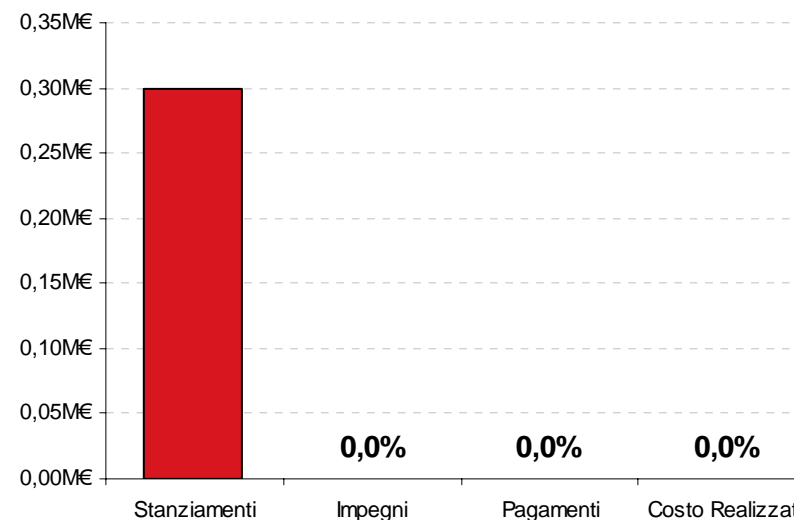

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 20 – Sistema ferroviario - RFI-06 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

**Somma stanziata:** € 14.000.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

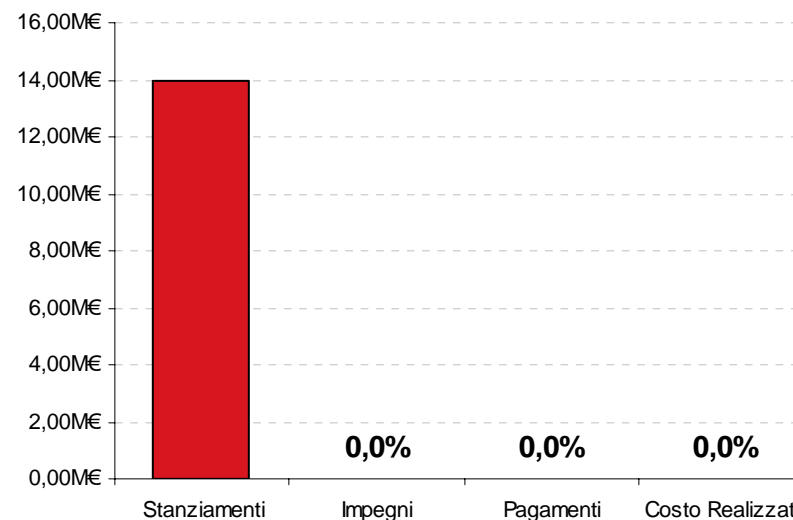

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 21 – Sistema ferroviario - RFI-07 - Area vasta di Cagliari - Materiale rotabile fornitura di Minuetto nell'ambito dell'area vasta di Cagliari

**Somma stanziata:** € 7.595.488,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

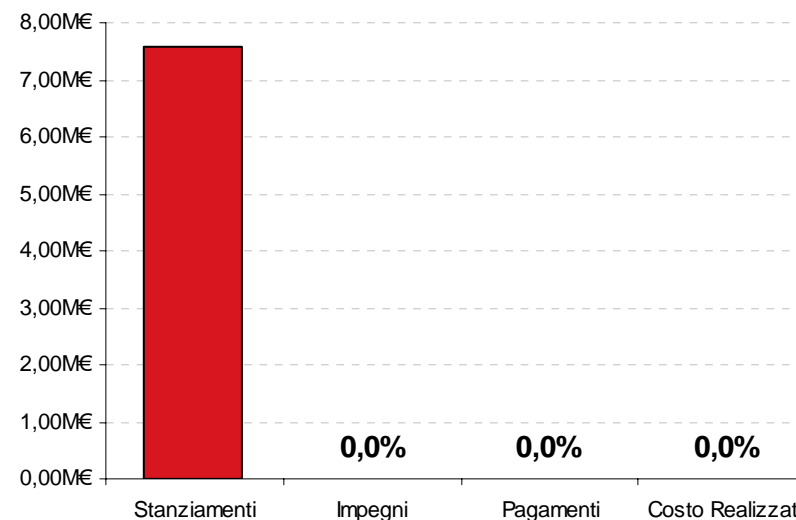

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 22 – Sistema ferroviario - RFI-08 - Soppressione passaggi a livello

**Somma stanziata:** € 10.735.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

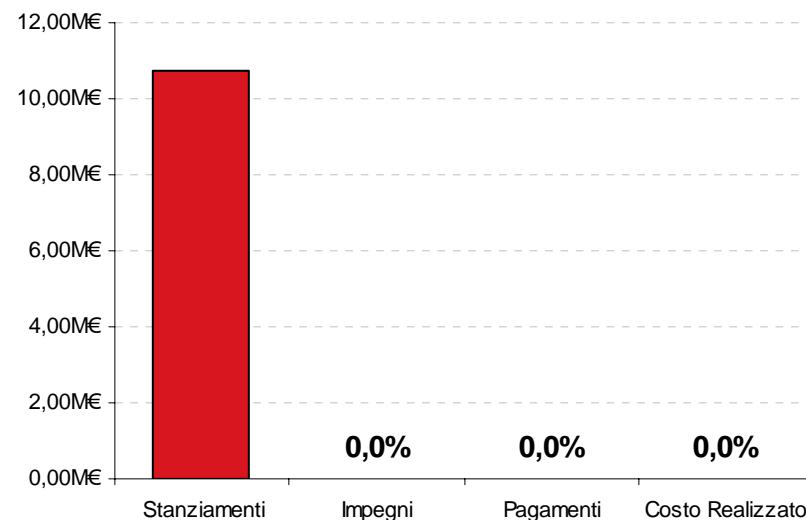

## 6.3 MOBILITÀ

### III ATTO INTEGRATIVO 30 NOVEMBRE 2006

#### 23 – Sistema ferroviario - RFI-09 - Ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria (FF.S.) Cagliari - Oristano

**Somma stanziata:** € 25.800.000,00

**Somma impegnata:** € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

**Costo realizzato:** € 0

% realizzato su stanziato: 0%

**Pagamenti:** € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

**Stato di attuazione:** nessuna attività

