


STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 125 "CAGLIARI - TORTOLI"

LAVORI ULTIMATI (IN ESERCIZIO)
 LAVORI IN CORSO
 PROGETTAZIONE

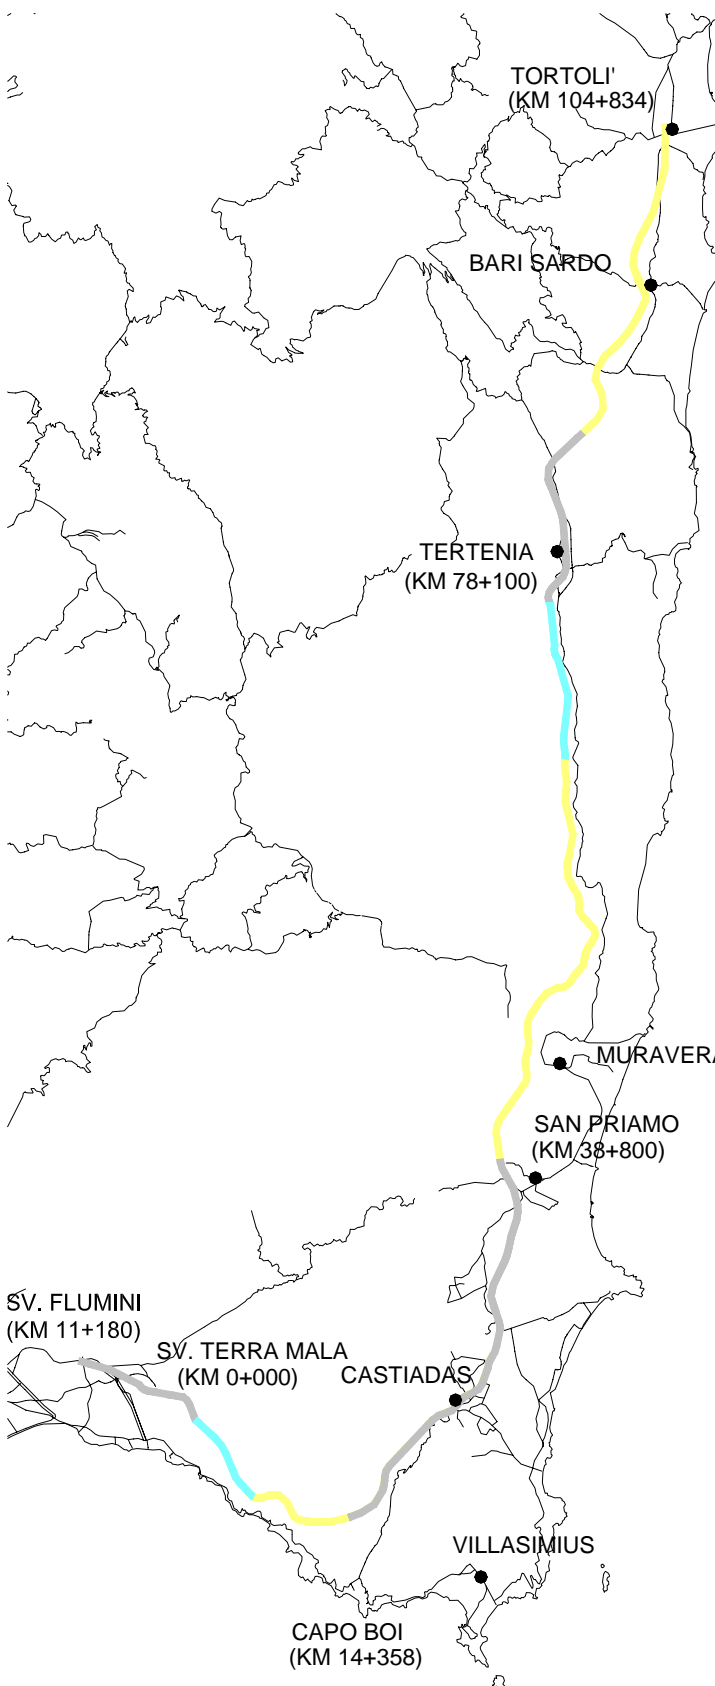

TRATTO	LOTTE	IMPORTO	Progressive	Km	SITUAZIONE	NOTE	FINANZIAMENTO	
Tertenia - Tortoli Km 78+100 - 104+834 (Ing. G. Marredda)	IV Lotto 2° stralcio Sv. Cea - Sv. Tortoli	11.305.971,16	100+897-104+834	3,936	Lavori in corso	Consegna parz. 30.11.2004. Consegna definitiva novembre 2005. Ultimazione prevista settembre 2007. Impresa GESTIM Srl	Fondi RAS (ex POP) più cofinanziamento ANAS	
	IV Lotto 1° stralcio Sv. Barisardo nord-Sv. Cea	19.031.809,21	96+033-100+897	4,864		SAL 4. Perizia di variante. Consegnati 03.07.2003. Ultimazione prevista giugno 2006. Impresa Condotte d'acqua SpA		
	III Lotto 3° stralcio Sv. Barisardo sud - Sv. Barisardo nord	18.593.968,21	93+239-96+033	2,794		Riconsegnati 15.03.2004 (fallimento Impresa IRTI lavori SpA) Impresa "Impresa"		
	III Lotto 2° stralcio Loc. Genna Ortiga - Sv. Barisardo sud	20.856.300,22	89+692-93+239	3,547		Consegnati 12.03.2003 Impresa Baldassini & Tognozzi		
	III Lotto 1° stralcio Galleria Cardedu - Loc. Genna Ortiga							
	II Lotto 3° stralcio Marina di Gairo - Cardedu	13.336.358,40	86+122-89+692	3,570		SAL 7. Consegnati 13.12.2002 Impresa Baldassini & Tognozzi		
	II Lotto 2° stralcio Uscita Galleria Quadassoni - Marina di Gairo	12.970.880,84	83+450-86+122	2,672		Ultimati 30.06.2002 Impresa Baldassini & Tognozzi		
II Lotto 1° stralcio Loc. Sa Canna - Uscita Galleria Quadassoni	20.649.793,36	80+522-83+450	2,928	Ultimati 24.04.2002 Impresa Vittadello Intercantieri SpA				
Variante di Tertenia	I Lotto Sv. Tertenia-Loc. Sa Canna	5.527.695,45	78+100-80+522	2,422	In esercizio	Ultimati 09.03.2002 Impresa Gelfi Brescia SpA	Fondi RAS (POP) più cofinanziamento ANAS	
								Finanziamento ANAS precedente al 1997
San Priamo - Tertenia Km 38+800 - 78+100 (Ing. E. Musio)	I Lotto 1° stralcio Sv. Tertenia-Sv. Osini	50.000.000,00	72+765-78+100	5,430	Progetto definitivo per appalto integrato	Appalto lavori 2006	Fondi POR 2000-2006 1° Triennio per M€28,405. Da reperire M€22,405	
	I Lotto 2° stralcio Sv. Osini-Sv. San Giorgio	70.000.000,00	64+923-72+765	7,842				
	II Lotto 1° stralcio Sv. San Giorgio-Sv. Quirra	15.673.485,51	60+633-64+923	4,290	Lavori in corso	SAL 11. Consegnati 25.06.2002 ATI Tirrena Scavi SpA-Soc. Internazionale gallerie	Finanziamento ANAS Piano stralcio 2000	
	II Lotto 2° stralcio Sv. Quirra-Sv. Murtas	32.159.344,86	55+766-60+633	4,867		SAL 7. Consegnati 03.06.2004. Ultimazione prevista 31.10.2006 Impresa Todini Costruzioni		
	III Lotto 1° stralcio Sv. Murtas - Ingresso Galleria Sa Sperruma	18.344.572,30	51+595-55+766	4,171		SAL 8. Consegnati 04.03.2002 Impresa Cavalleri Ottavio SpA		
	III Lotto 2° stralcio Uscita Galleria Sa Sperruma - Sv. Muravera	23.274.547,37	47+467-51+595	4,128		Consegnati 25.06.2002 ATI Gelfi-Romana Scavi		
	IV Lotto 1° stralcio Sv. Muravera-Cuili Paderi	19.276.754,35	43+693-47+467	3,774		SAL 2. Consegnati 06.10.2004. Ultimazione prevista 06.09.2006 Impresa Irces		
IV Lotto 2° stralcio Cuili Paderi-Sv. San Priamo	25.276.012,16	38+800-43+693	4,893	SAL 23. Consegnati 07.09.2000 Impresa "Impresa"	Finanziamento ANAS precedente al 1997			
Capo Boi - San Priamo Km 14+358 - 38+800 (Ing. F. Cannas)	I Lotto S. Priamo-Brunco Margiani	22.081.211,89	31+688-38+800	7,112	In esercizio	Impresa C.I.R. costruzioni	Fondi RAS (POP) più cofinanziamento ANAS	
	II Lotto Brunco Margiani - Svincolo Castiadas	18.572.370,87	22+931-31+688	8,757		Ultimati 29.11.2002 Impresa Fabiani SpA		
	III Lotto 1° stralcio Svincolo Castiadas - Gutturu Frascu	15.099.820,24	20+301-22+931	2,630		Ultimati 29.11.2002 Impresa Fabiani SpA		
	III Lotto 2° stralcio Galleria Gutturu Frascu	26.596.934,94	17+382-20+301	2,919		Ultimati 30.11.2002 Impresa Condotte d'acqua SpA		
	III Lotto 3° stralcio Uscita Galleria Gutturu Frascu - Capo Boi	26.147.535,55	14+358-17+382	3,024		Ultimati 10.12.2001 ATI Provera Carrassi		
Sv. Terra Mala - Capo Boi Km 0+000 - 14+358 (Ing. A. De Lorenzo)	I Lotto Km 0,000 - 8,789	72.257.344,85	5+569-14+358	8,789	Lavori in corso	Consegnati 09.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE	Finanziamento ANAS Piano straord. 2003 - Nuove Opere	
	II Lotto Km 8,789 - 14,358	83.800.000,00	0+000-5+569	5,569	Prog. definitivo per app.integr.	Appalto lavori 2006	Fondi RAS (ex POP) più cofinanziamento ANAS	
Sv. Flumini - Terra Mala Km 11+180 - Km 0+000 (Ing. G. Marredda)	I Lotto 1° stralcio	74.627.013,96	11+180-0+000	11,180	In esercizio	Ultimati 15.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE	Fondi RAS (ex POP) più cofinanziamento ANAS	
	I Lotto 2° stralcio (Svincolo Flumini)	14.427.538,00	11+180	0,000	Lavori aggiudicati	Consegna imminente. Lavori prima sospesi e poi riaggiudicati all'impresa Opere Pubbliche SpA (TAR)	ANAS	
