



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Aree Urbane

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

19

Piano Economico-Finanziario Complessivo

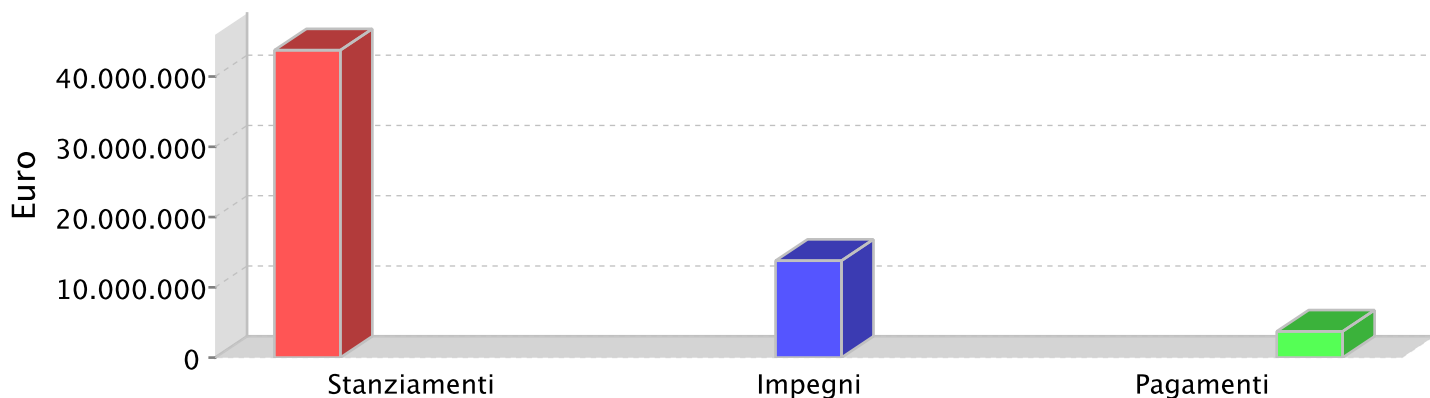


■ Stanziamenti=43.746.026,78 € ■ Impegni=13.792.193,36 €
■ Pagamenti =3.728.312,03 €

Avanzamento impegni: 31.53 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 8.53 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

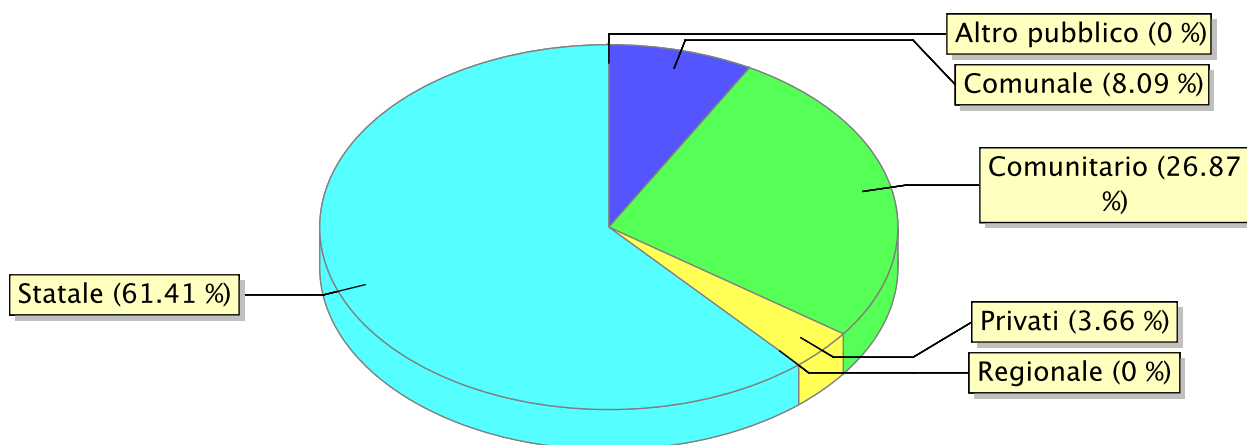

● Altro pubblico = 0 ● Comunale = 3.534.935,85 ● Comunitario = 11.751.000,01
● Privati = 1.600.000 ● Regionale = 0 ● Statale = 26.860.090,92

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

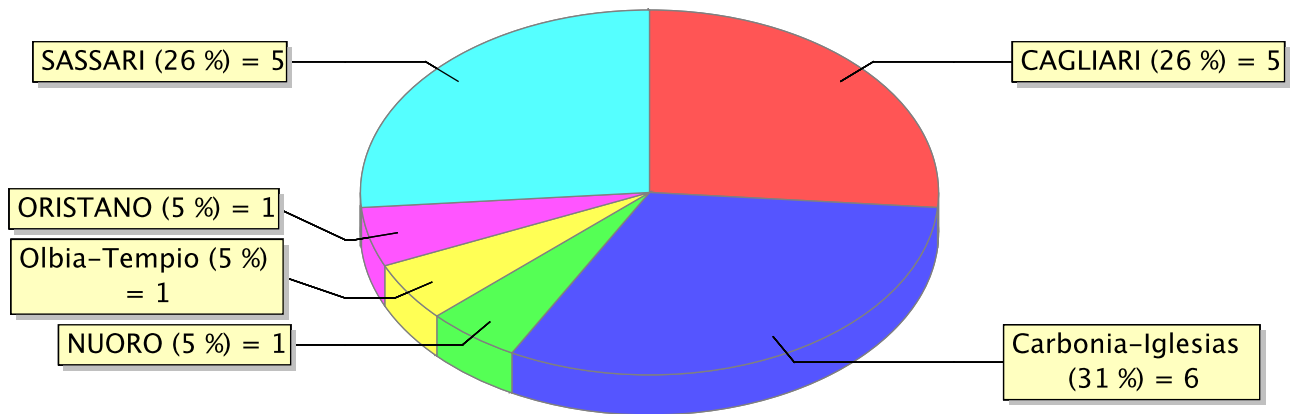

● CAGLIARI (26 %) = 5 ● Carbonia-Iglesias (31 %) = 6 ● NUORO (5 %) = 1
● Olbia-Tempio (5 %) = 1 ● ORISTANO (5 %) = 1 ● SASSARI (26 %) = 5

Report del progetto: pdq_04 - CASTELSARDO_Il contenitore delle chiavi per l'accessibilita

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Castelsardo

Soggetto Attuatore

Comune di Castelsardo (SS)


Responsabile dell'intervento

Salvatore Ledda

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

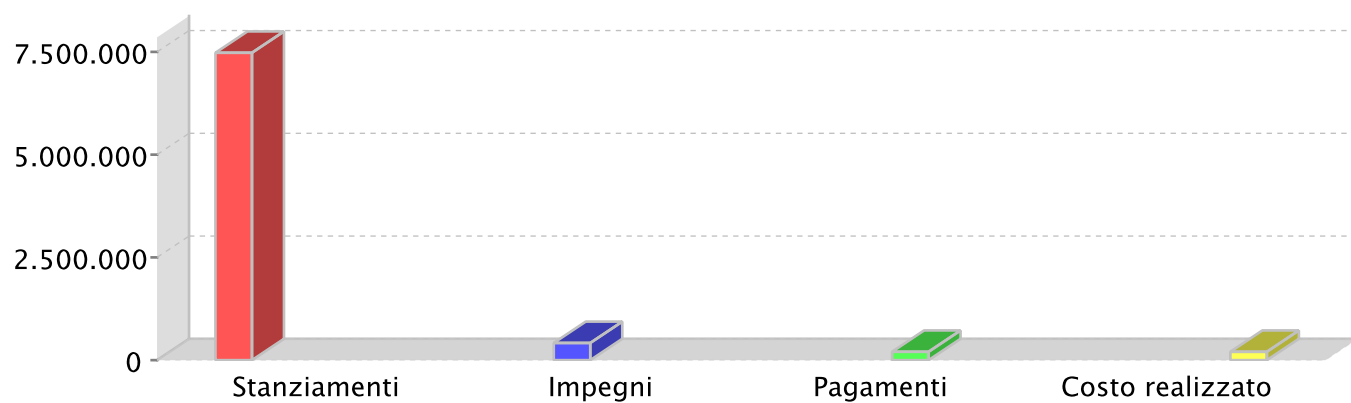

■ Stanziamenti=7.479.413,32 € ■ Impegni=418.554,97 €
■ Pagamenti=204.098,88 € ■ Costo realizzato=204.098,88 €

Avanzamento impegni: 5.60 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 2.73 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 2.73 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_14_1 - CARBONIA_Ecologie del traffico. Riqualificazione funzionale e ambientale dell'asse attrezzato per

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Comune di Carbonia (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Giampaolo Porcedda - Dott.ssa Laura Marcello

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

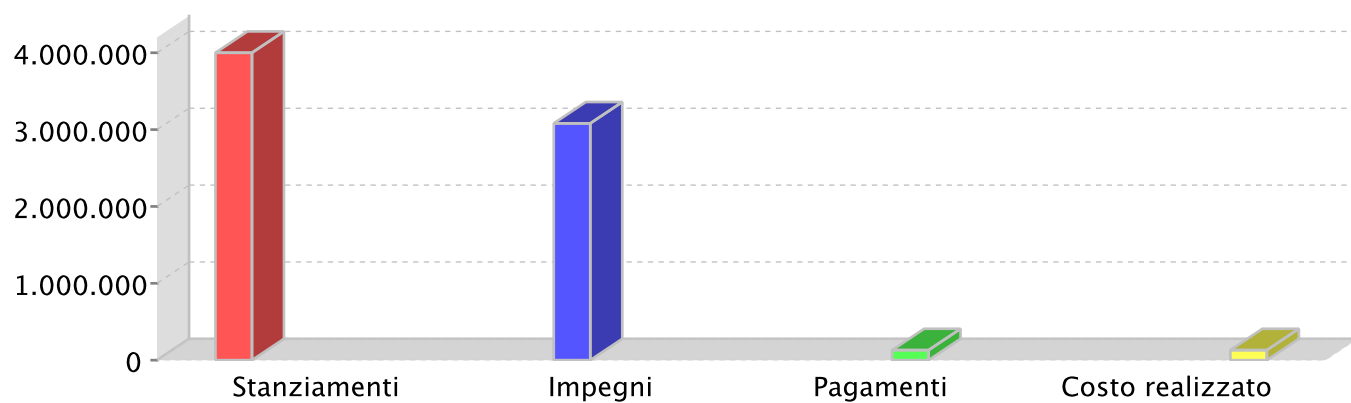

■ Stanziamenti=4.000.000,00 € ■ Impegni=3.081.445,64 €
■ Pagamenti=130.629,84 € ■ Costo realizzato=130.629,84 €

Avanzamento impegni: 77.04 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.27 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 3.27 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_14_2 - CARBONIA_Restauro e recupero del Padiglione Torneria e Forge come struttura polifunzionale integrata.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Comune di Carbonia (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Giampaolo Porcedda - Dott.ssa Laura Marcello

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

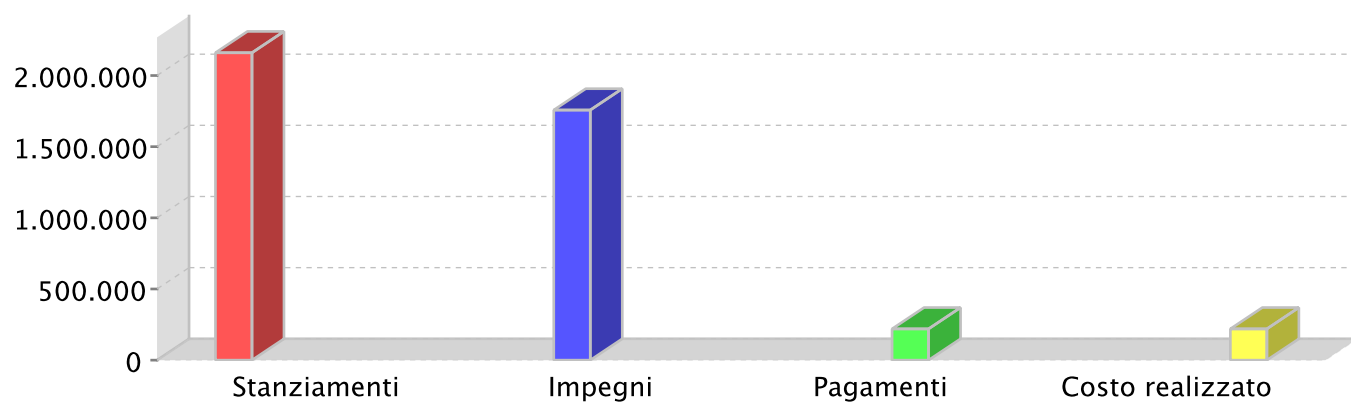

■ Stanziamenti=2.160.000,00 € ■ Impegni=1.757.408,98 €
■ Pagamenti=219.662,77 € ■ Costo realizzato=219.662,77 €

Avanzamento impegni: 81.37 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 10.17 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 10.17 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_14_3 - CARBONIA_Restauro e recupero dell'albergo operaio storico con funzione di centro educativo giovanile

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Comune di Carbonia (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Giampaolo Porcedda - Dott.ssa Laura Marcello

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

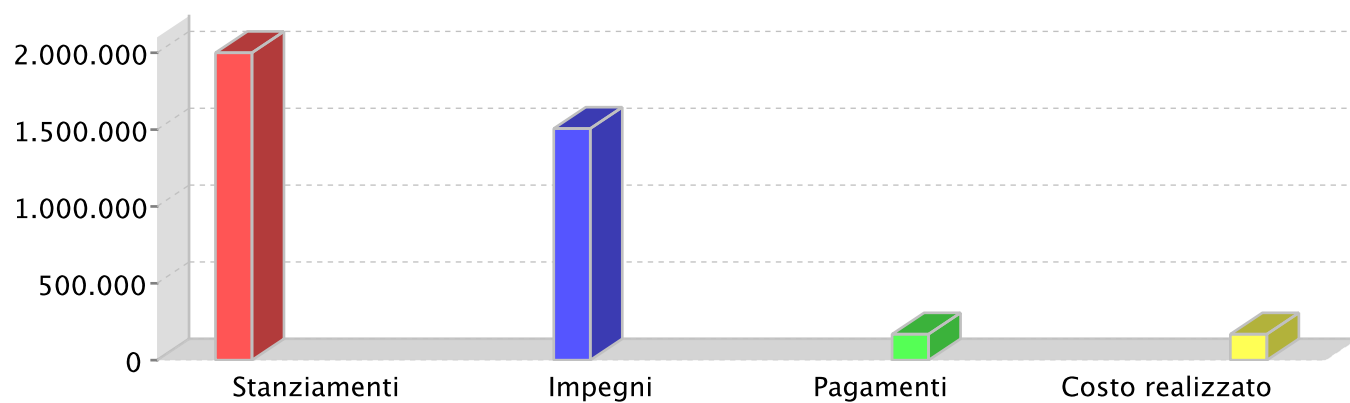

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=1.507.029,12 €
■ Pagamenti=169.006,79 € ■ Costo realizzato=169.006,79 €

Avanzamento impegni: 75.36 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 8.46 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 8.46 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_14_4 - CARBONIA_Itinerari storico-culturali del moderno. Riqualificazione dell'accessibilita allo spazio pubblico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Comune di Carbonia (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Giampaolo Porcedda - Dott.ssa Laura Marcello

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

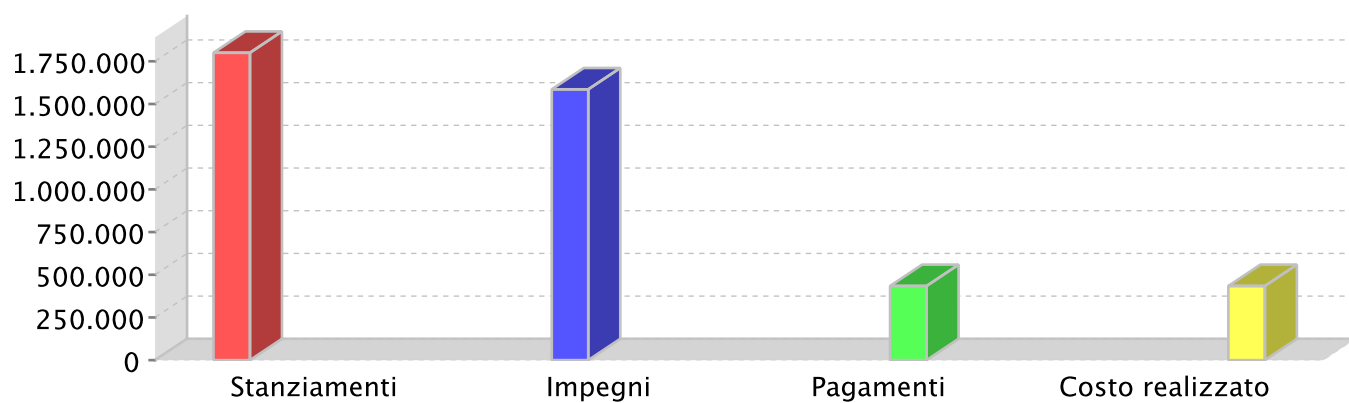

■ Stanziamenti=1.800.000,00 € ■ Impegni=1.585.850,67 €
■ Pagamenti=434.386,81 € ■ Costo realizzato=434.386,81 €

Avanzamento impegni: 88.11 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 24.14 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 24.14 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_10_1 - CAGLIARI_Mediateca del Mediterraneo

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Comune di Cagliari (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Francesco Patricolo - Dott. Efsio Ibba

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

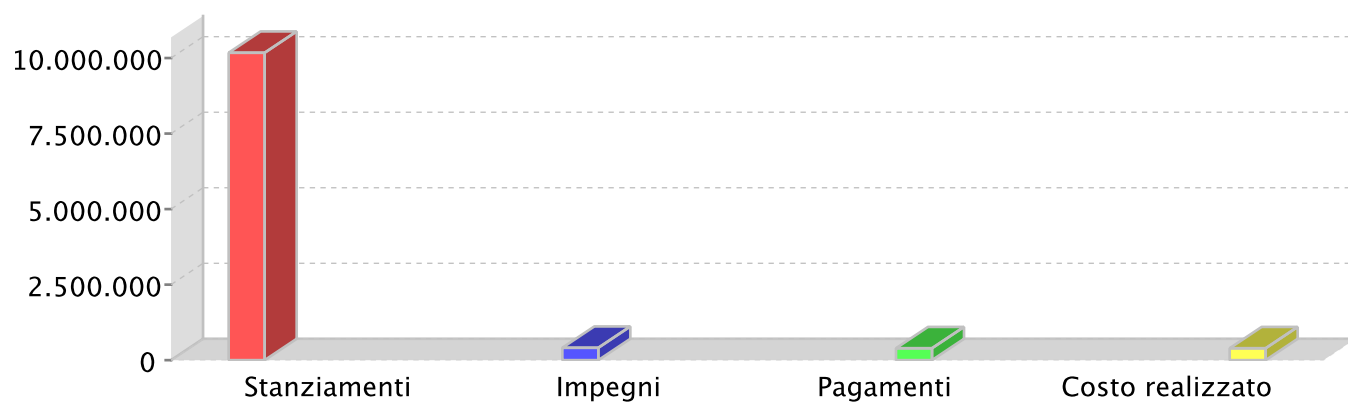

■ Stanziamenti=10.175.000,00 € ■ Impegni=409.333,42 €
■ Pagamenti=393.509,28 € ■ Costo realizzato=393.509,28 €

Avanzamento impegni: 4.03 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.87 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 3.87 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_10_2 - CAGLIARI_Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

Comune di Cagliari (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Francesco Patricolo - Dott. Efsio Ibba

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

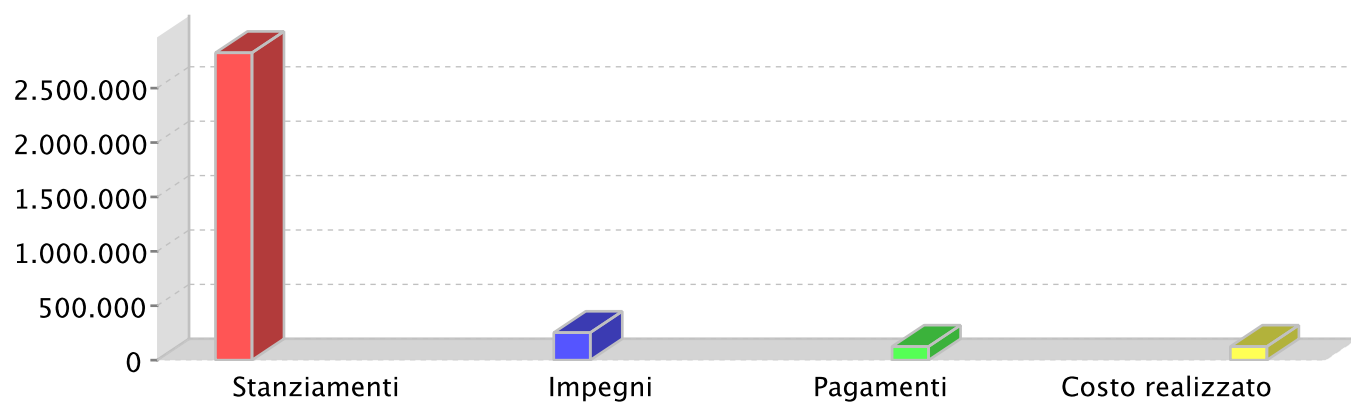

■ Stanziamenti=2.825.000,00 € ■ Impegni=252.922,22 €
■ Pagamenti=125.313,52 € ■ Costo realizzato=125.313,52 €

Avanzamento impegni: 8.96 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.44 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.44 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_05_1 - ALGHERO_Ricupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto A -

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia
1) SASSARI

Comune
Alghero

Soggetto Attuatore

COMUNE DI ALGHERO (SS)

Responsabile dell'intervento


Geom. Ingrid Crabuzza

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

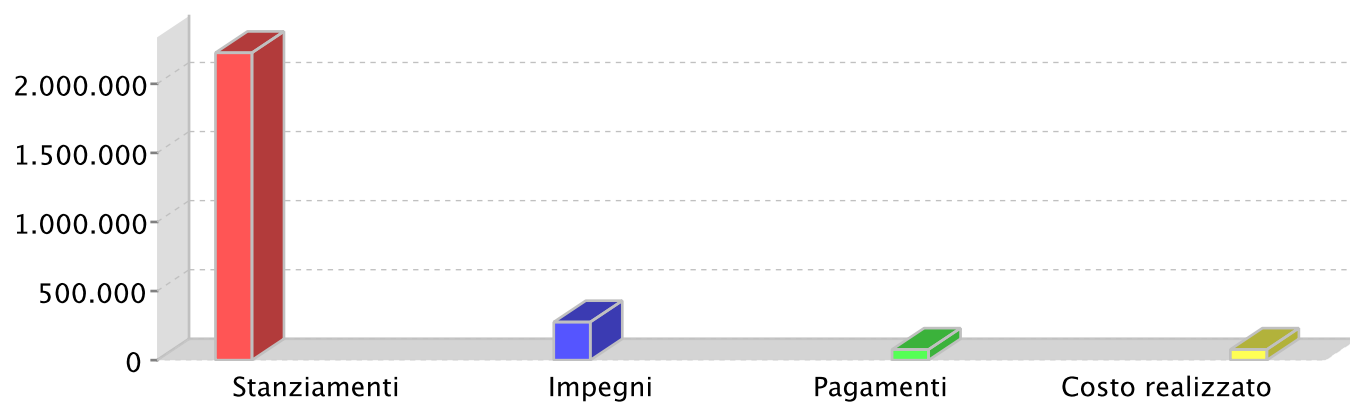

■ Stanziamenti=2.224.797,21 € ■ Impegni=275.839,45 €
■ Pagamenti=77.291,78 € ■ Costo realizzato=77.291,78 €

Avanzamento impegni: 12.40 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.48 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 3.48 % sullo stanziato

Report del progetto: pdq_05_2 - ALGHERO_Ricupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto B -

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia
1) SASSARI

Comune
Alghero

Soggetto Attuatore

COMUNE DI ALGHERO (SS)

Responsabile dell'intervento


Geom. Ingrid Crabuzza

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

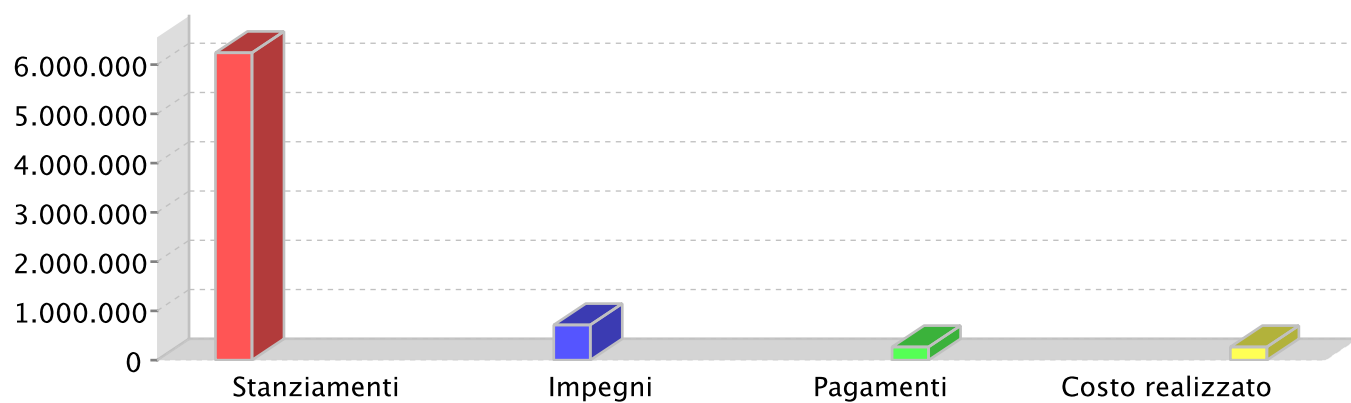

■ Stanziamenti=6.240.170,79 € ■ Impegni=714.732,81 €
■ Pagamenti=268.023,45 € ■ Costo realizzato=268.023,45 €

Avanzamento impegni: 11.46 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.30 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.30 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_1 - ALGHERO - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero

Soggetto Attuatore

COMUNE DI ALGHERO (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Pierpaolo Sanna - Geom. Anna Saba

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

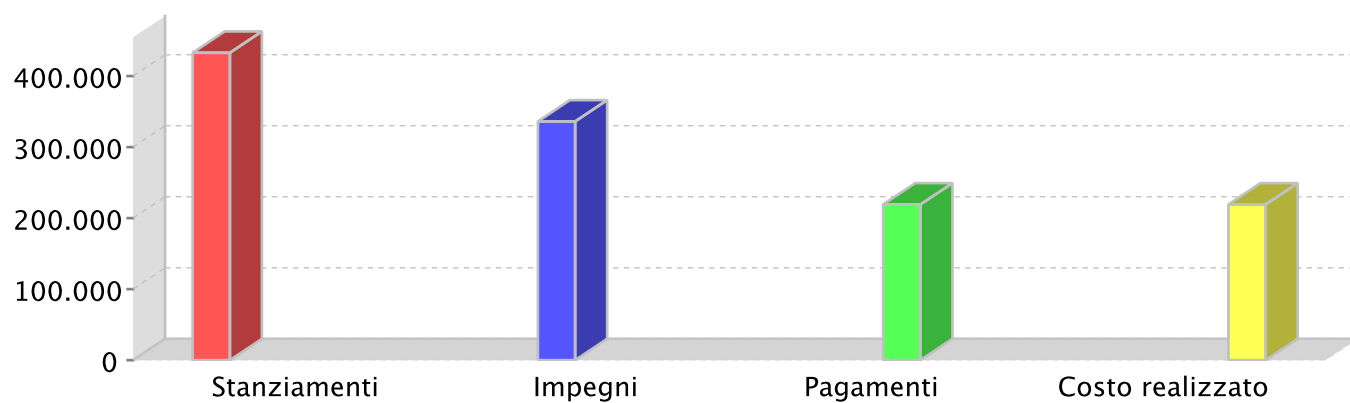

■ Stanziamenti=432.833,60 € ■ Impegni=336.139,79 €
■ Pagamenti=219.255,77 € ■ Costo realizzato=219.255,47 €

Avanzamento impegni: 77.67 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 50.66 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 50.66 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_2 - CAGLIARI - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia

1) CAGLIARI

Comune

Cagliari

Soggetto Attuatore

Comune di Cagliari (CA)

Responsabile dell'intervento


Dott. Alessandro Cossa

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

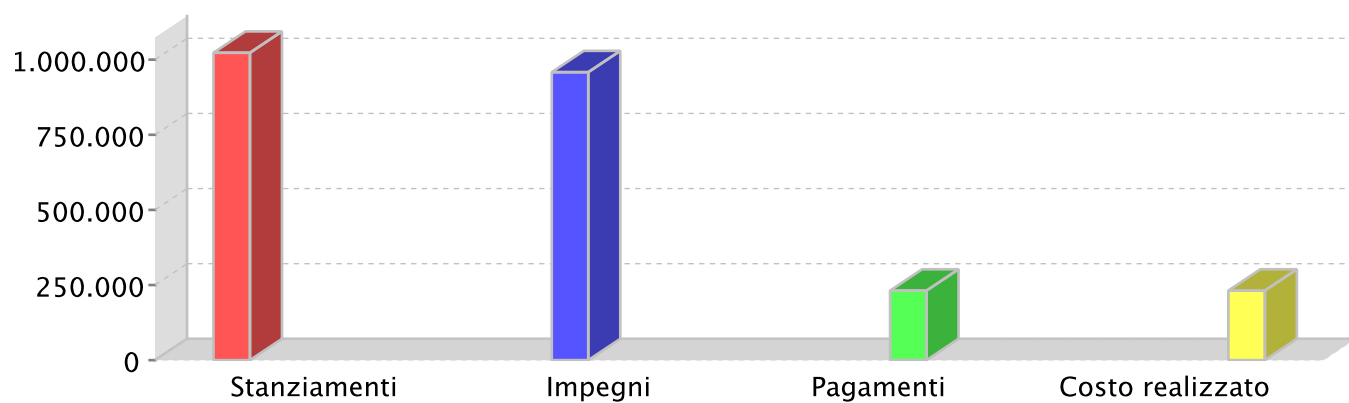

■ Stanziamenti=1.022.917,42 € ■ Impegni=958.283,36 €
■ Pagamenti=231.404,04 € ■ Costo realizzato=231.404,04 €

Avanzamento impegni: 93.69 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 22.63 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 22.63 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_3 - CARBONIA - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Comune di Carbonia (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Giampaolo Porcedda - Dott. Marco Seta

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

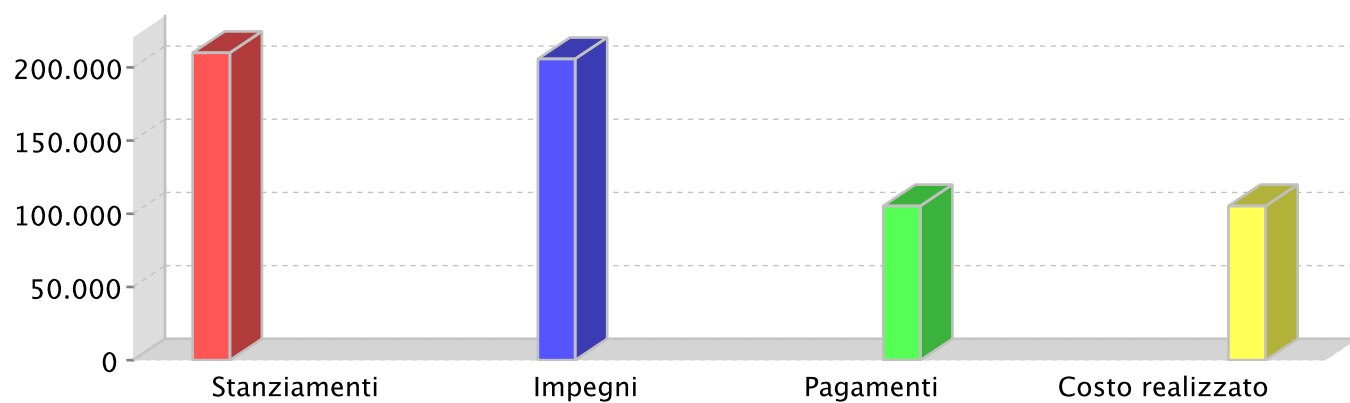

■ Stanziamenti=210.000,00 € ■ Impegni=205.818,32 €
■ Pagamenti=105.348,64 € ■ Costo realizzato=105.349,04 €

Avanzamento impegni: 98.01 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 50.17 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 50.17 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_4 - IGLESIAS - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Iglesias

Soggetto Attuatore

COMUNE DI IGLESIAS (CA)


Responsabile dell'intervento

Dott. Carlo Capuzzi - Geom. Antonio Scanu

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

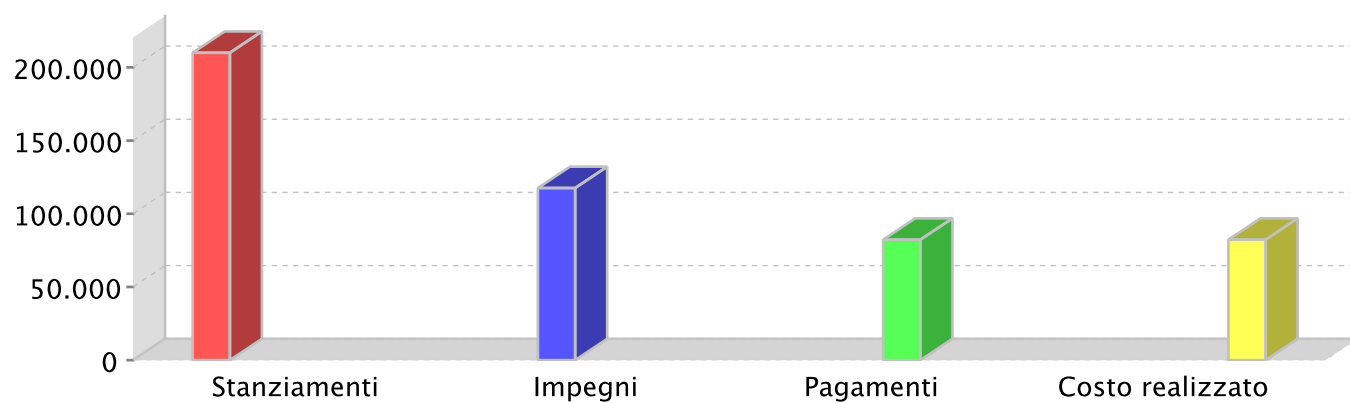

■ Stanziamenti=210.000,00 € ■ Impegni=117.600,00 €
■ Pagamenti=82.320,00 € ■ Costo realizzato=82.320,00 €

Avanzamento impegni: 56.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 39.20 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 39.20 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_5 - NUORO - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Caddeo - Geom. Salvatore Floris

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

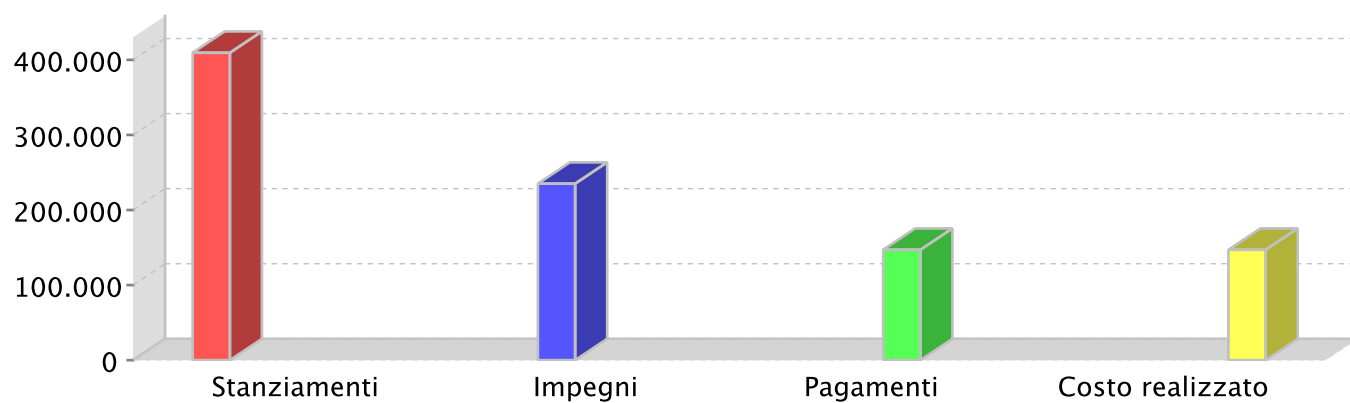

■ Stanziamenti=409.472,15 € ■ Impegni=235.097,02 €
■ Pagamenti=147.080,86 € ■ Costo realizzato=147.080,86 €

Avanzamento impegni: 57.42 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 35.92 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 35.92 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_6 - OLBIA - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

Comune di Olbia (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Giovanni Achenza - Dott.ssa Sabrina Serusi

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

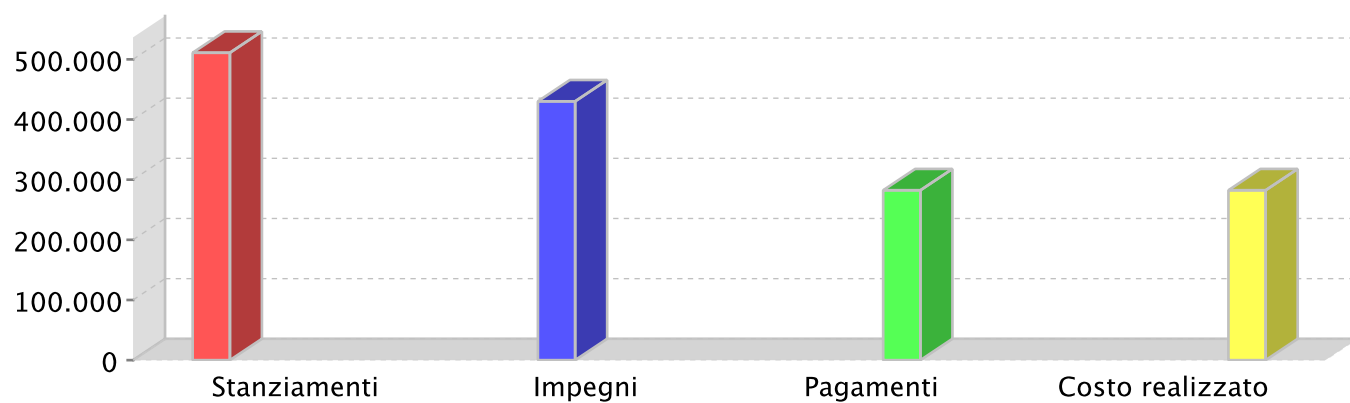

■ Stanziamenti=510.971,13 € ■ Impegni=430.243,84 €
■ Pagamenti=282.417,10 € ■ Costo realizzato=282.417,10 €

Avanzamento impegni: 84.21 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 55.28 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 55.28 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_7 - ORISTANO - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia
1) ORISTANO

Comune
Oristano

Soggetto Attuatore

Comune di Oristano (OR)


Responsabile dell'intervento

Dott. Gabriele Calvisi

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

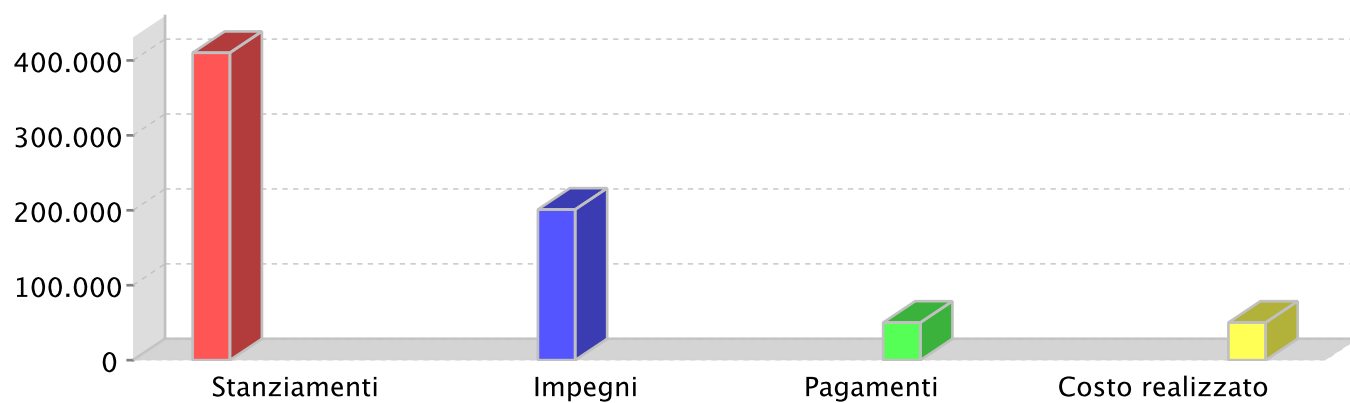

■ Stanziamenti=410.246,79 € ■ Impegni=201.081,16 €
■ Pagamenti=50.188,00 € ■ Costo realizzato=50.188,00 €

Avanzamento impegni: 49.02 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 12.24 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 12.24 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_8 - QUARTU SANT'ELENA - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Quartu Sant'Elena

Soggetto Attuatore

Comune di Quartu Sant'Elena (CA)


Responsabile dell'intervento

Dott.ssa Carmen Atzori

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

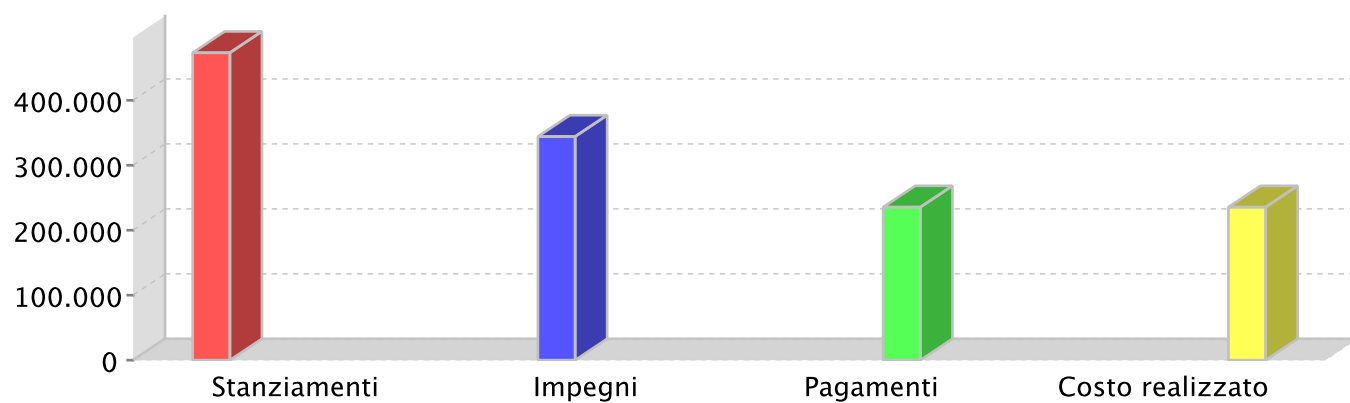

■ Stanziamenti=473.192,98 € ■ Impegni=344.220,76 €
■ Pagamenti=235.515,10 € ■ Costo realizzato=235.515,10 €

Avanzamento impegni: 72.75 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 49.78 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 49.78 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_9 - SASSARI - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Giovanni Scognamillo

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

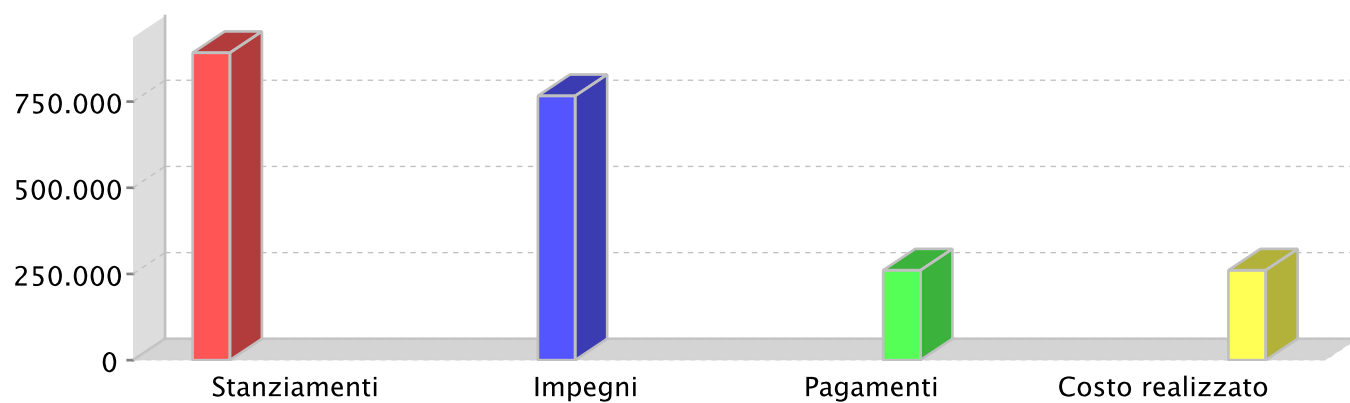

■ Stanziamenti=891.688,03 € ■ Impegni=766.661,83 €
■ Pagamenti=260.847,40 € ■ Costo realizzato=260.847,40 €

Avanzamento impegni: 85.98 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 29.26 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 29.26 % sullo stanziato

Report del progetto: ps_10 - SELARGIUS - piano strategico

Programma/Fonte

Intesa - APQ Aree Urbane

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Selargius

Soggetto Attuatore

Comune di Selargius (CA)


Responsabile dell'intervento

Ing. Massimiliano Schirru

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

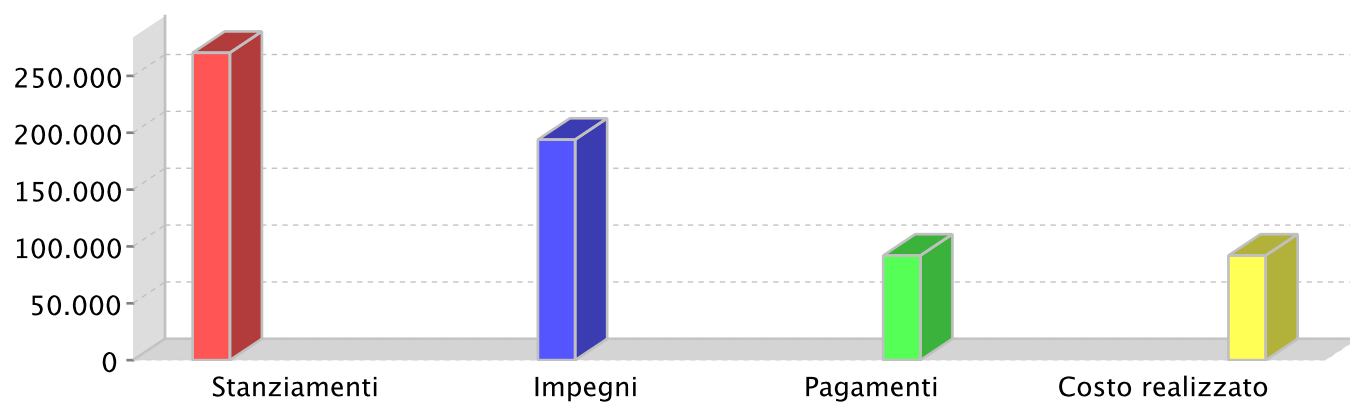

■ Stanziamenti=270.323,36 € ■ Impegni=193.930,00 €
■ Pagamenti=92.012,00 € ■ Costo realizzato=92.012,00 €

Avanzamento impegni: 71.75 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 34.04 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 34.04 % sullo stanziato
