



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


## **STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

Viabilità in Sardegna - I Atto integrativo

## DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

18

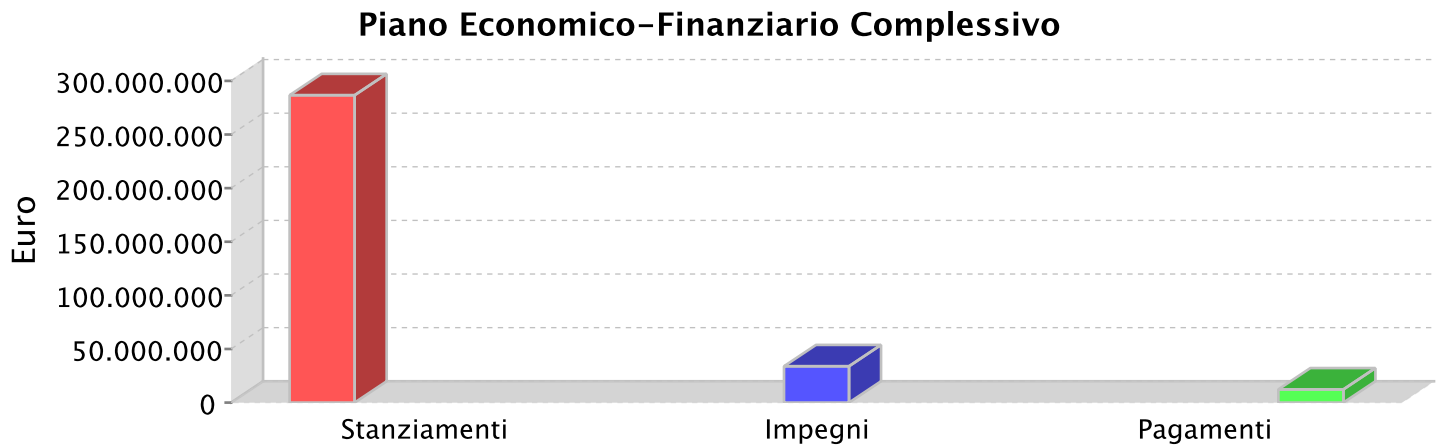


■ Stanziamenti=286.671.022,75 €   ■ Impegni=33.913.022,75 €  
■ Pagamenti =12.311.388,36 €

Avanzamento impegni: 11.83 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.30 % sullo stanziato

### Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

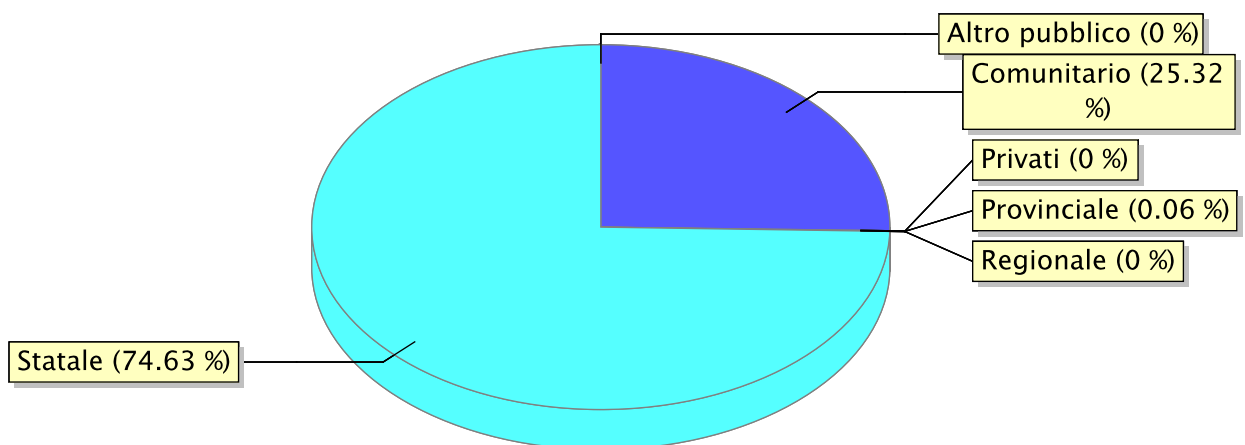

● Altro pubblico = 0   ● Comunitario = 72.565.000   ● Privati = 0  
● Provinciale = 169.825,07   ● Regionale = 0   ● Statale = 213.936.197,68

## Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

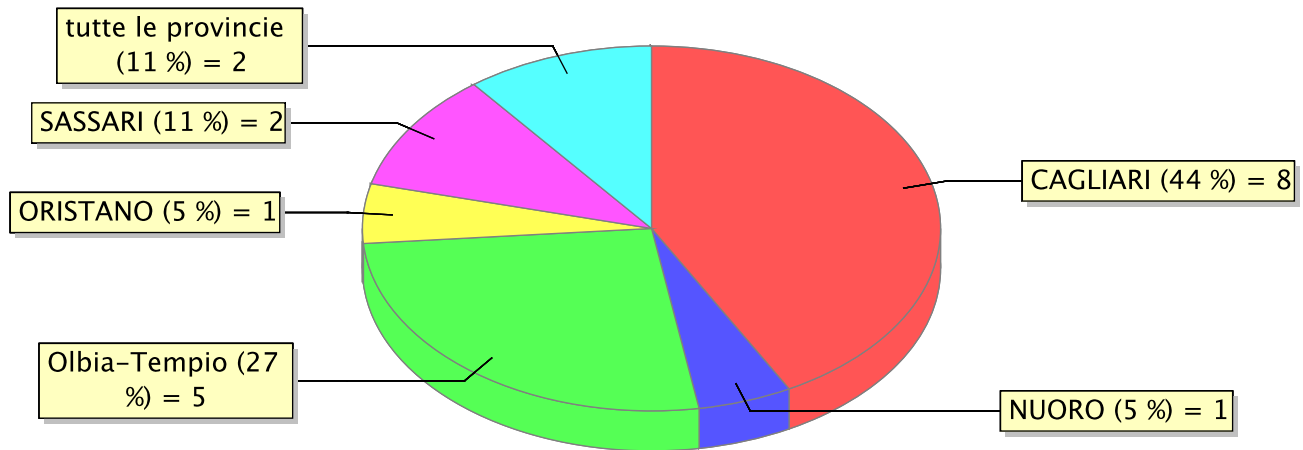

- CAGLIARI (44 %) = 8
- NUORO (5 %) = 1
- Olbia-Tempio (27 %) = 5
- ORISTANO (5 %) = 1
- SASSARI (11 %) = 2
- tutte le provincie (11 %) = 2

## Report del progetto: 115 - Lavori di messa a norma della S.S. 554, eliminazione degli svincoli a raso (asse attrezzato urbano)

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Cagliari
2 ) CAGLIARI	Quartu Sant'Elena
3 ) CAGLIARI	Selargius
4 ) CAGLIARI	Quartucciu
5 ) CAGLIARI	Monsezzato

### Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.


### Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Carboni

### Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

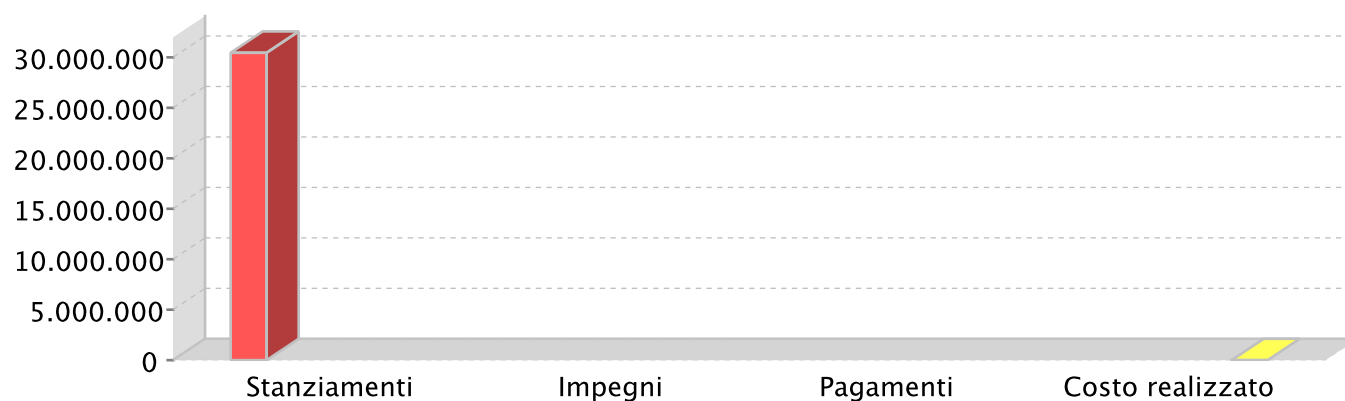

■ Stanziamenti=30.457.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

## Report del progetto: 084a - S.S. 195 1? lotto stralcio

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia  
1 ) CAGLIARI

Comune  
Capoterra

### **Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.

### **Responsabile dell'intervento**


Ing. Giorgio Carboni

### **Stato del progetto**

In corso



## Piano Economico-Finanziario

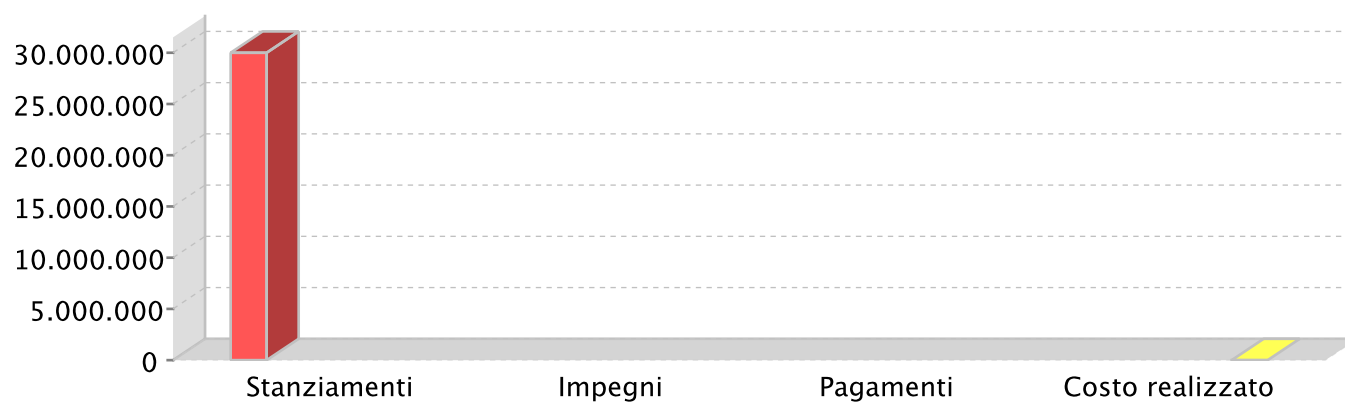

■ Stanziamenti=30.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

## Report del progetto: 074 - S.S. 125/133 bis Olbia-Palau 2? lotto 1? stralcio

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Arzachena
2 ) Olbia-Tempio	Olbia

### Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.

### Responsabile dell'intervento


Arch. Luciano Berardi

### Stato del progetto

In corso



## Piano Economico-Finanziario

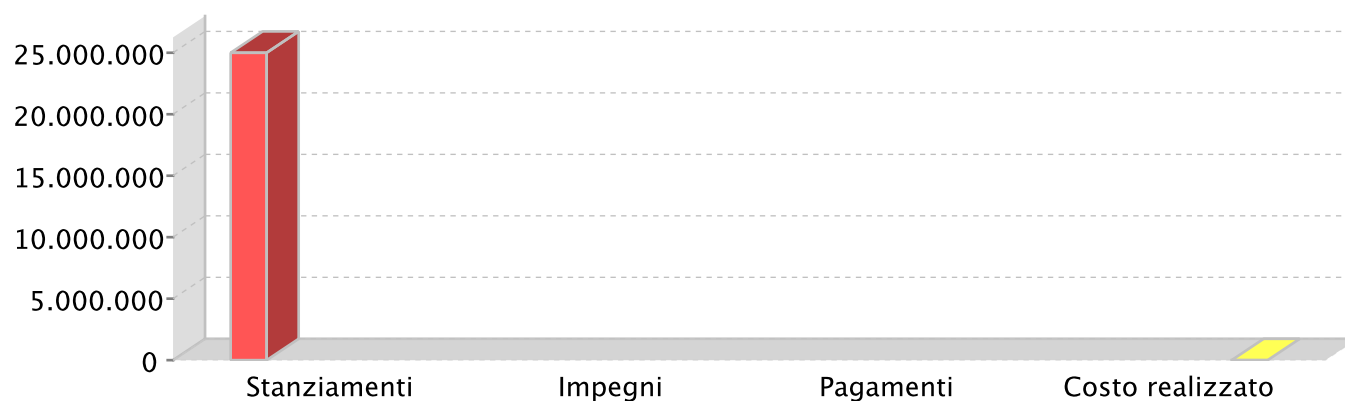

■ Stanziamenti=25.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

## Report del progetto: 120 - Ammodernamento e riassetto funzionale della rete stradale dell'ANAS (strade di competenza statale e regionale)

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilità in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) tutte le provincie	tutti i comuni

### Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


### Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Sergio Cocciu

### Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

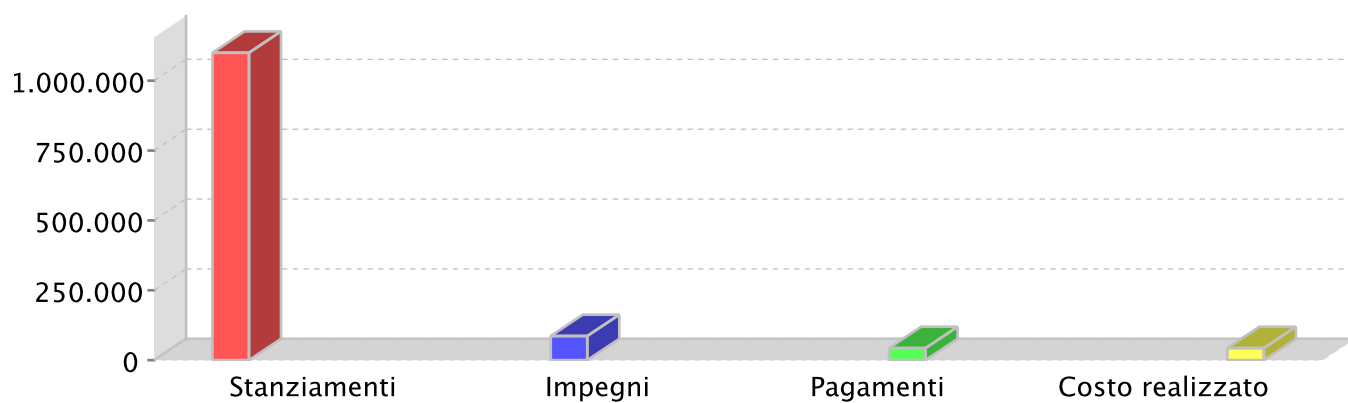

■ Stanziamenti=1.100.000,00 € ■ Impegni=86.400,00 €  
■ Pagamenti=43.200,00 € ■ Costo realizzato=43.200,00 €

Avanzamento impegni: 7.86 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.93 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 3.93 % sullo stanziato

## Report del progetto: 121 - Realizzazione di percorsi stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi viari regionali

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilità in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) tutte le provincie	tutti i comuni

### **Soggetto Attuatore**

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


### **Responsabile dell'intervento**

Dott. Ing. Sergio Cocciu

### **Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

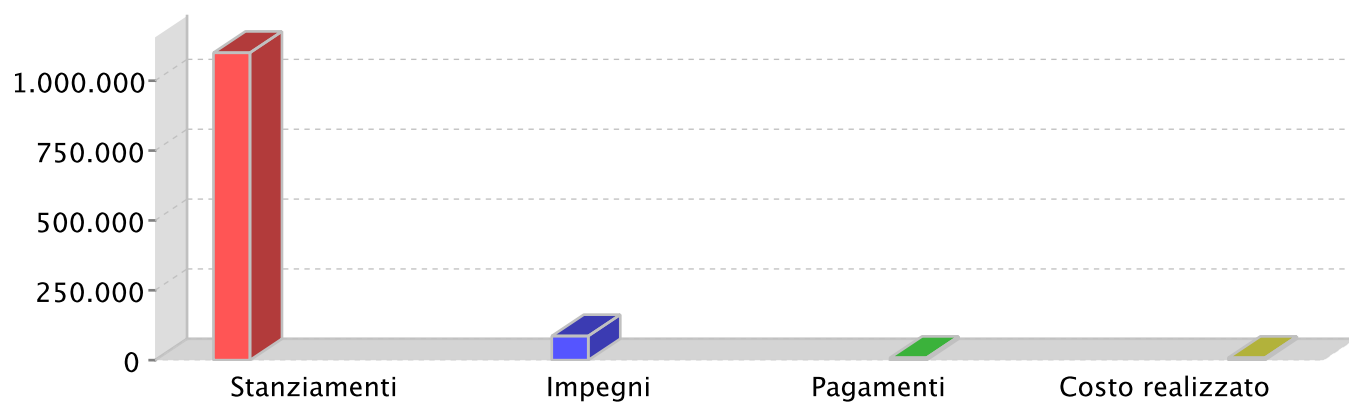

■ Stanziamenti=1.100.000,00 € ■ Impegni=86.400,00 € ■ Pagamenti=8.640,00 €  
■ Costo realizzato=8.640,00 €

Avanzamento impegni: 7.86 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.79 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.79 % sullo stanziato

## Report del progetto: 122 - S.P. 70 "Bassacutena-Porto Pozzo" completamento lavori di ammodernamento

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Tempio Pausania

### **Soggetto Attuatore**

Provincia di Sassari

### **Responsabile dell'intervento**


Geom. G. Prunas

### **Stato del progetto**

In corso



## Piano Economico-Finanziario

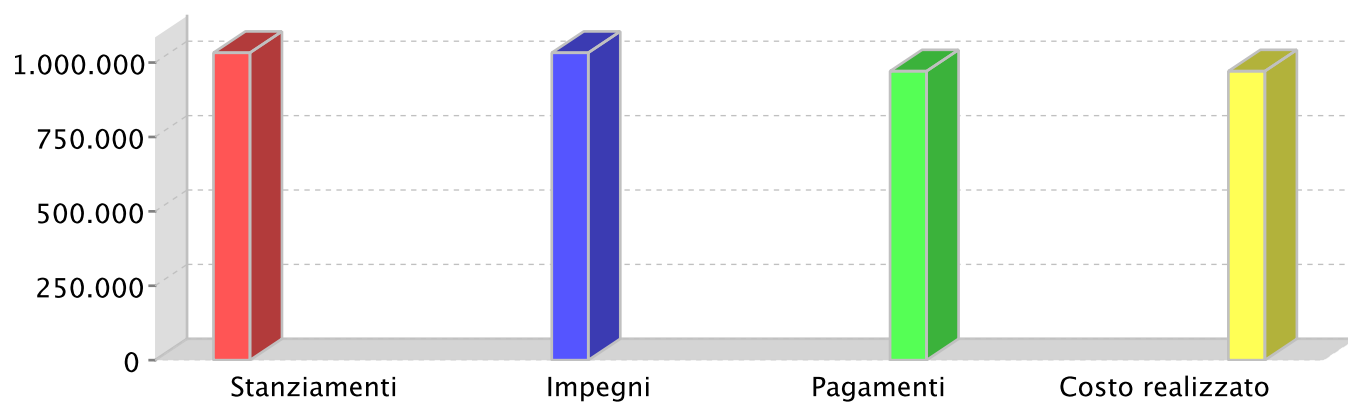

■ Stanziamenti=1.032.913,80 €   ■ Impegni=1.032.913,80 €  
■ Pagamenti=971.056,89 €   ■ Costo realizzato=971.056,89 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 94.02 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 94.02 % sullo stanziato

## Report del progetto: 123 - Circonvallazione di Luras, dalla SP. 10 inizio abitato alla SP. 10 fine abitato

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Luras

### Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari

### Responsabile dell'intervento


Geom. Francesco Uzzano

### Stato del progetto

In corso



## Piano Economico-Finanziario

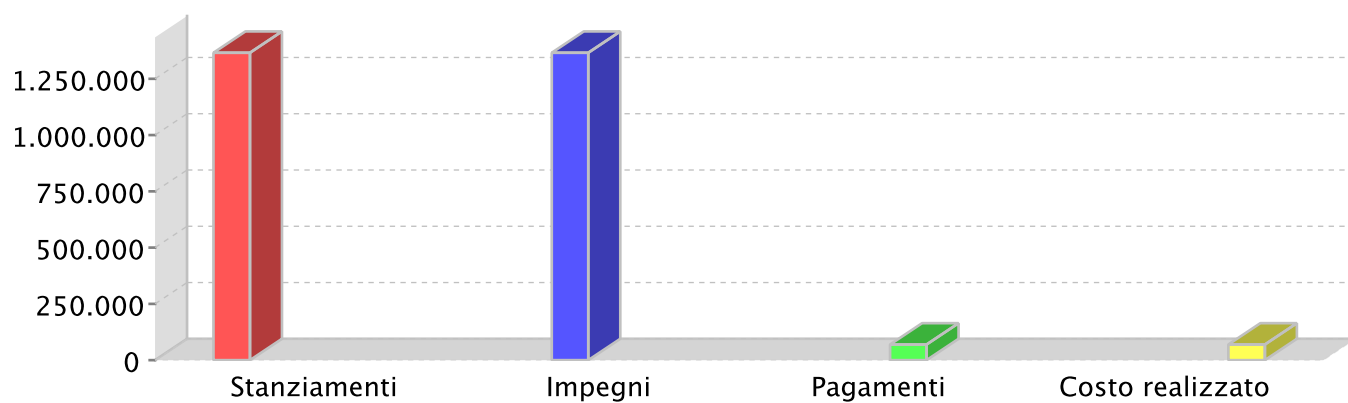

■ Stanziamenti=1.365.717,52 € ■ Impegni=1.365.717,52 €

■ Pagamenti=69.461,54 € ■ Costo realizzato=69.461,54 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 5.09 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 5.09 % sullo stanziato

# Report del progetto: 124 - SP.14M sopraelevata di Olbia sud - completamento lavori di adeguamento e miglioramento funzionale

## Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

## Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Olbia

## Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari

## Responsabile dell'intervento


Geom. Mario Soddu

## Stato del progetto

In corso



## Piano Economico-Finanziario

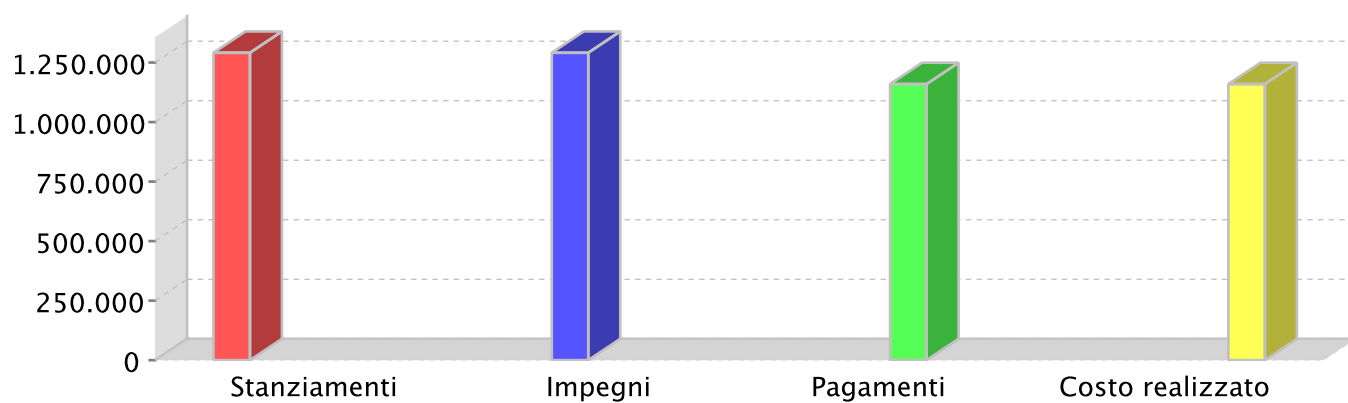

■ Stanziamenti=1.291.142,25 €   ■ Impegni=1.291.142,25 €  
■ Pagamenti=1.159.630,30 €   ■ Costo realizzato=1.159.630,30 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 89.82 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 89.82 % sullo stanziato

## Report del progetto: 125 - Strada di accesso a Sedini, dalla S.S. 134 alla SP. 13M

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Sedini

### **Soggetto Attuatore**

Provincia di Sassari


### **Responsabile dell'intervento**

Ing. Giovanni Mignano

### **Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

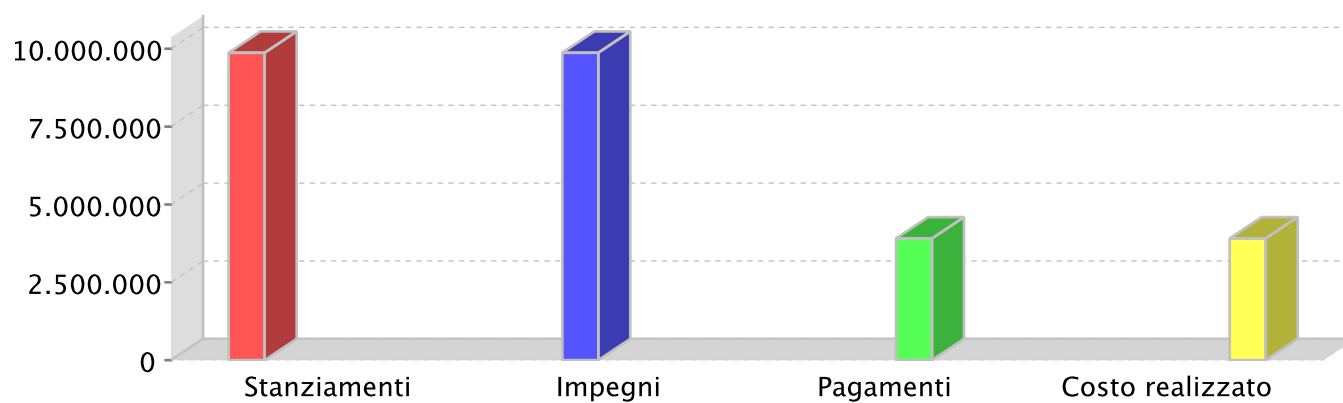

■ Stanziamenti=9.871.767,00 €   ■ Impegni=9.871.767,00 €  
■ Pagamenti=3.908.554,02 €   ■ Costo realizzato=3.908.554,02 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 39.60 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 39.60 % sullo stanziato

# Report del progetto: 126 - Costruzione della strada di circonvallazione di Abbiadori dalla SP. 59/bis alla SP. 94

## Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilità in Sardegna - I Atto integrativo

## Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Arzachena

## Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari


## Responsabile dell'intervento

Geom. Mario Soddu

## Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

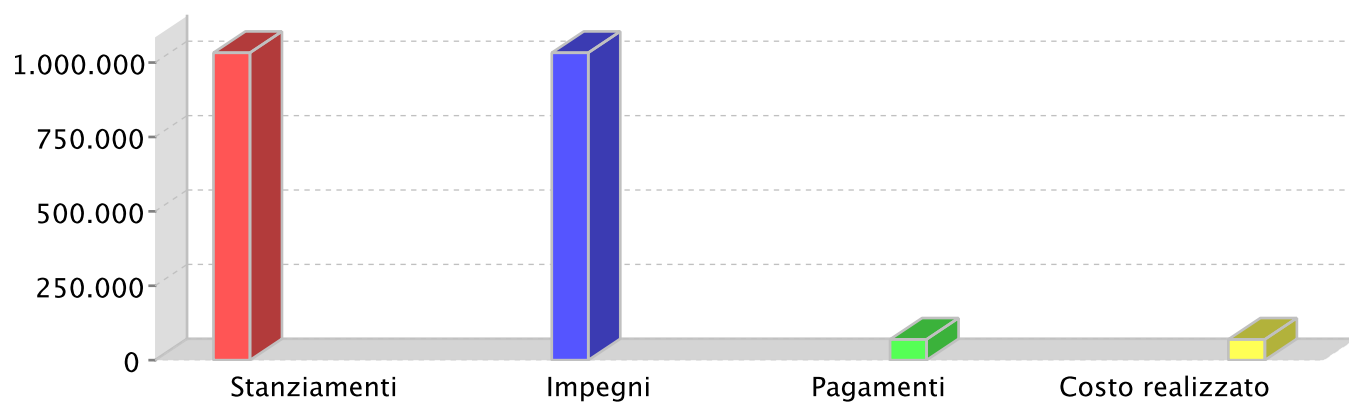

■ Stanziamenti=1.032.913,80 € ■ Impegni=1.032.913,80 €

■ Pagamenti=69.807,41 € ■ Costo realizzato=69.807,41 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 6.76 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 6.76 % sullo stanziato

## Report del progetto: 127 - SP. 25 Sorso - Sassari, lavori di adeguamento e messa in sicurezza

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Sorso

### Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari

### Responsabile dell'intervento

Ing. Fabrizio Monaldi


### Stato del progetto

In corso





## Piano Economico-Finanziario

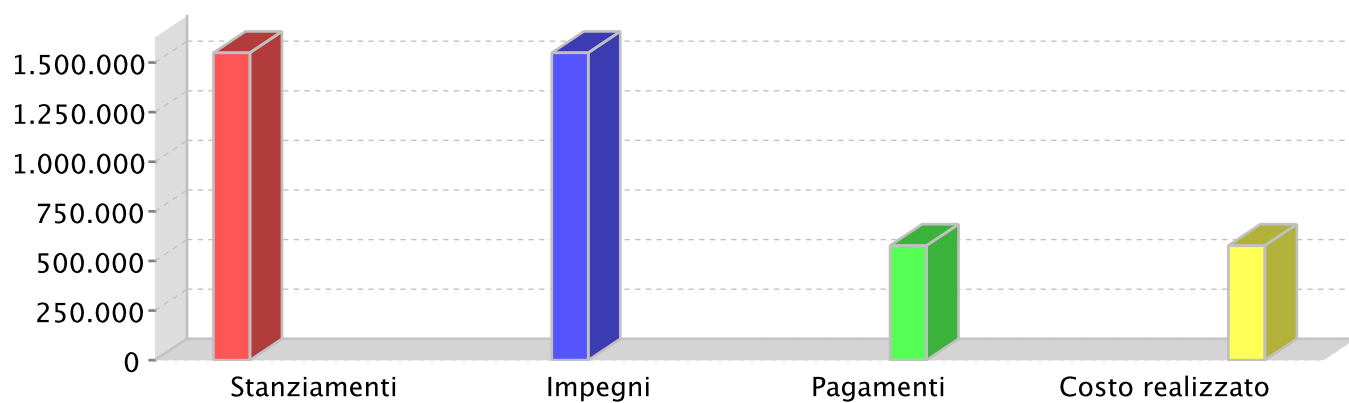

■ Stanziamenti=1.549.370,70 € ■ Impegni=1.549.370,70 €  
■ Pagamenti=577.539,04 € ■ Costo realizzato=577.539,04 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 37.28 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 37.28 % sullo stanziato

## Report del progetto: 040 - S.S. 131 dcn Barriera centrale 1? lotto tratto Abbasanta-Nuoro

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) NUORO	Nuoro
2 ) ORISTANO	Abbasanta

### Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.


### Responsabile dell'intervento

Ing. Enrico Atzeni

### Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

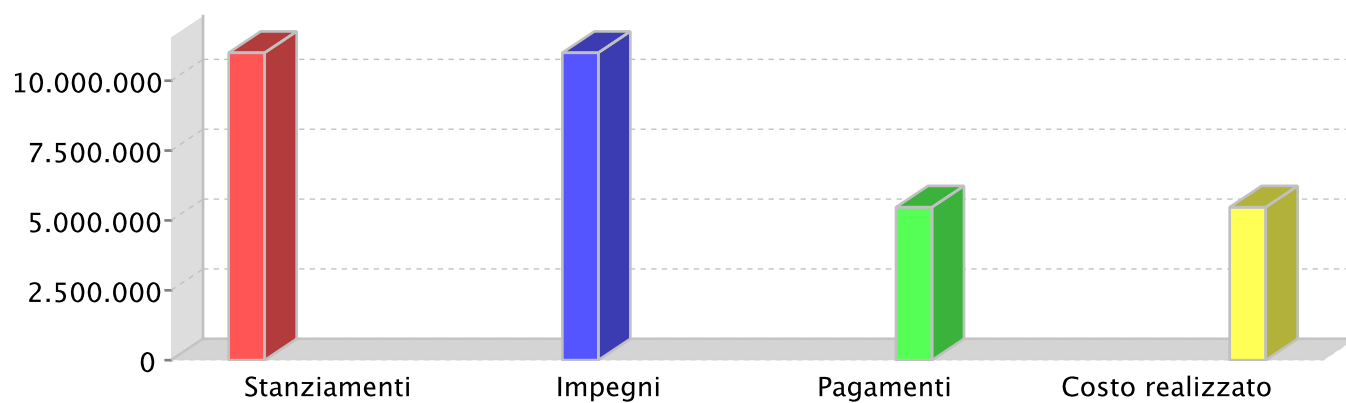

■ Stanziamenti=11.000.000,00 €   ■ Impegni=11.000.000,00 €  
■ Pagamenti=5.472.626,67 €   ■ Costo realizzato=5.472.626,67 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 49.76 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 49.76 % sullo stanziato

Report del progetto: 083b - S.S. 195 messa in sicurezza 2? lotto km. 10+500-12+550 3 rotatorie svincolo Maramura, svincolo Capoterra,

**Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Capoterra

**Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.


**Responsabile dell'intervento**

Ing. Giorgio Carboni

**Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

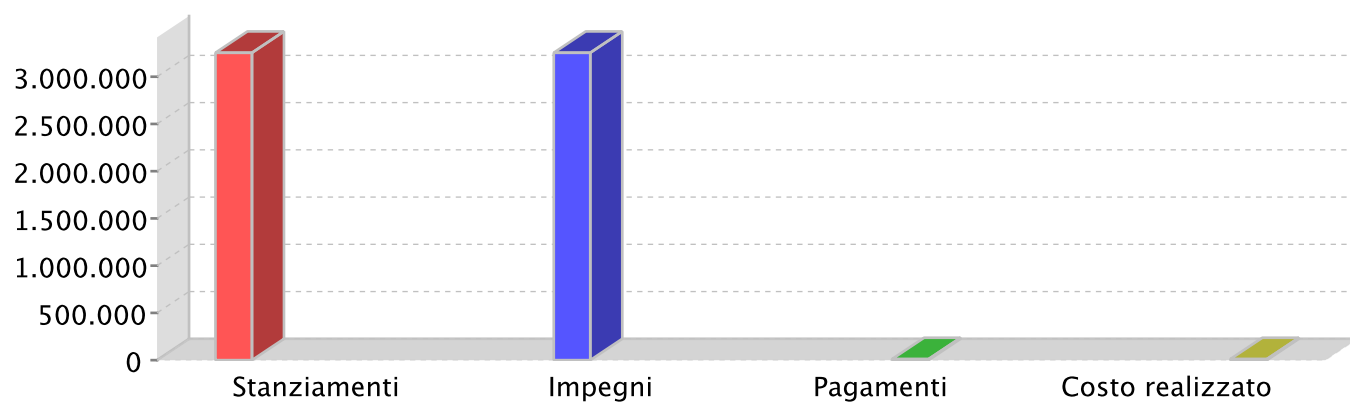

■ Stanziamenti=3.253.631,68 € ■ Impegni=3.253.631,68 €

■ Pagamenti=11.237,84 € ■ Costo realizzato=11.237,84 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.35 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.35 % sullo stanziato

Report del progetto: 083e - S.S. 195 messa in sicurezza 5? lotto km. 13+500-14+000 rotatorie doppia Torre degli Ulivi - Su Spantu.

**Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Capoterra

**Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.


**Responsabile dell'intervento**

Ing. Giorgio Carboni

**Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

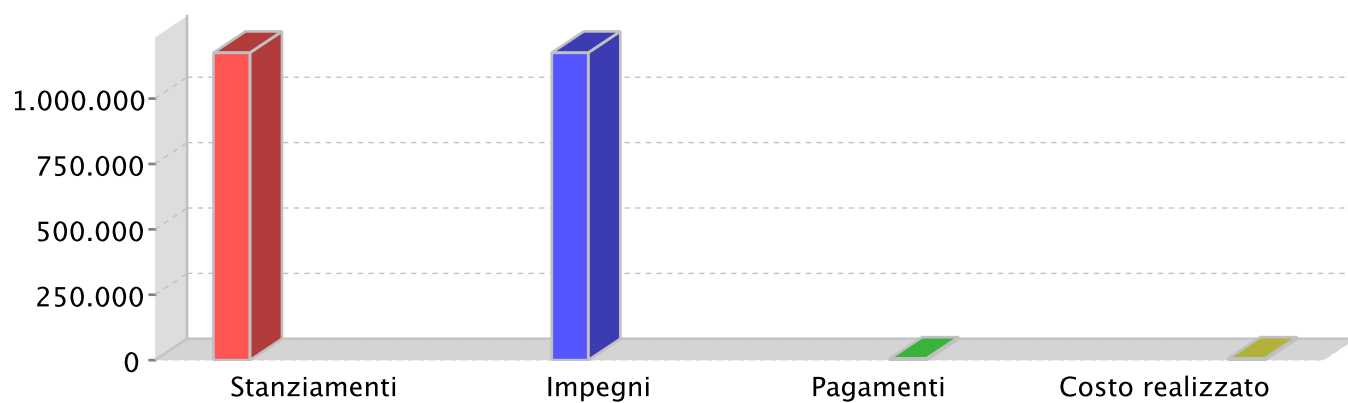

■ Stanziamenti=1.175.098,00 € ■ Impegni=1.175.098,00 €

■ Pagamenti=6.372,34 € ■ Costo realizzato=6.372,34 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.55 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.55 % sullo stanziato

## Report del progetto: 083f - S.S. 195 messa in sicurezza 6? lotto km. 12+500-13+500 intersezione San Girolamo

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia  
1 ) CAGLIARI

Comune  
Capoterra

### **Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.

### **Responsabile dell'intervento**

Ing. Giorgio Carboni


### **Stato del progetto**

In corso





## Piano Economico-Finanziario

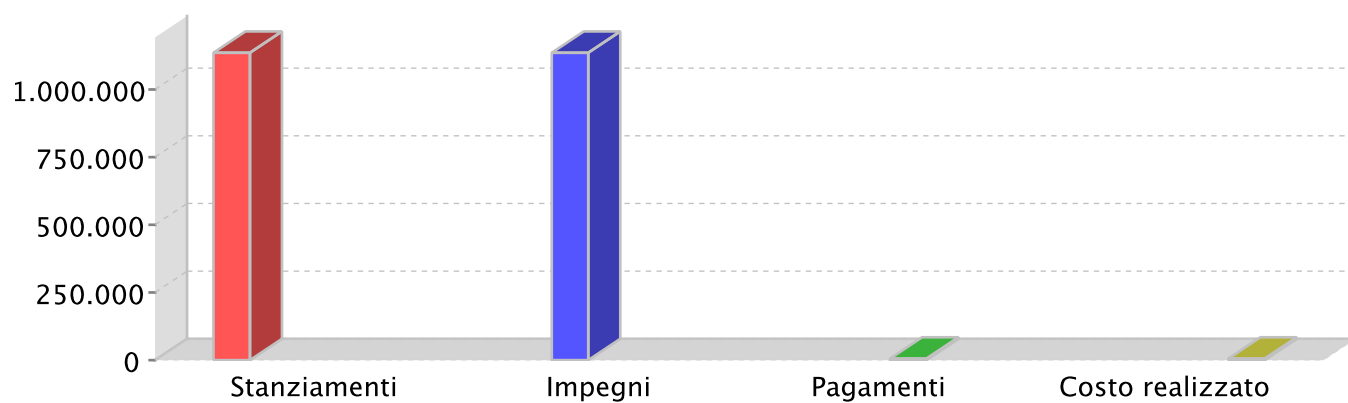

■ Stanziamenti=1.135.668,00 € ■ Impegni=1.135.668,00 €

■ Pagamenti=5.688,71 € ■ Costo realizzato=5.688,71 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.51 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.51 % sullo stanziato

Report del progetto: 083g - S.S. 195 messa in sicurezza 7? lotto 1? stralcio km.  
14+000-15+000 Su Loi

**Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Capoterra

**Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.


**Responsabile dell'intervento**

Ing. Giorgio Carboni

**Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

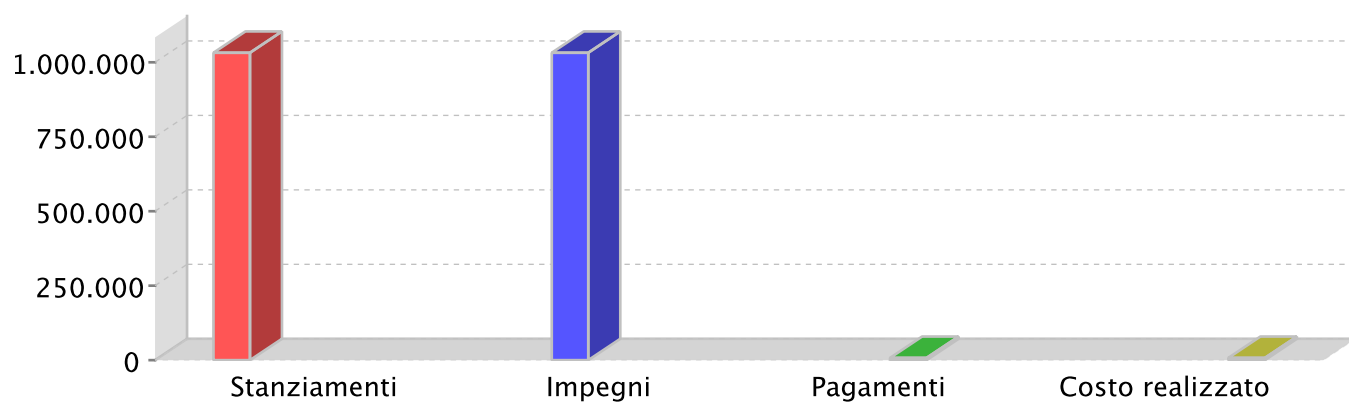

■ Stanziamenti=1.032.000,00 € ■ Impegni=1.032.000,00 €

■ Pagamenti=7.573,60 € ■ Costo realizzato=7.573,60 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.74 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.74 % sullo stanziato

Report del progetto: 083h - S.S. 195 messa in sicurezza 7? lotto 2? stralcio km.  
14+000-15+000 Su Loi.

**Programma/Fonte**

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Capoterra

**Soggetto Attuatore**

ANAS S.p.A.


**Responsabile dell'intervento**

Ing. Giorgio Carboni

**Stato del progetto**

In corso

## Piano Economico-Finanziario

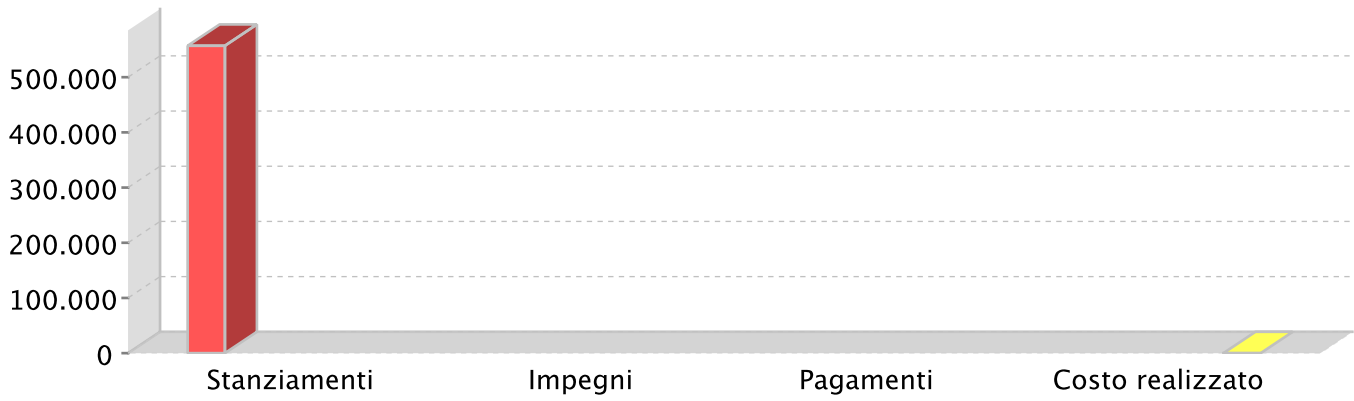

■ Stanziamenti=557.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

## Report del progetto: 085 new - S.S. 195 tratto Cagliari - Pula 2?, 3? e 5? lotto

### Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - I Atto integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) CAGLIARI	Capoterra
2 ) CAGLIARI	Pula
3 ) CAGLIARI	Sarroch
4 ) CAGLIARI	Villa San Pietro

### Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.


### Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Carboni

### Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

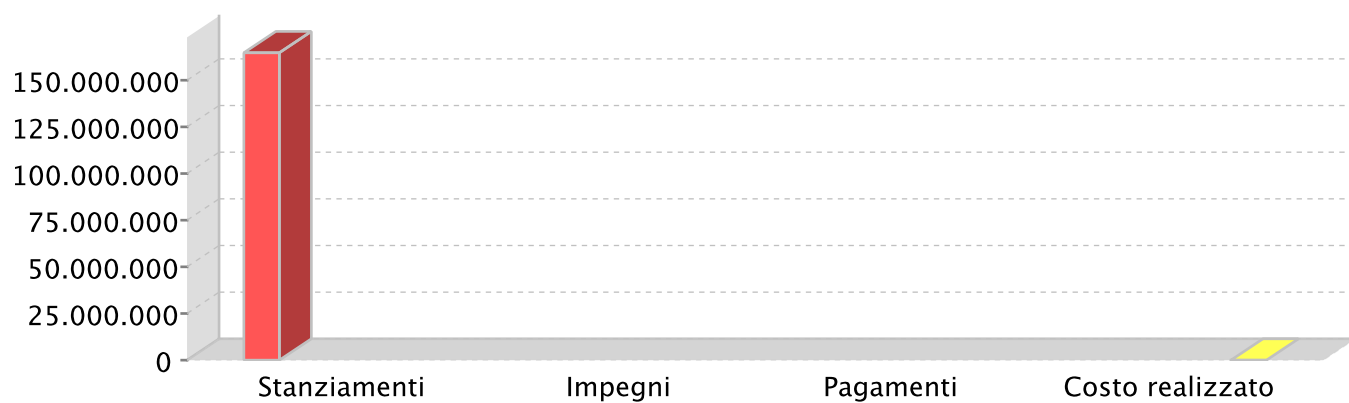

■ Stanziamenti=164.716.800,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
