



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO


Viabilità in Sardegna - Il Atto integrativo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

8

Piano Economico-Finanziario Complessivo

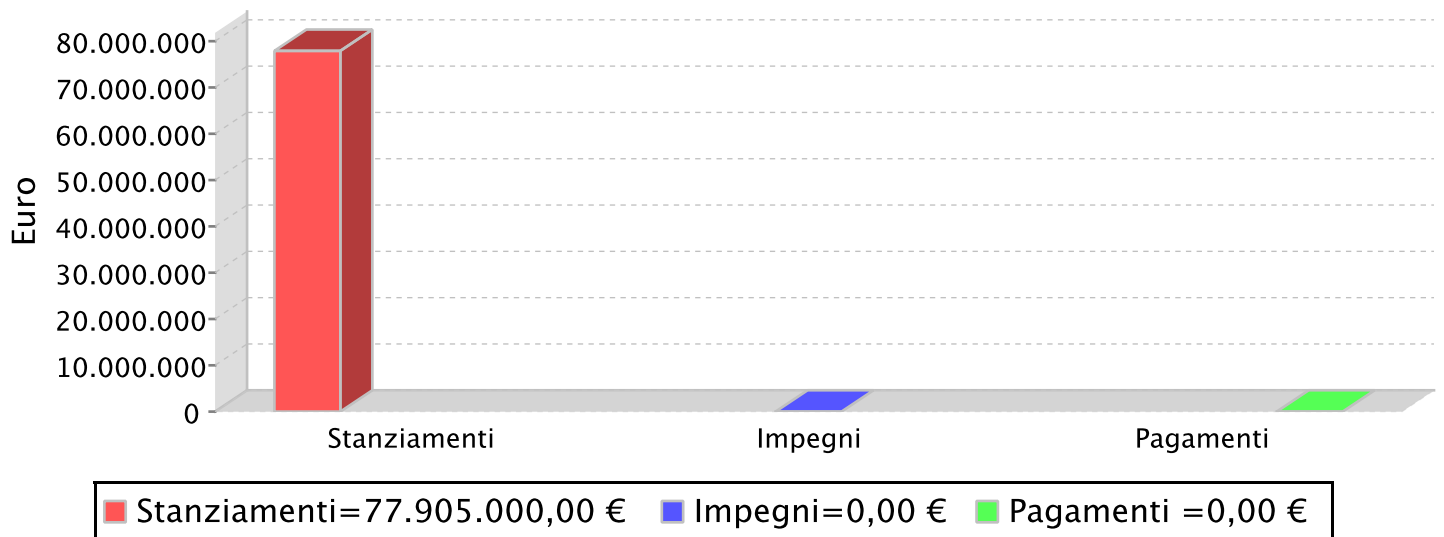


Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

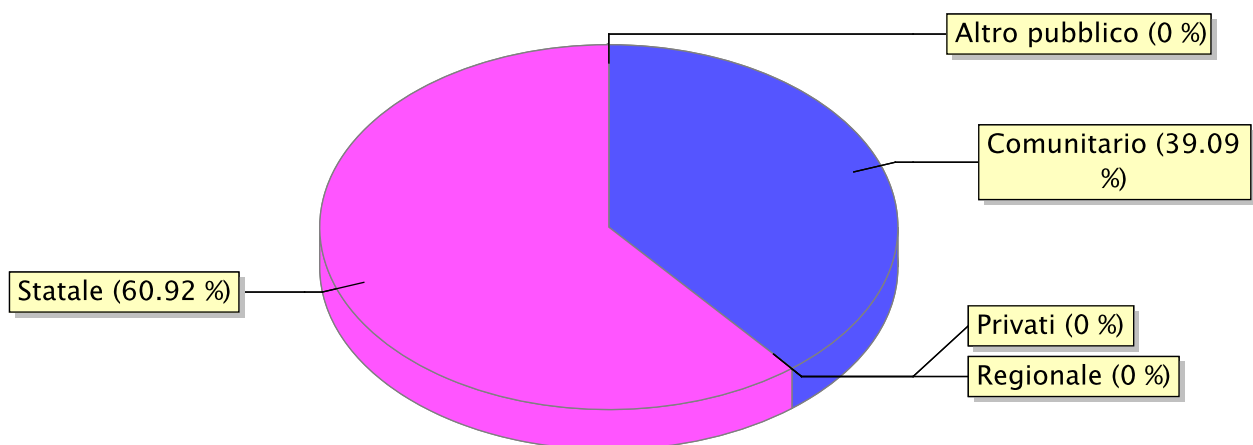

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 30.447.000 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 47.458.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

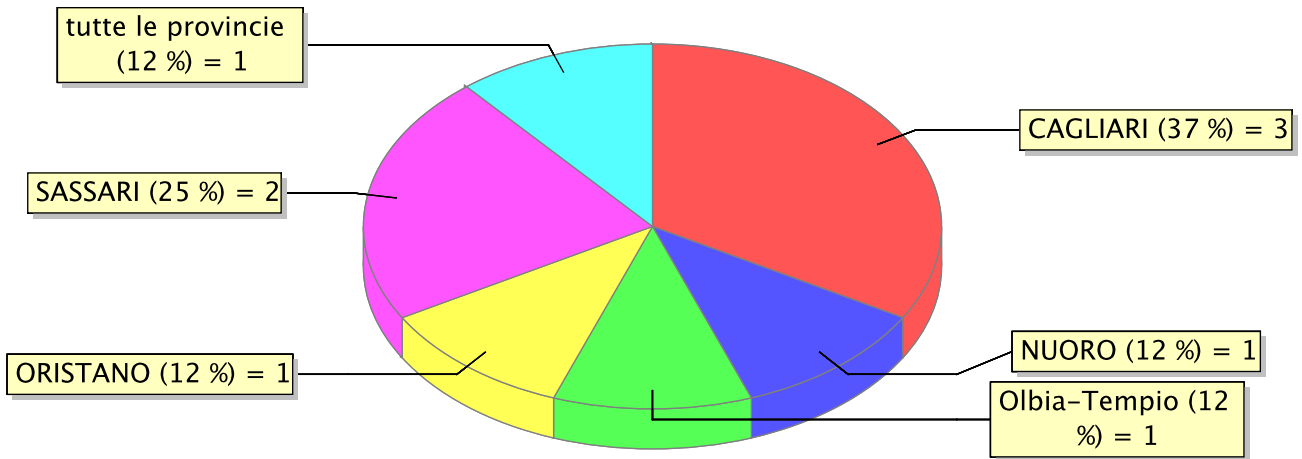

● CAGLIARI (37 %) = 3 ● NUORO (12 %) = 1 ● Olbia-Tempio (12 %) = 1
● ORISTANO (12 %) = 1 ● SASSARI (25 %) = 2 ● tutte le provincie (12 %) = 1

Report del progetto: 081 - S.S. 291 " Lavori di costruzione della nuova S.S. 291 Olmedo - Intersezione S.S. 291 esistente, 3? lotto"

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Olmedo

Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.


Responsabile dell'intervento

Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

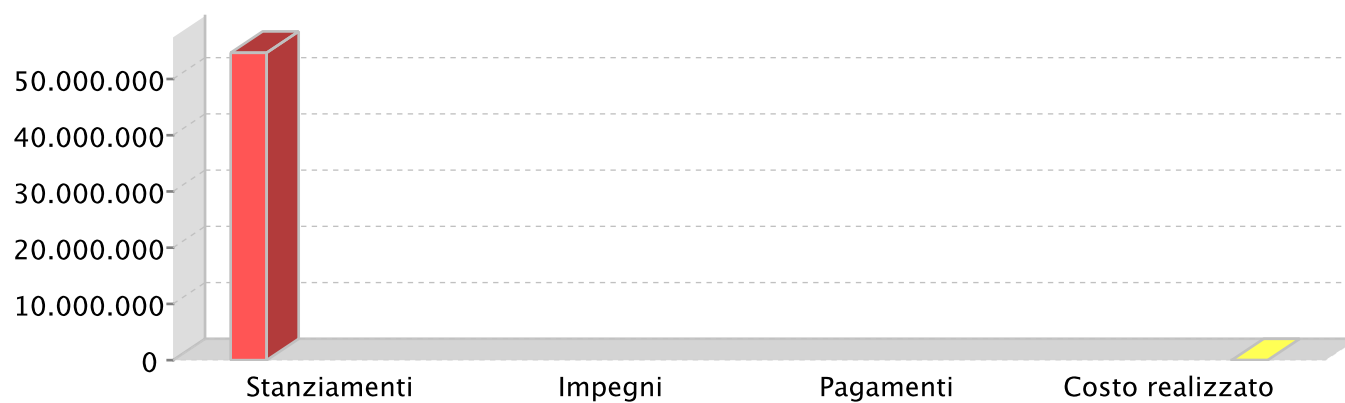

■ Stanziamenti=54.666.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 128 - Trasversale sarda - Collegamento Oristano/Tortoli - 1? lotto 1? stralcio - Lavori di adeguamento della S.P.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Mamoiada
2) NUORO	Sarule

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Responsabile dell'intervento

Geom. Franco Bertocchi

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario



■ Stanziamenti=10.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €

■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 129 - Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per incrementare le possibilità di accesso

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilità in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) tutte le provincie	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

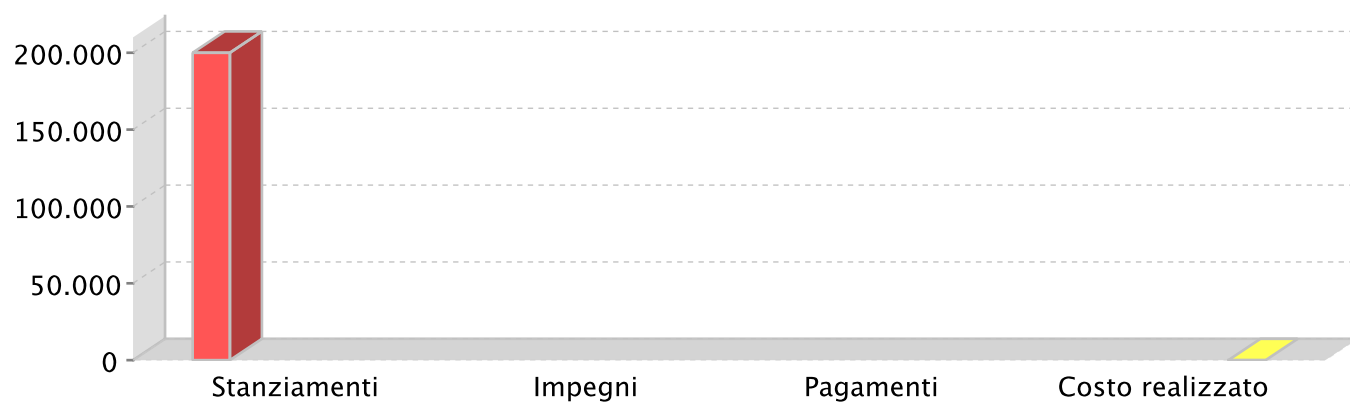

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 130 - Studio per la razionalizzazione e ottimizzazione delle connessioni viarie tra il Sulcis-Iglesiente e

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilità in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	tutti i comuni
2) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

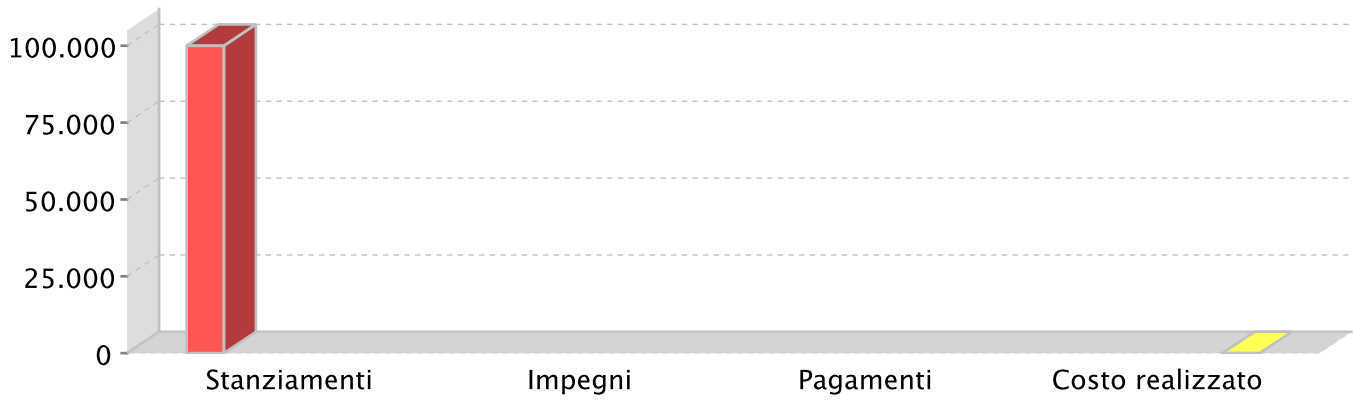

■ Stanziamenti=100.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 131 - S.S. 131 "Cagliari-Sassari" tratto km 23+885 e km 32+412 Sovrappasso sulla S.S. 131 della strada comunale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Nuraminis

Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.

Responsabile dell'intervento


Arch. Luciano Berardi

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

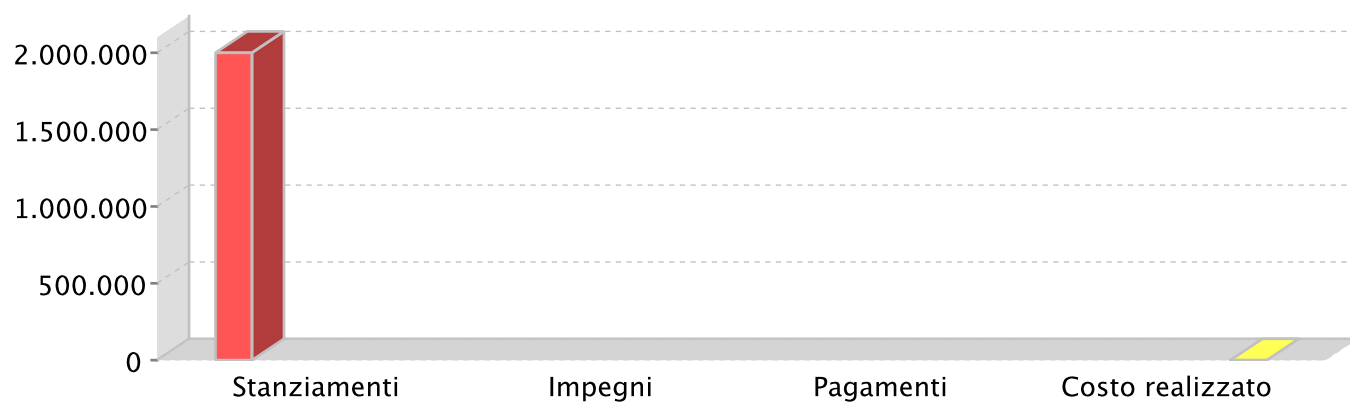

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 133 - S.S. 125 "Cagliari-Olbia" Ponte sul rio Padrongianus al km 311+860

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.


Responsabile dell'intervento

Dott. Ing. Nicola Montesano

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

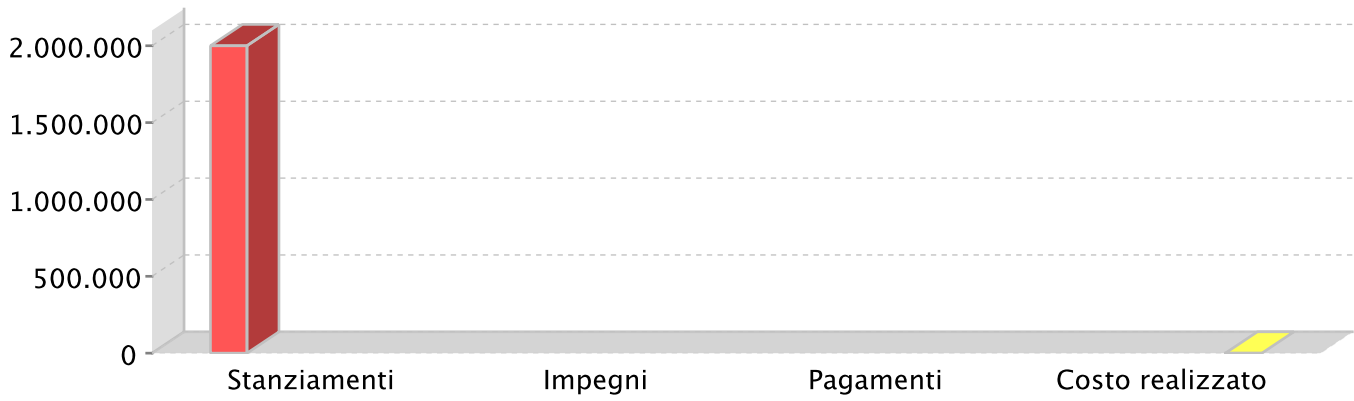

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 134 - S.S. 128 "Messa in sicurezza dei punti critici della S.S. 128 nei tratti Senorbi-Isili

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Senorbi'
2) CAGLIARI	Isili

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

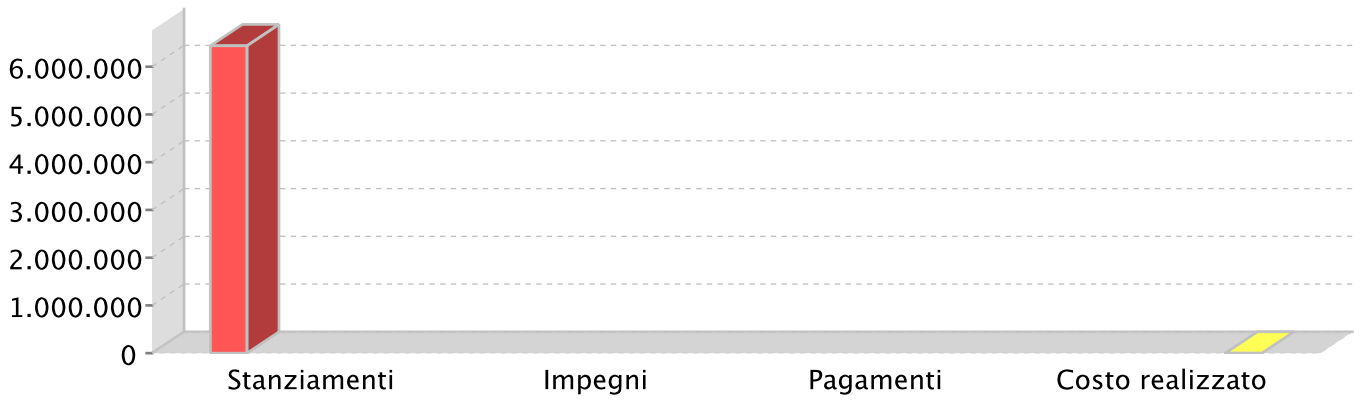

■ Stanziamenti=6.439.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: 132 - S.S. 131 "Cagliari-Sassari" Innesto della variante di Sassari-Truncu Reale-Porto Torres al km 209+400

Programma/Fonte

Intesa - APQ Viabilita in Sardegna - Il Atto integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

ANAS S.p.A.

Responsabile dell'intervento


Dott. Ing. Nicola Montesano

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

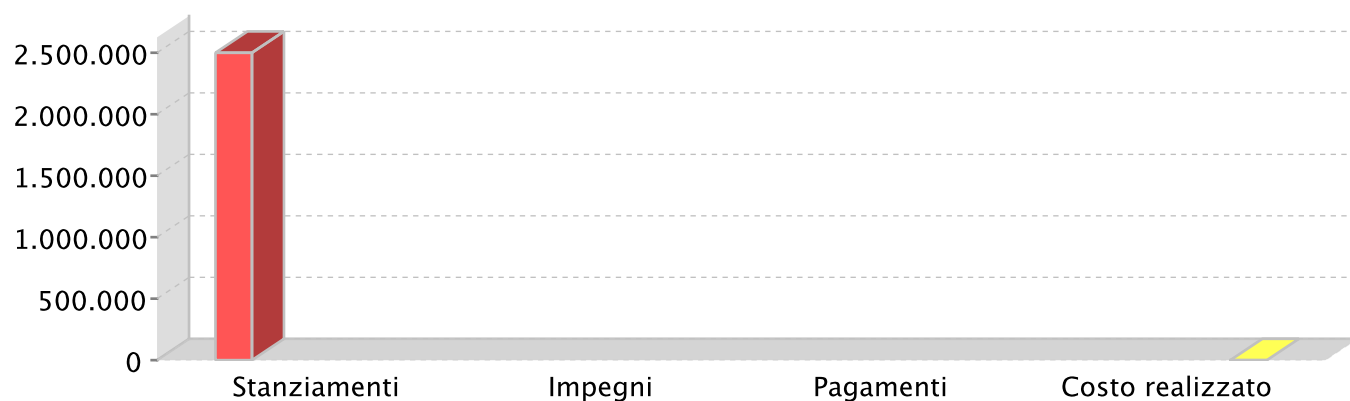

■ Stanziamenti=2.500.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
