



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Difesa del Suolo

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

39

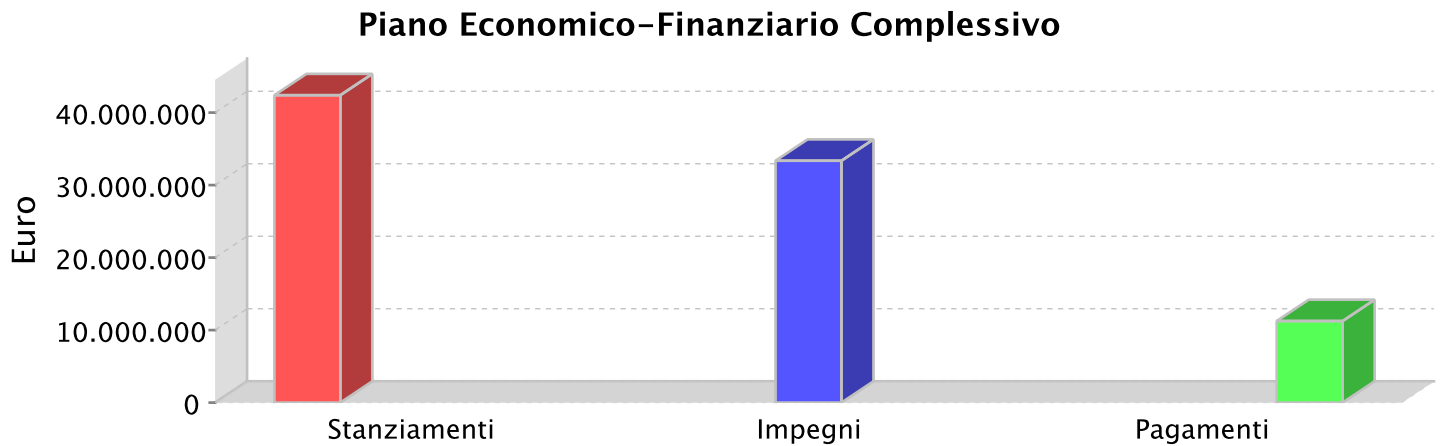


■ Stanziamenti=42.400.000,00 € ■ Impegni=33.364.814,32 €
■ Pagamenti =11.251.317,29 €

Avanzamento impegni: 78.70 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 26.54 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

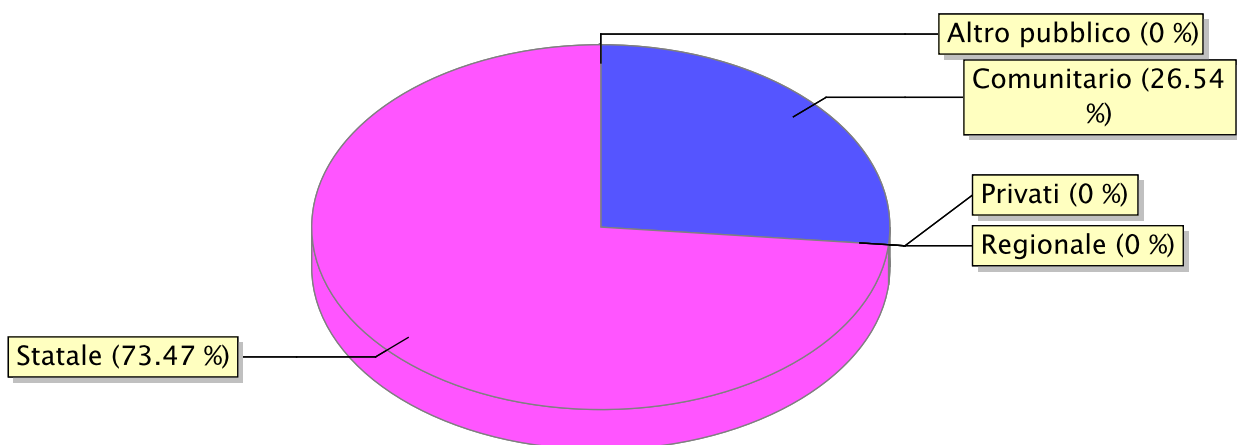

● Altro pubblico = 0 ● Comunitario = 11.250.000 ● Privati = 0 ● Regionale = 0
● Statale = 31.150.000

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

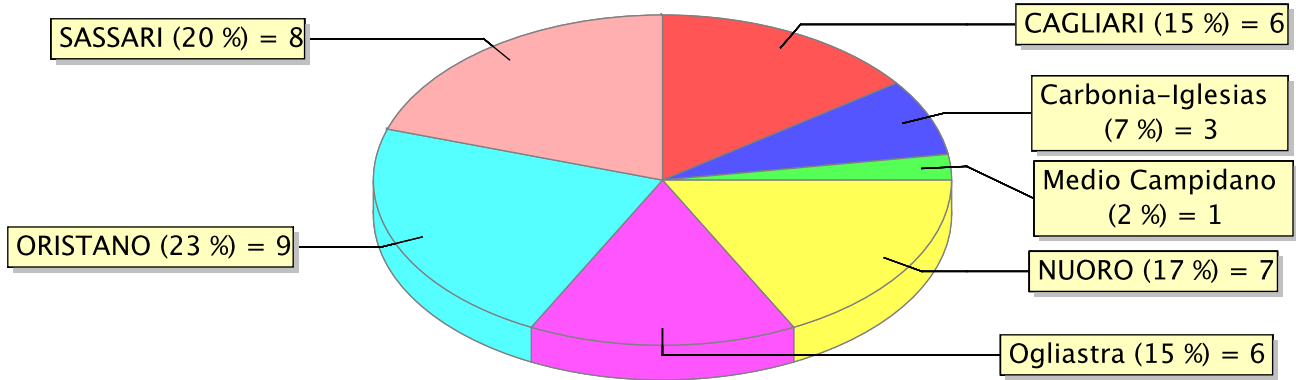

● CAGLIARI (15 %) = 6 ● Carbonia-Iglesias (7 %) = 3 ● Medio Campidano (2 %) = 1
● NUORO (17 %) = 7 ● Ogliastro (15 %) = 6 ● ORISTANO (23 %) = 9
● SASSARI (20 %) = 8

Report del progetto: DF10 - OPERE PER LA RIDUZIONE DEL PERICOLO FRANE SS 292 - SENNARIOLO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) ORISTANO

Comune
Sennariolo

Soggetto Attuatore

Comune di Sennariolo (OR)

Responsabile dell'intervento


Paolo Sinis

Stato del progetto

Realizzato



Piano Economico-Finanziario

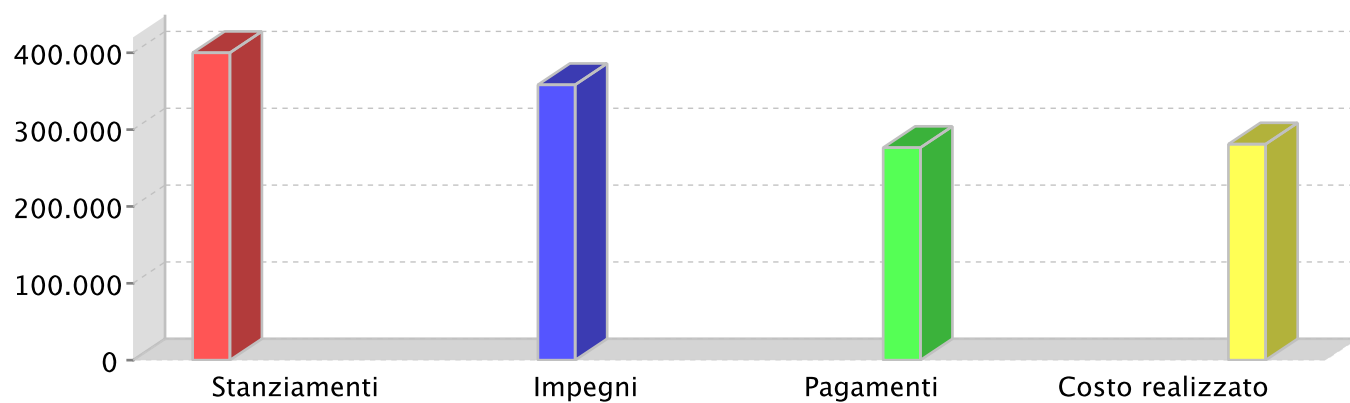

■ Stanziamenti=400.000,00 € ■ Impegni=358.303,46 €
■ Pagamenti=276.511,18 € ■ Costo realizzato=281.091,78 €

Avanzamento impegni: 89.58 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 70.28 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 69.13 % sullo stanziato

Report del progetto: DF11 - REALIZZAZIONE DI ARGINATURE LUNGO IL FIUME TIRSO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Oristano

Soggetto Attuatore

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese


Responsabile dell'intervento

Ing. Luigi Sanna

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

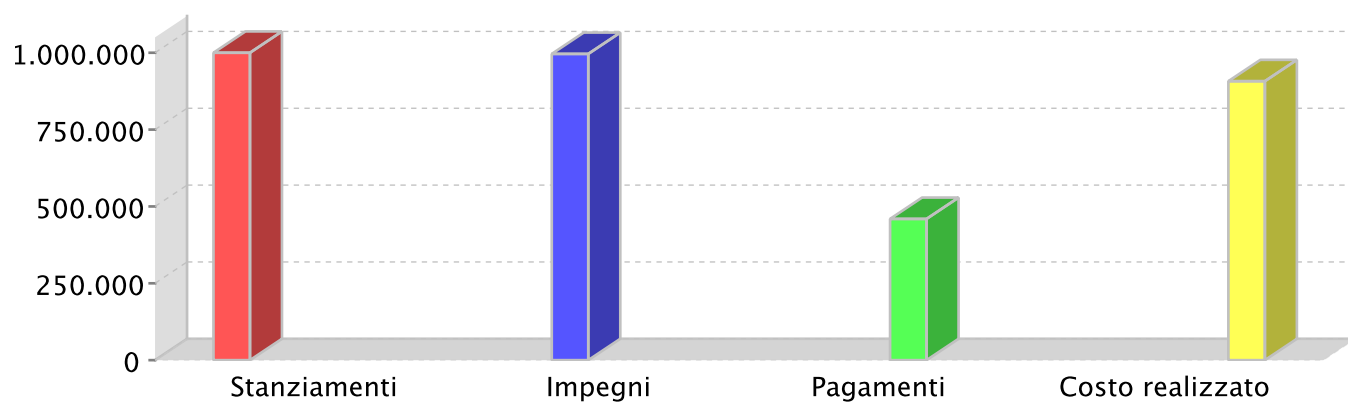

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=996.276,95 €
■ Pagamenti=459.484,60 € ■ Costo realizzato=907.539,82 €

Avanzamento impegni: 99.63 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 90.76 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 45.95 % sullo stanziato

Report del progetto: DF12 - CONSOLIDAZIONE MURO DI SOSTEGNO S.P. A RIDOSSO DELL'ABITATO DI NUGHEDDU S. VITTORIA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Nughedu Santa Vittor

Soggetto Attuatore

Comune di Nughedu Santa Vittoria (OR)


Responsabile dell'intervento

Geom. Pirri Paolo

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

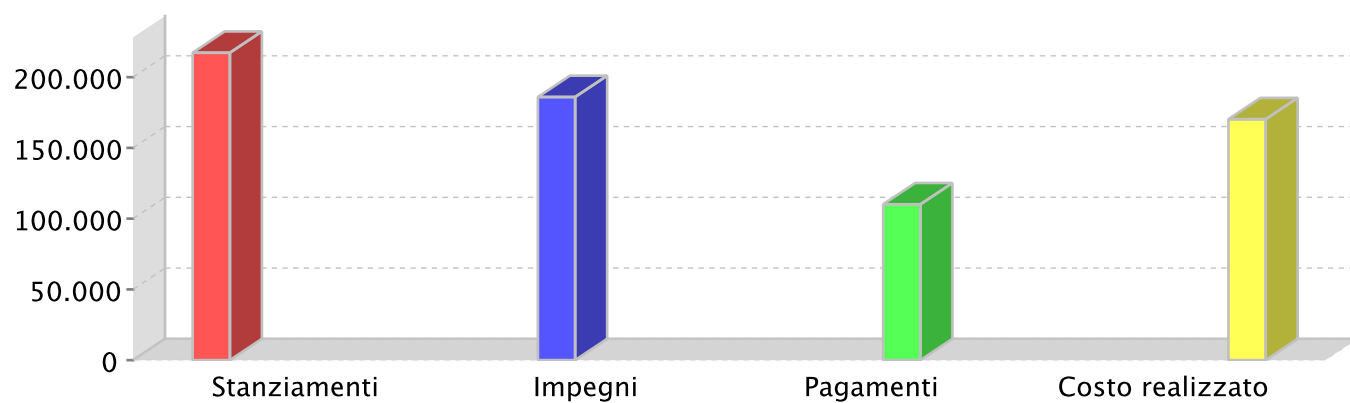

■ Stanziamenti=217.240,00 € ■ Impegni=185.967,80 €
■ Pagamenti=110.121,06 € ■ Costo realizzato=170.271,37 €

Avanzamento impegni: 85.61 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 78.38 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 50.70 % sullo stanziato

Report del progetto: DF13 - MANUTENZIONE ALVEO A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Milis

Soggetto Attuatore

Comune di Milis (OR)


Responsabile dell'intervento

Ing. Angelo Mameli

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

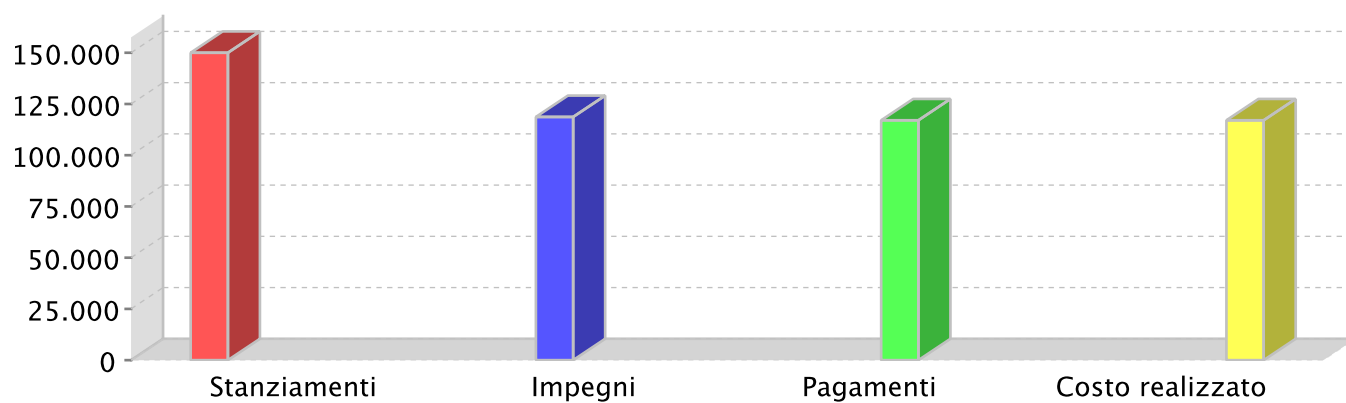

■ Stanziamenti=150.000,00 € ■ Impegni=118.681,89 €
■ Pagamenti=117.041,19 € ■ Costo realizzato=117.041,19 €

Avanzamento impegni: 79.13 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 78.03 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 78.03 % sullo stanziato

Report del progetto: DF03 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.MILANU A PROTEZIONE S.P.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Carbonia

Soggetto Attuatore

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis


Responsabile dell'intervento

Ing. Nazzareno Vacca

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

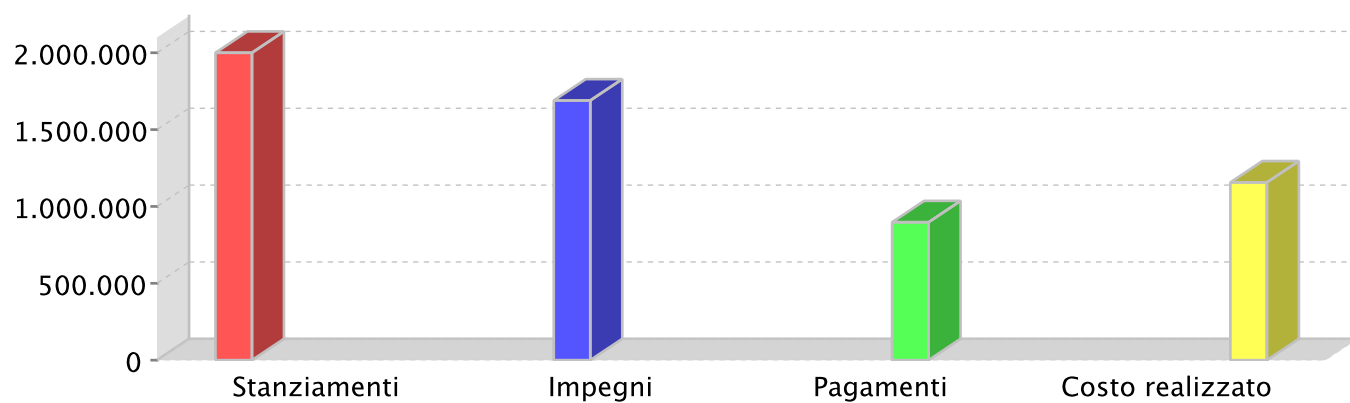

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=1.689.531,98 €
■ Pagamenti=897.469,47 € ■ Costo realizzato=1.156.589,47 €

Avanzamento impegni: 84.48 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 57.83 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 44.88 % sullo stanziato

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Fluminimaggiore

Soggetto Attuatore

Comune di Fluminimaggiore (CA)


Responsabile dell'intervento

Geom. Leonardo Pani

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

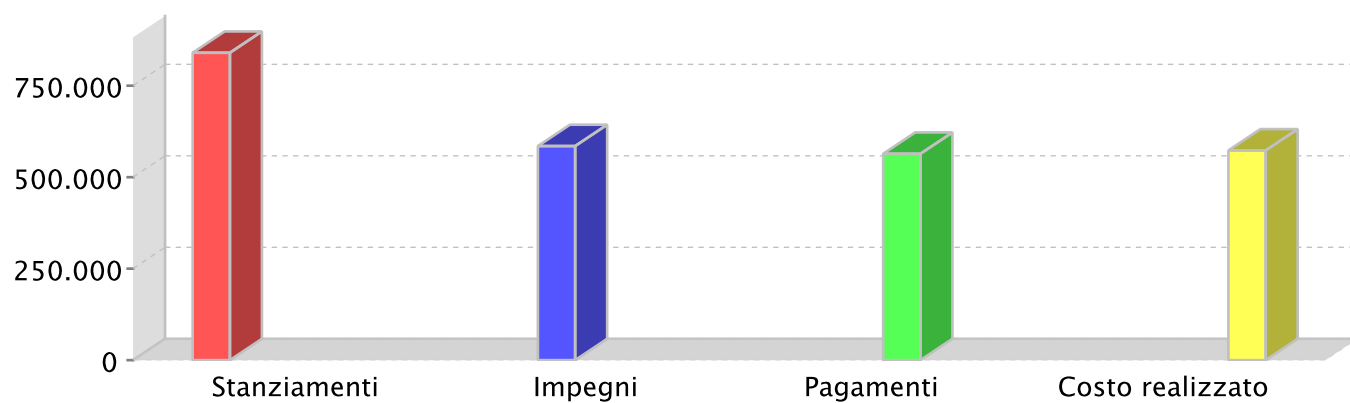

■ Stanziamenti=840.000,00 € ■ Impegni=585.011,99 €
■ Pagamenti=563.943,23 € ■ Costo realizzato=573.077,62 €

Avanzamento impegni: 69.65 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 68.23 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 67.14 % sullo stanziato

Report del progetto: DF02 - INTERVENTI RIDUZIONE PERICOLO MOVIMENTI FRANOSI S.P. VILLASALTO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Villasalto

Soggetto Attuatore

Provincia di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Ing. Paolo Mereu

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

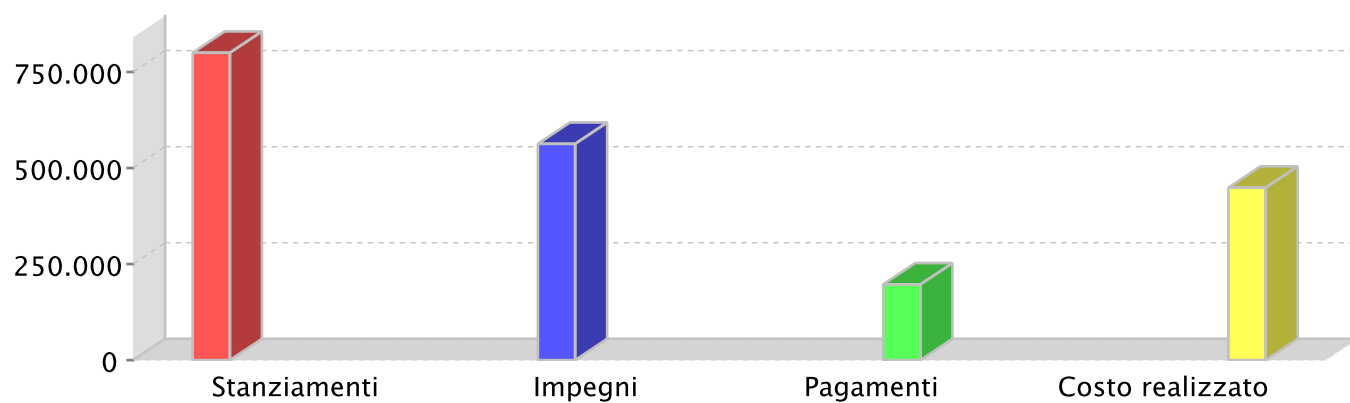

■ Stanziamenti=800.000,00 € ■ Impegni=562.994,76 €
■ Pagamenti=197.145,56 € ■ Costo realizzato=448.860,62 €

Avanzamento impegni: 70.38 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 56.11 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 24.65 % sullo stanziato

Report del progetto: DF04 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GUTTURU- FLUMINI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Carbonia-Iglesias	Gonnesa

Soggetto Attuatore

Comune di Gonnesa (CA)

Responsabile dell'intervento


Geom. Angelo Floris

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

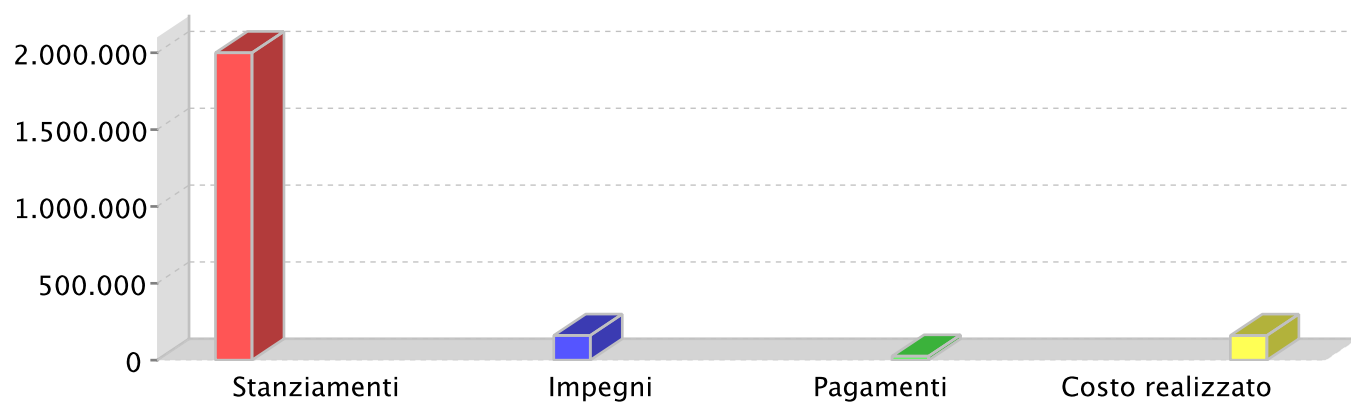

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=160.926,50 €
■ Pagamenti=26.022,48 € ■ Costo realizzato=160.488,46 €

Avanzamento impegni: 8.05 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 8.03 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 1.31 % sullo stanziato

Report del progetto: DF05 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO LANESSI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Medio Campidano	Segariu

Soggetto Attuatore

Comune di Segariu (CA)


Responsabile dell'intervento

Geom. Melis Vincenzo

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

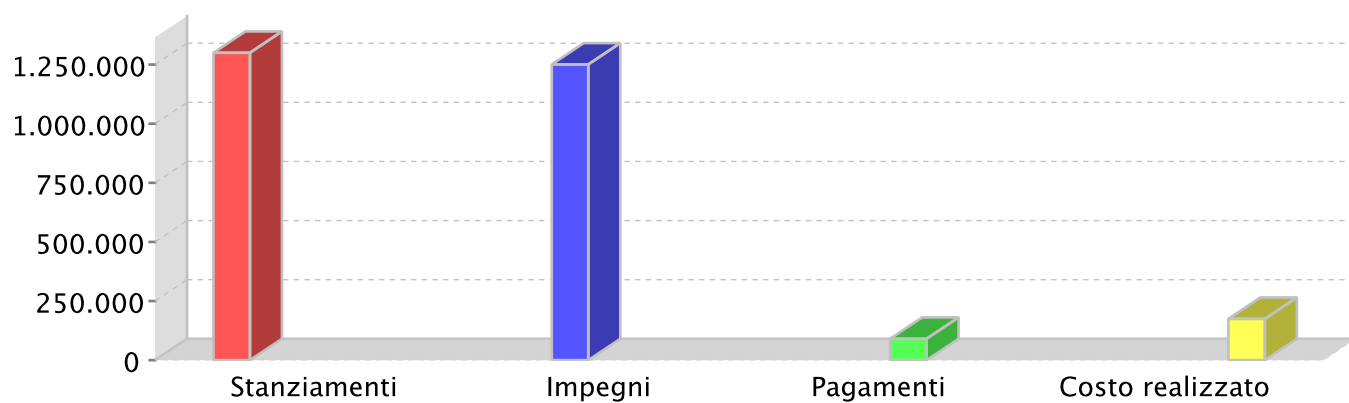

■ Stanziamenti=1.300.000,00 € ■ Impegni=1.250.741,68 €
■ Pagamenti=90.485,75 € ■ Costo realizzato=174.754,60 €

Avanzamento impegni: 96.22 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 13.45 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 6.97 % sullo stanziato

Report del progetto: DF06 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MANNU

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Pula

Soggetto Attuatore

Comune di Pula (CA)


Responsabile dell'intervento

Geom. Enrico Murru

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

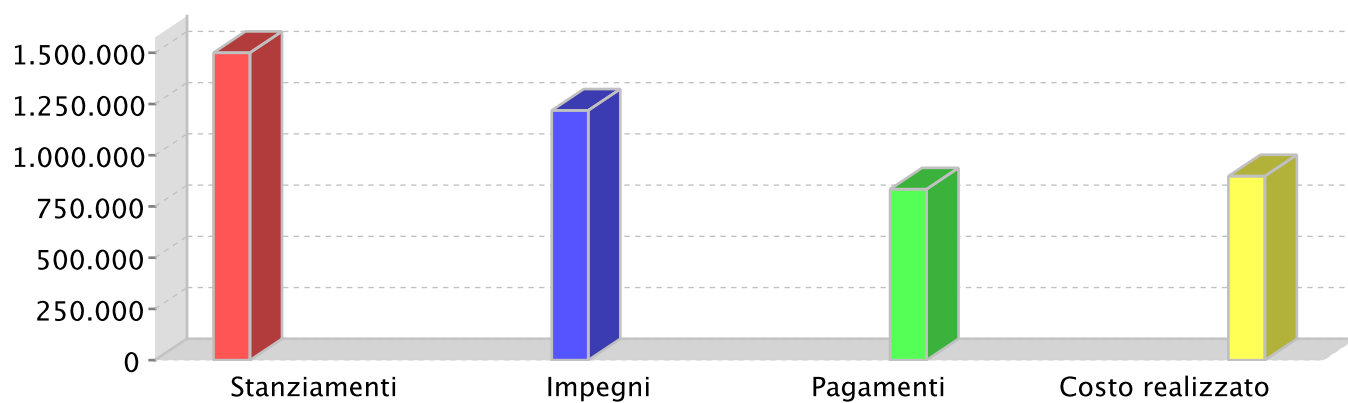

■ Stanziamenti=1.500.000,00 € ■ Impegni=1.218.925,17 €
■ Pagamenti=834.237,36 € ■ Costo realizzato=897.947,66 €

Avanzamento impegni: 81.27 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 59.87 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 55.62 % sullo stanziato

Report del progetto: DF07 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIFACIMENTO PONTE SS 195

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Capoterra

Soggetto Attuatore

Comune di Capoterra (CA)

Responsabile dell'intervento


Ing. Italo Deiana

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

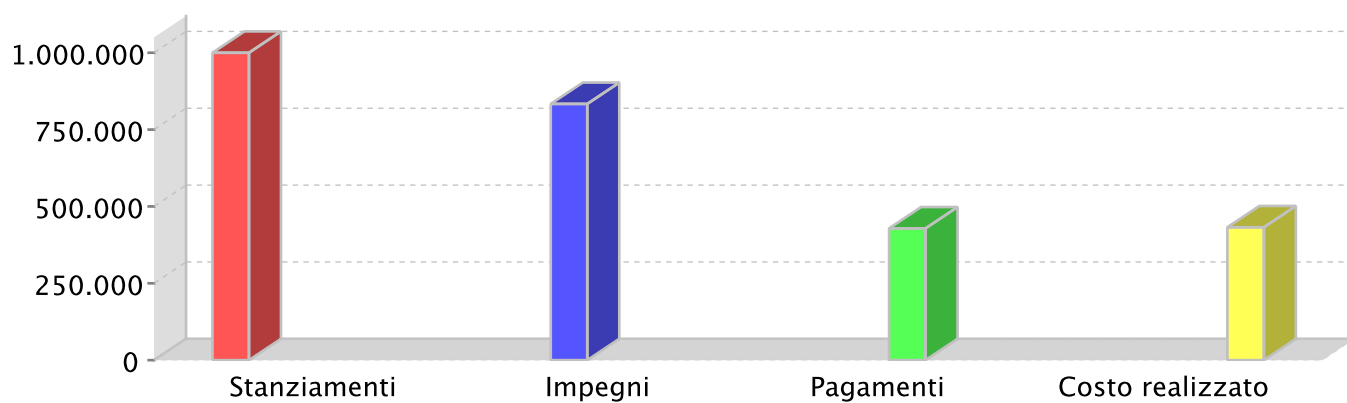

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=833.698,84 €
■ Pagamenti=428.715,00 € ■ Costo realizzato=432.268,95 €

Avanzamento impegni: 83.37 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 43.23 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 42.88 % sullo stanziato

Report del progetto: DF08 - OPERE DI PROTEZIONE PER FRANA LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Ghilarza

Soggetto Attuatore

Provincia di Oristano


Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Piras

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

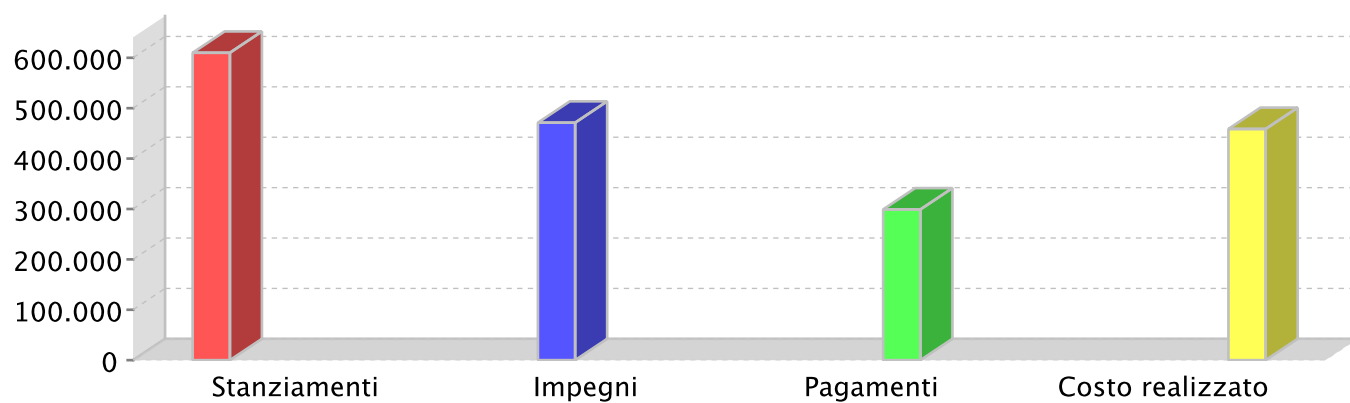

■ Stanziamenti=610.000,00 € ■ Impegni=471.291,57 €
■ Pagamenti=299.098,94 € ■ Costo realizzato=458.790,14 €

Avanzamento impegni: 77.27 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 75.22 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 49.04 % sullo stanziato

Report del progetto: DF09 - OPERE PER LA RIDUZIONE DEL PERICOLO FRANE SS 292

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) ORISTANO

Comune
Tresnuraghes

Soggetto Attuatore

Comune di Tresnuraghes (OR)

Responsabile dell'intervento


Geom. Demetrio Cherchi

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

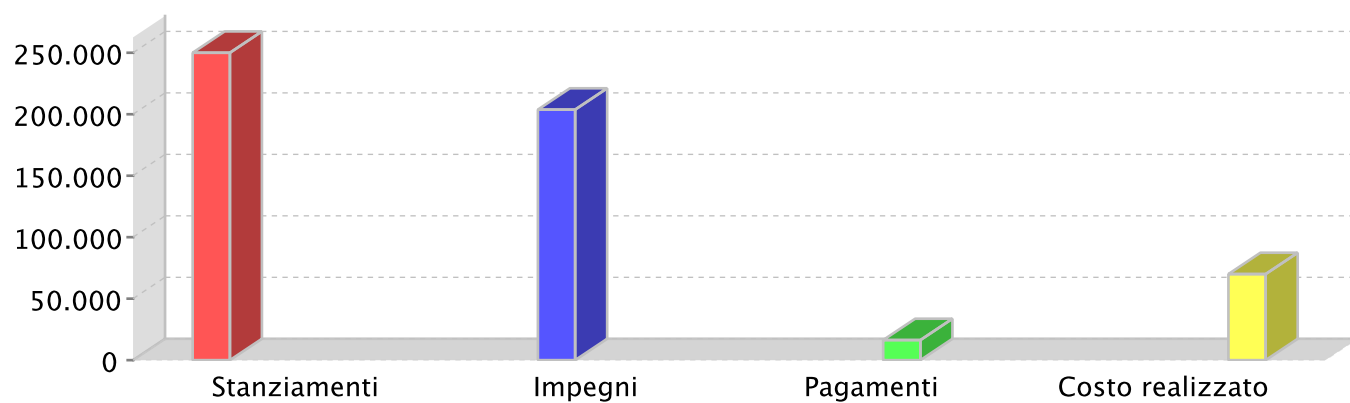

■ Stanziamenti=250.000,00 € ■ Impegni=203.741,74 €
■ Pagamenti=16.340,68 € ■ Costo realizzato=70.000,00 €

Avanzamento impegni: 81.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 28.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 6.54 % sullo stanziato

Report del progetto: DF14 - CONSOLIDAMENTO AREE SOGGETTE A FRANA LUNGO LA S.P. ASUNI-NURECI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Asuni
2) ORISTANO	Nureci

Soggetto Attuatore

Provincia di Oristano


Responsabile dell'intervento

Ing. Giorgio Piras

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

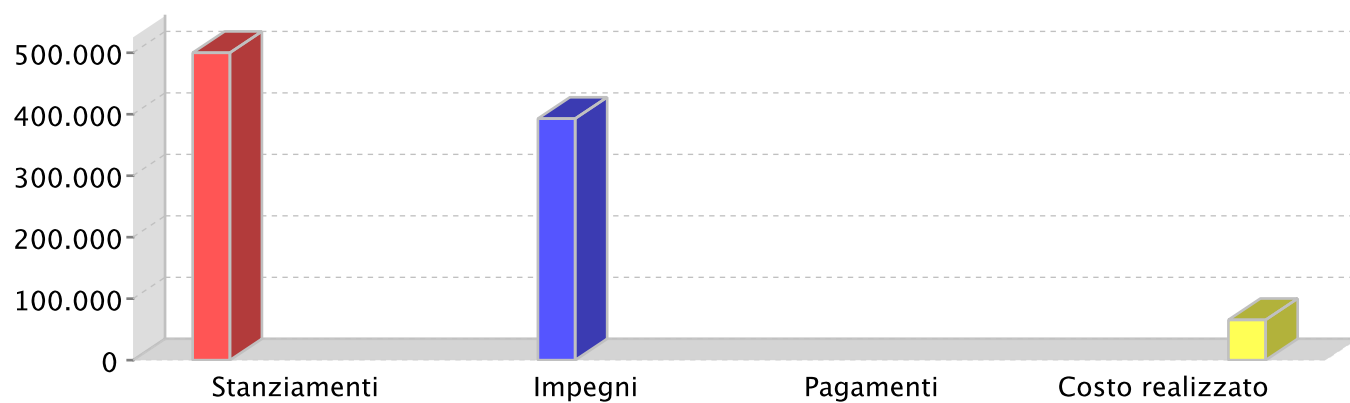

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=392.867,38 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=65.571,24 €

Avanzamento impegni: 78.58 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 13.12 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF15 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. ESCALAPLANO ORROLI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Escalaplano
2) CAGLIARI	Orroli

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro


Responsabile dell'intervento

Geom. Roberto Bandinu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

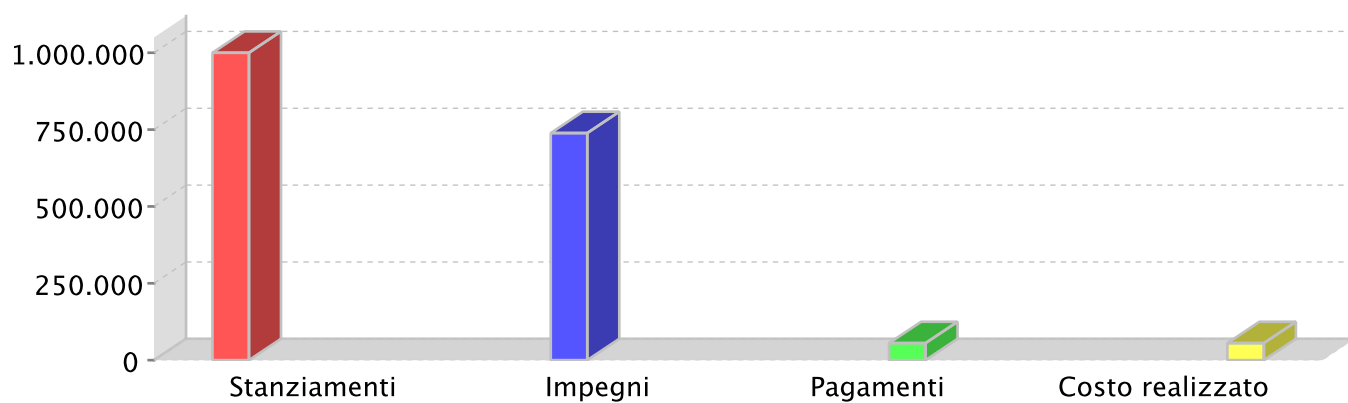

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=738.822,07 €
■ Pagamenti=55.433,55 € ■ Costo realizzato=55.433,55 €

Avanzamento impegni: 73.89 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 5.55 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 5.55 % sullo stanziato

Report del progetto: DF16 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI S.P. ESCALAPLANO PERDASDEFOGU

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Escalaplano
2) Ogliastra	Perdasdefogu

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro


Responsabile dell'intervento

Geom. Roberto Bandinu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

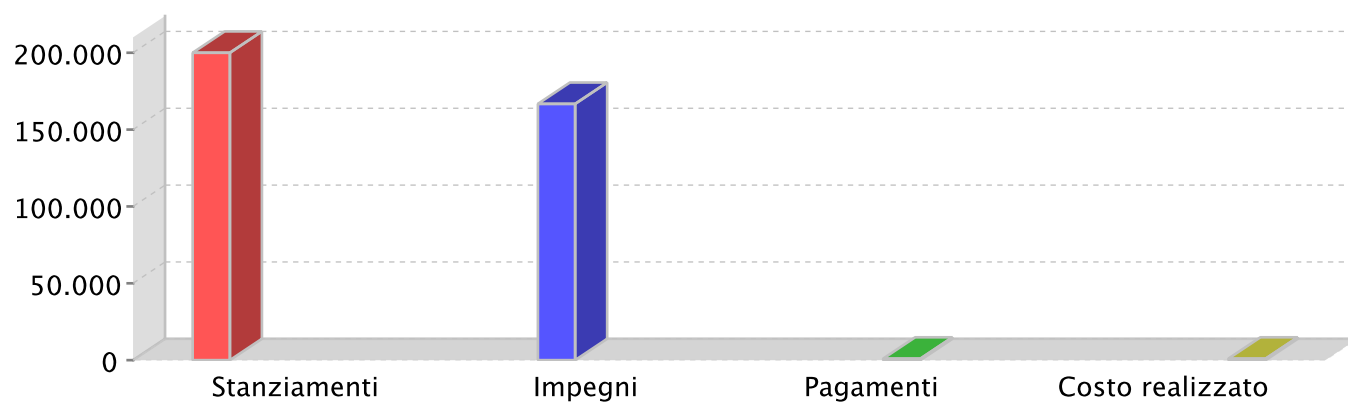

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=166.750,00 € ■ Pagamenti=988,00 €
■ Costo realizzato=988,00 €

Avanzamento impegni: 83.38 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.50 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.50 % sullo stanziato

Report del progetto: DF17 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. TALANA-VILLAGRANDE

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Talana
2) Ogliastra	Villagrande Strisail

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Responsabile dell'intervento


Ing. Gianfranco Frau

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

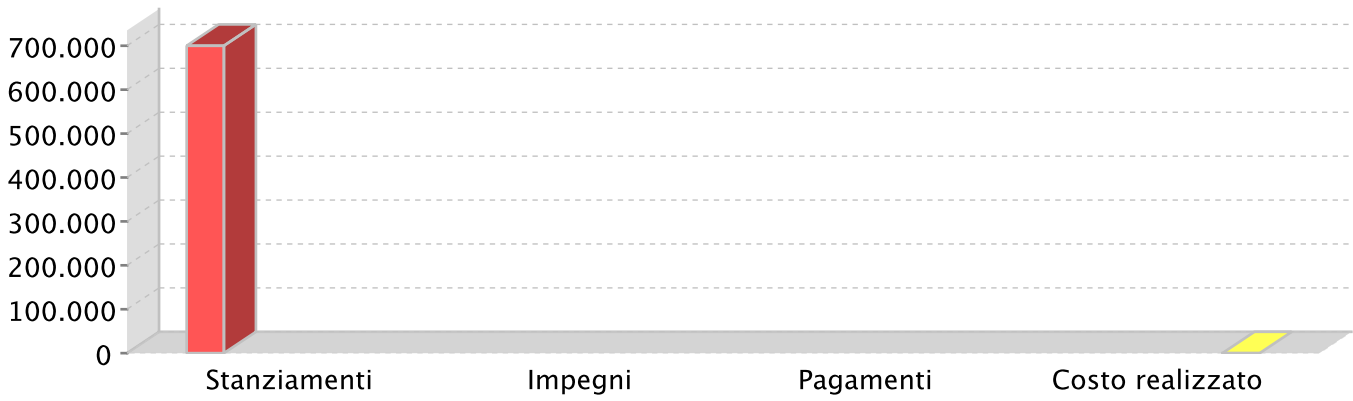

■ Stanziamenti=700.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF18 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO SS 129 IN PROSSIMITA' DI BOSA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Bosa

Soggetto Attuatore

Comune di Bosa (NU)

Responsabile dell'intervento


Geom. Luciano Baldino

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

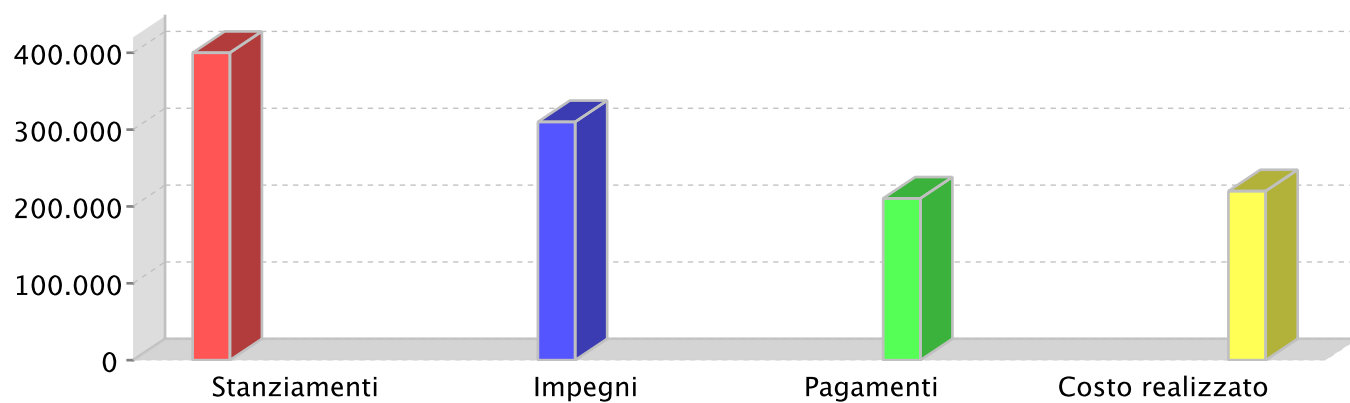

■ Stanziamenti=400.000,00 € ■ Impegni=310.034,63 €
■ Pagamenti=210.523,30 € ■ Costo realizzato=220.000,00 €

Avanzamento impegni: 77.51 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 55.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 52.64 % sullo stanziato

Report del progetto: DF19 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO LA STRADA FERRATA FF.CC. IN PROSSIMITA' BOSA MARINA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) ORISTANO	Bosa

Soggetto Attuatore

Comune di Bosa (NU)


Responsabile dell'intervento

Geom. Luciano Baldino

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

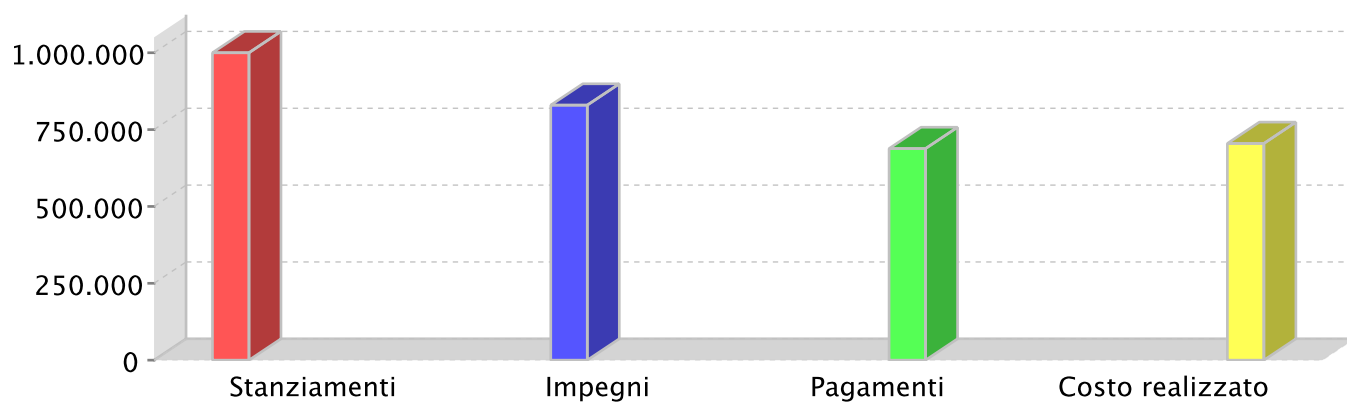

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=829.567,19 €
■ Pagamenti=688.305,90 € ■ Costo realizzato=704.864,13 €

Avanzamento impegni: 82.96 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 70.49 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 68.84 % sullo stanziato

Report del progetto: DF20 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. NUORO-OLIANA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro


Responsabile dell'intervento

Geom. Roberto Bandinu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

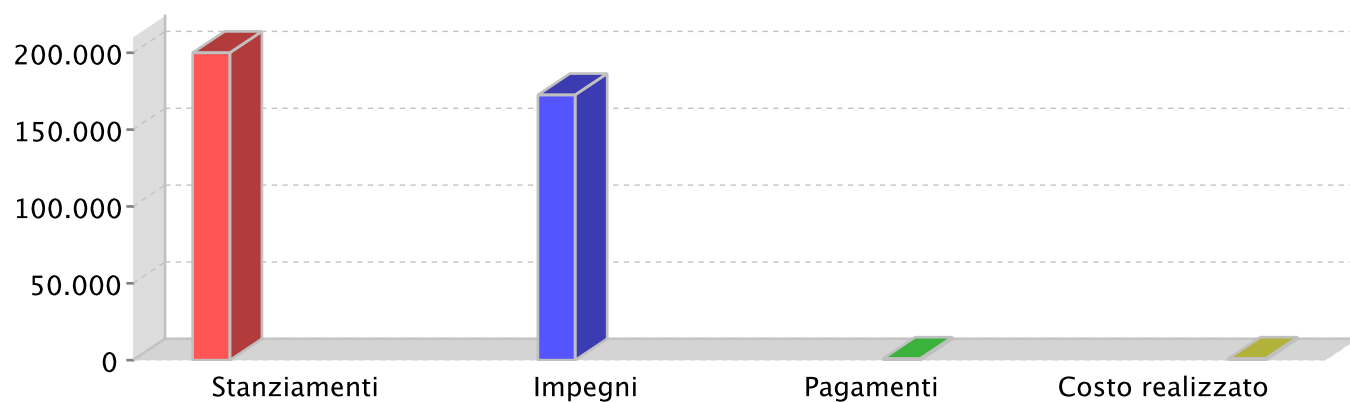

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=172.556,17 € ■ Pagamenti=1.054,71 €
■ Costo realizzato=1.054,71 €

Avanzamento impegni: 86.28 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.53 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.53 % sullo stanziato

Report del progetto: DF21 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. E S.C. NUORO-ORTOBENE

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Sergio Pisano

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

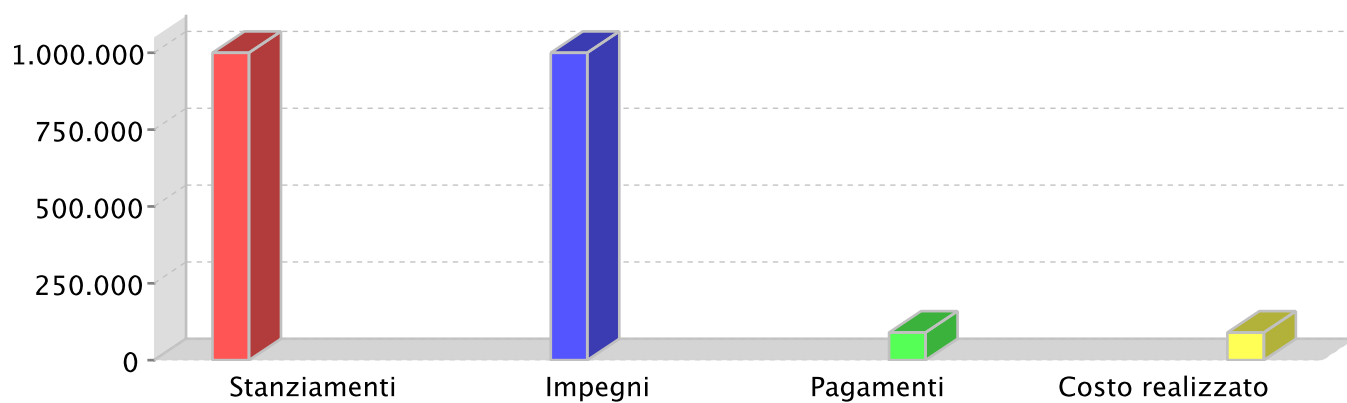

■ Stanziamenti=1.000.000,00 € ■ Impegni=1.000.000,00 €

■ Pagamenti=89.971,47 € ■ Costo realizzato=89.971,47 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 9.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 9.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF22 - COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO S.S. 125 LOCALITA' MONTE TULUI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Dorgali

Soggetto Attuatore

COMUNE DI DORGALI (NU)


Responsabile dell'intervento

Geom. Salvatore Marci

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

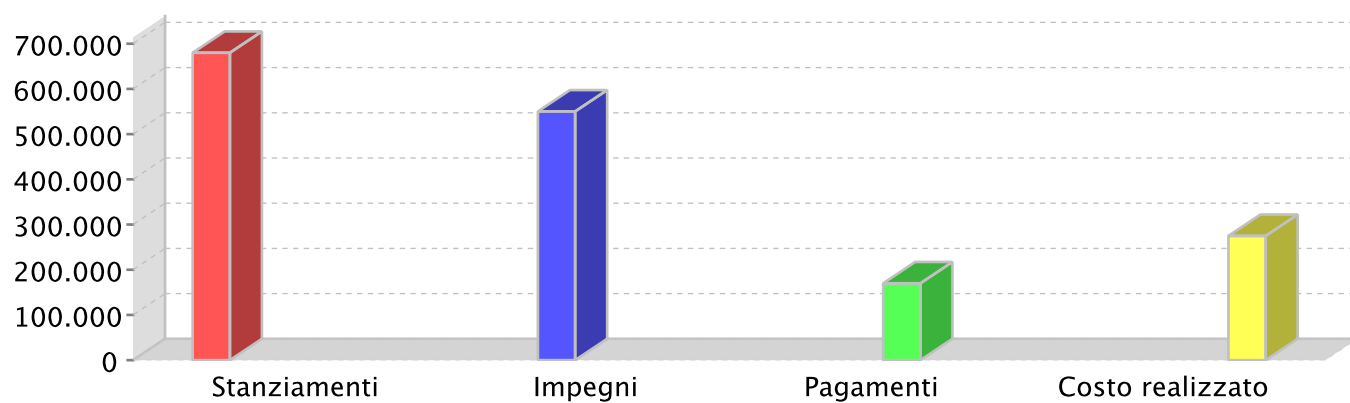

■ Stanziamenti=680.000,00 € ■ Impegni=550.276,03 €
■ Pagamenti=170.000,00 € ■ Costo realizzato=274.844,62 €

Avanzamento impegni: 80.93 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.42 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 25.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF23 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI S.P. NUORO-ORGOSOLO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia
1) NUORO

Comune
Orgosolo

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Responsabile dell'intervento


Ing. Gianuario Canu

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

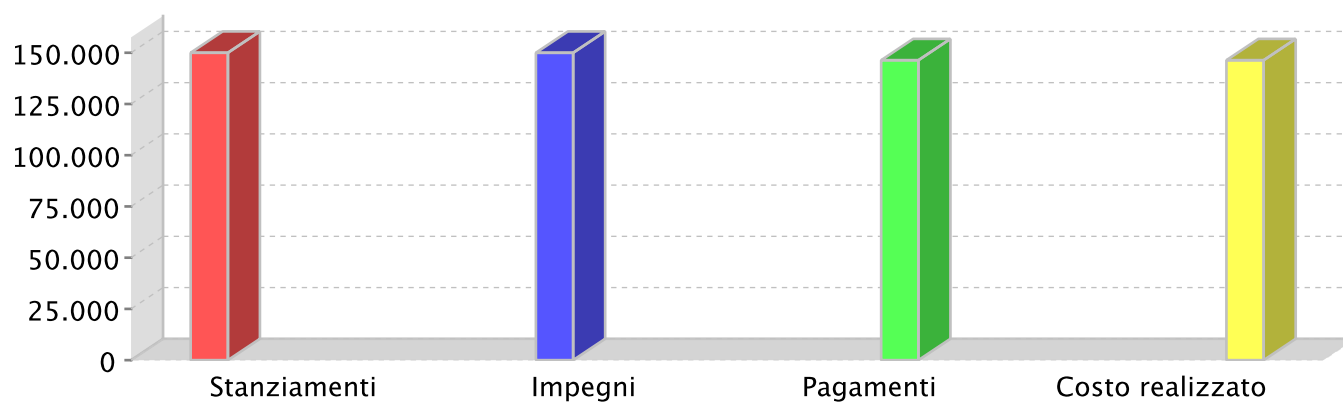

■ Stanziamenti=150.000,00 € ■ Impegni=149.985,57 €
■ Pagamenti=146.354,19 € ■ Costo realizzato=146.354,19 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 97.57 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 97.57 % sullo stanziato

Report del progetto: DF24 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO LA STRADA SOLOGO-LULA-BITTI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Lula

Soggetto Attuatore

Comunita montana n. 10 delle Baronie

Responsabile dell'intervento


Geom. Antonio Ortu

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

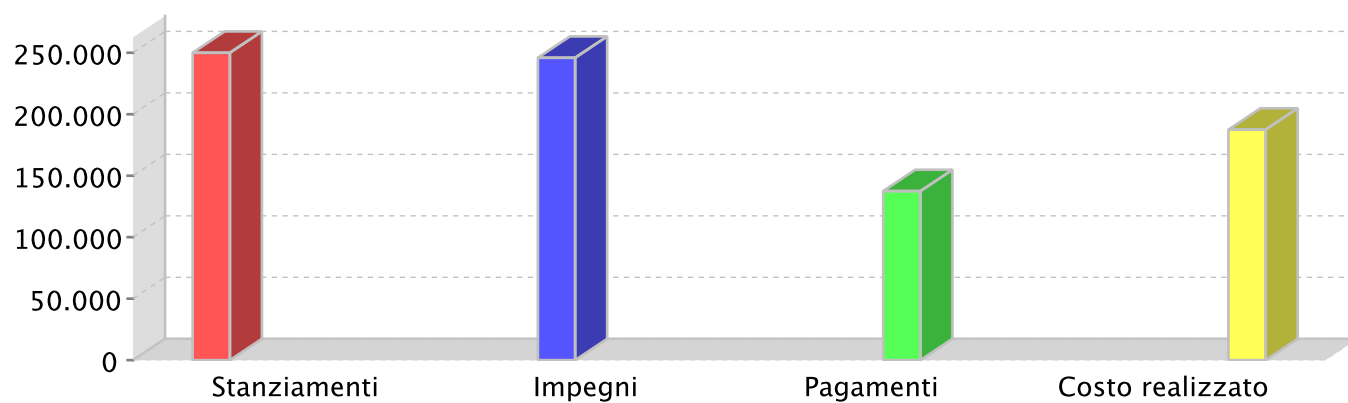

■ Stanziamenti=250.000,00 € ■ Impegni=245.939,71 €
■ Pagamenti=137.500,00 € ■ Costo realizzato=187.500,00 €

Avanzamento impegni: 98.38 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 75.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 55.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF25 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.P. LULA-S.ANNA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Lode'
2) NUORO	Lula

Soggetto Attuatore

Comunita montana n. 10 delle Baronie


Responsabile dell'intervento

Geom. Antonio Ortu

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

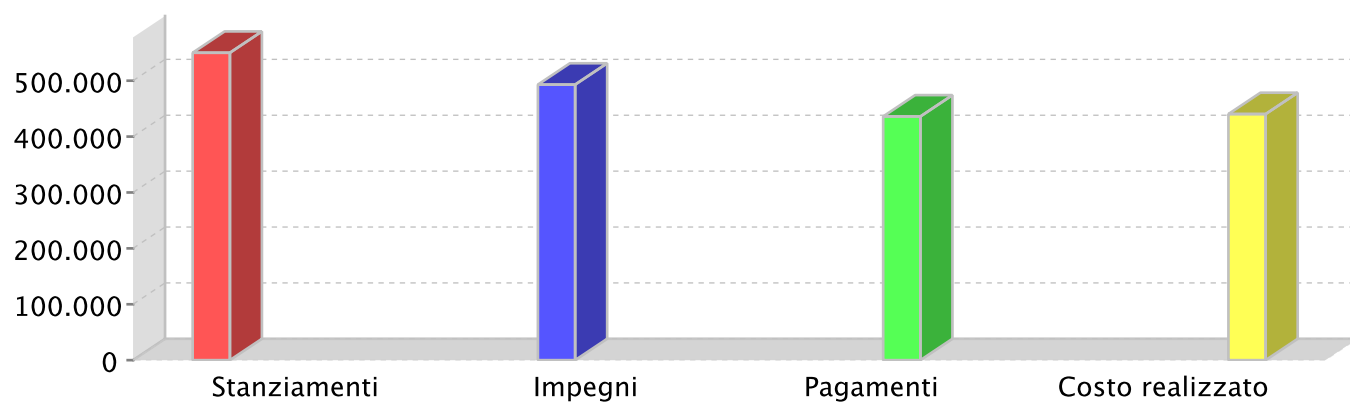

■ Stanziamenti=550.000,00 € ■ Impegni=493.000,17 €
■ Pagamenti=436.039,19 € ■ Costo realizzato=440.319,19 €

Avanzamento impegni: 89.64 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 80.06 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 79.28 % sullo stanziato

Report del progetto: DF26 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA LUNGO IL TRACCIATO S.S. 125 E STRADE COMUNALI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Orosei

Soggetto Attuatore

Comunita montana n. 10 delle Baronie


Responsabile dell'intervento

Geom. Antonio Ortu

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

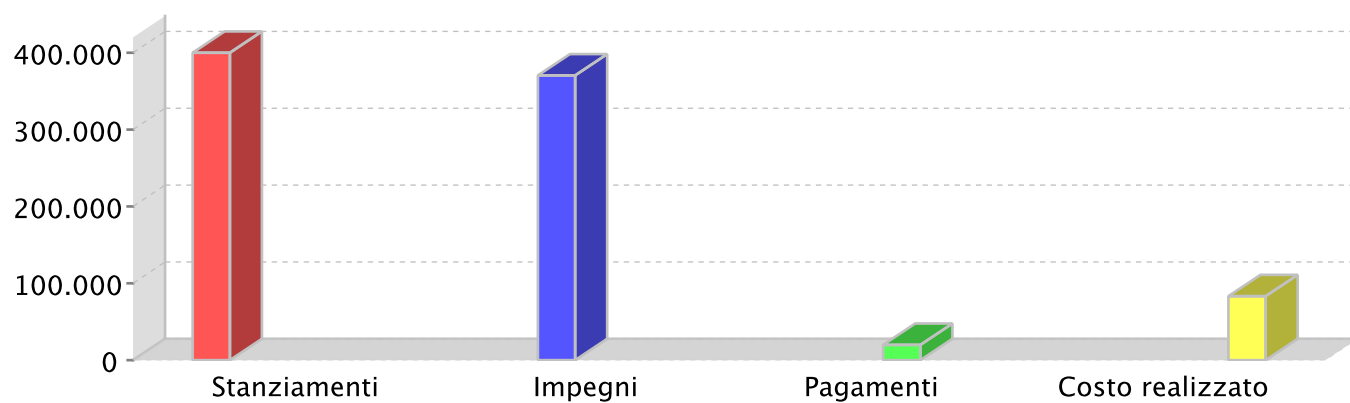

■ Stanziamenti=400.000,00 € ■ Impegni=370.518,38 €
■ Pagamenti=19.874,81 € ■ Costo realizzato=83.231,69 €

Avanzamento impegni: 92.63 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 20.81 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.97 % sullo stanziato

Report del progetto: DF27 - CONSOLIDAMENTO AREA INSTABILE ADIACENTE LA S.C. PER PUNTA PEDRA LONGA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Baunei

Soggetto Attuatore

Comune di Baunei (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Fabio Corda

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

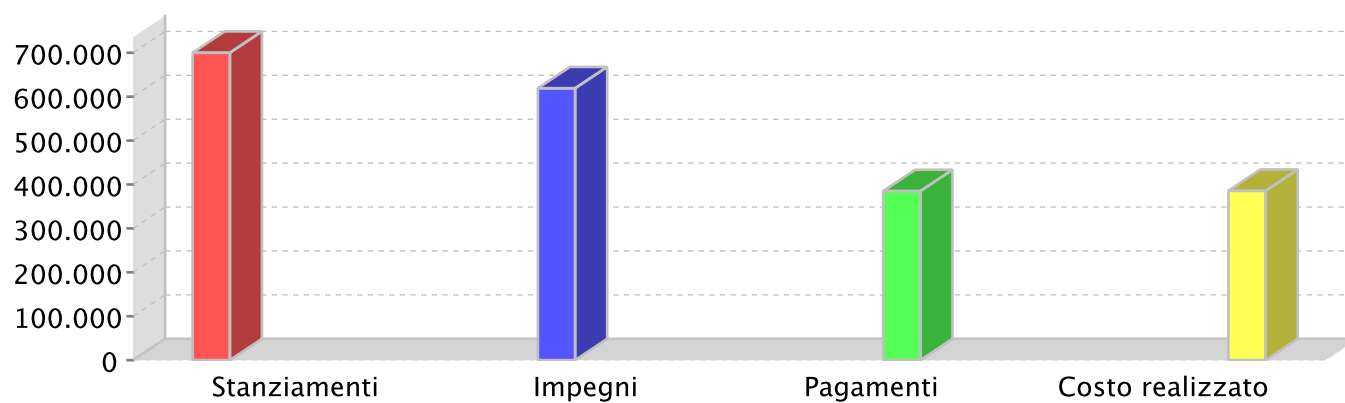

■ Stanziamenti=700.000,00 € ■ Impegni=619.169,20 €
■ Pagamenti=385.000,00 € ■ Costo realizzato=385.659,34 €

Avanzamento impegni: 88.46 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 55.10 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 55.00 % sullo stanziato

Report del progetto: DF28 - VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.S. 125

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastro	Bari Sardo

Soggetto Attuatore

Comune di Bari Sardo (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Antonio Piras

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

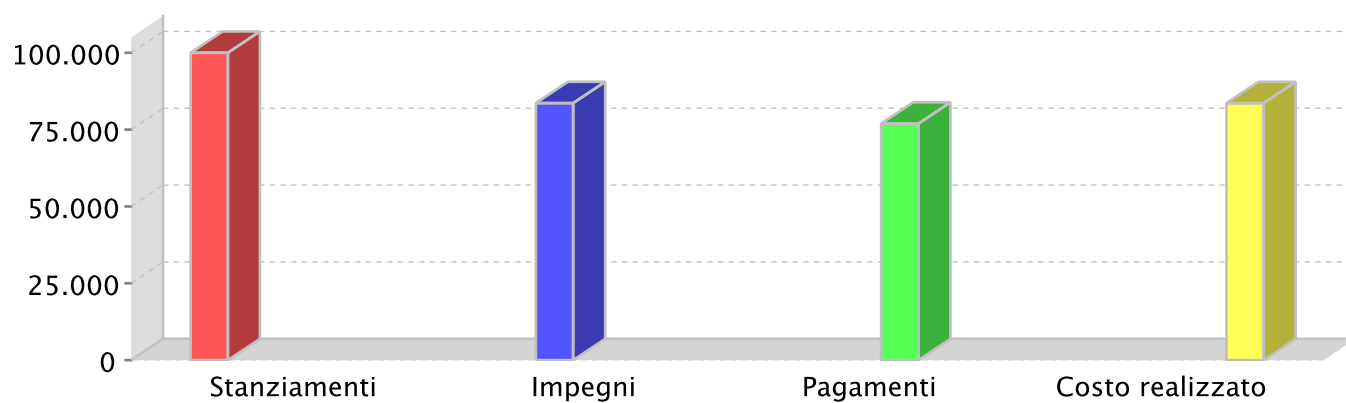

■ Stanziamenti=100.000,00 € ■ Impegni=83.617,85 € ■ Pagamenti=76.933,66 €
■ Costo realizzato=83.617,85 €

Avanzamento impegni: 83.62 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 83.62 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 76.94 % sullo stanziato

Report del progetto: DF29 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.S. 198 PRESSI KM 79

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Gairo

Soggetto Attuatore

Comune di Gairo (NU)


Responsabile dell'intervento

Ing. Daniela Cuboni

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

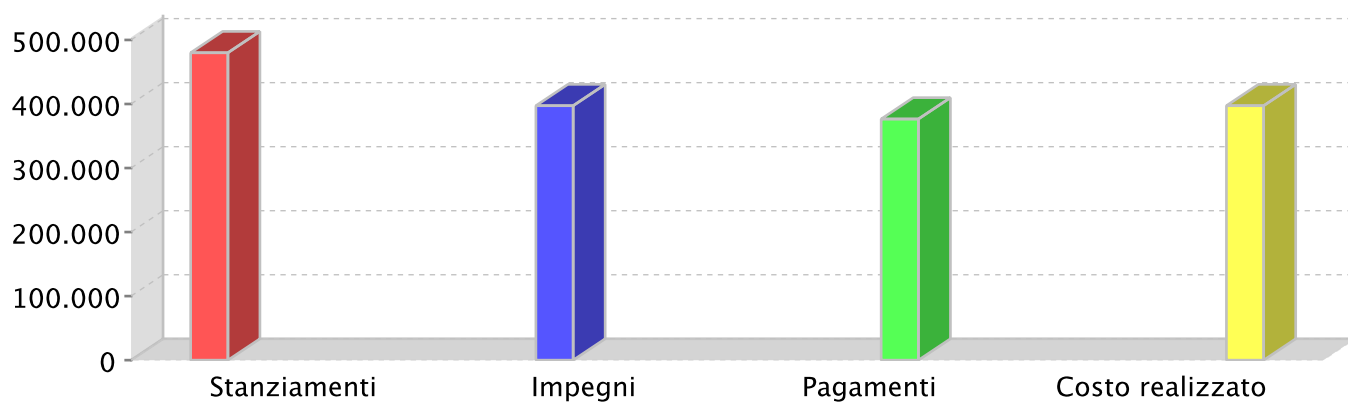

■ Stanziamenti=480.000,00 € ■ Impegni=397.311,21 €
■ Pagamenti=376.522,65 € ■ Costo realizzato=397.311,21 €

Avanzamento impegni: 82.78 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 82.78 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 78.45 % sullo stanziato

Report del progetto: DF30 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SP TALANA URZULEI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Talana
2) Ogliastra	Urzulei

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro


Responsabile dell'intervento

Ing. Gianuario Canu

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

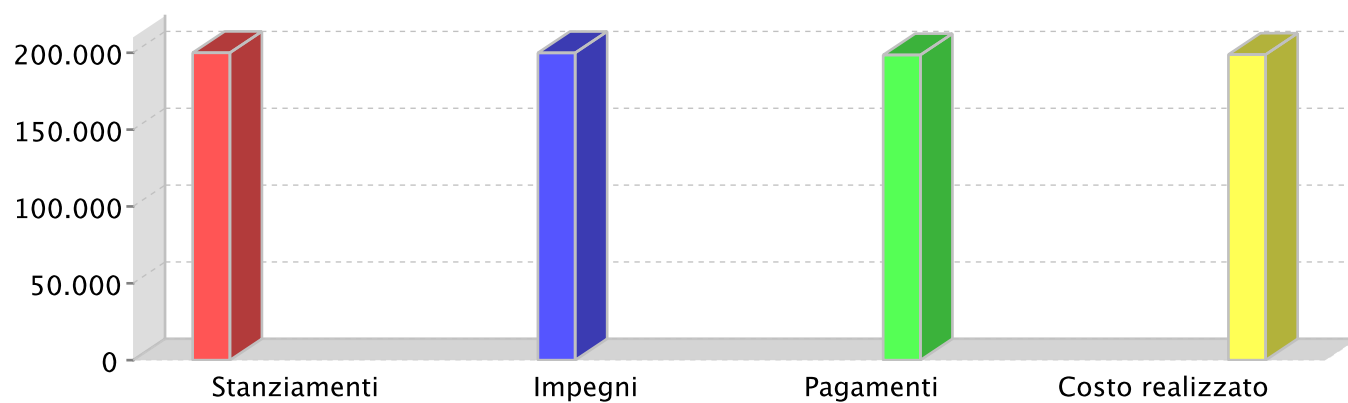

■ Stanziamenti=200.000,00 € ■ Impegni=199.938,53 €
■ Pagamenti=198.571,38 € ■ Costo realizzato=198.838,93 €

Avanzamento impegni: 99.97 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 99.42 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 99.29 % sullo stanziato

Report del progetto: DF31 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI SP BOSA ALGHERO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Villanova Monteleone

Soggetto Attuatore

Provincia di Sassari


Responsabile dell'intervento

Ing. Marco Dario Cherchi

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

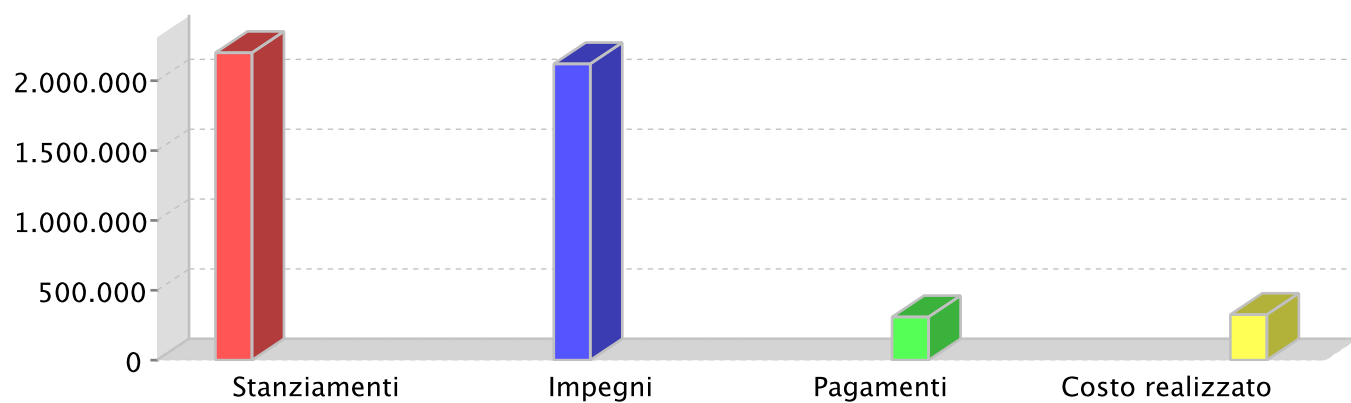

■ Stanziamenti=2.200.000,00 € ■ Impegni=2.120.384,70 €
■ Pagamenti=309.314,70 € ■ Costo realizzato=325.982,70 €

Avanzamento impegni: 96.39 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 14.82 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 14.06 % sullo stanziato

Report del progetto: DF33 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SS 131 TRATTO CAMPEDA BIVIO BONORVA

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Bonorva

Soggetto Attuatore

Comune di Bonorva (SS)

Responsabile dell'intervento


Geom. Luca Cherchi

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

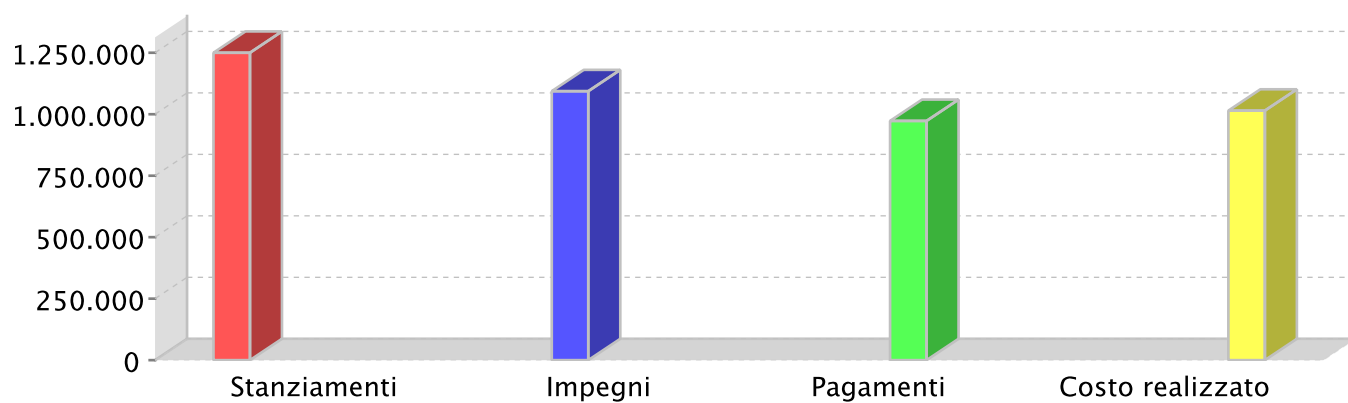

■ Stanziamenti=1.250.000,00 € ■ Impegni=1.093.705,50 €
■ Pagamenti=972.918,66 € ■ Costo realizzato=1.014.668,54 €

Avanzamento impegni: 87.50 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 81.18 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 77.84 % sullo stanziato

Report del progetto: DF34 - PROTEZIONE CADUTA MASSI SS 131 PRESSO COMUNE DI BONNANARO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Bonnanaro

Soggetto Attuatore

Comune di Bonnanaro (SS)


Responsabile dell'intervento

Geom. Gianantonello Sanna

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

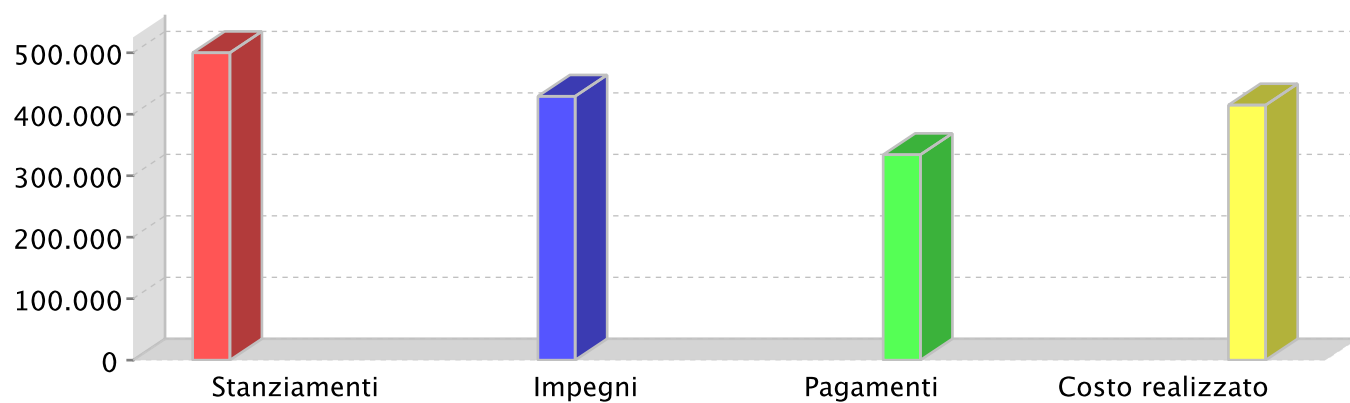

■ Stanziamenti=500.000,00 € ■ Impegni=429.191,47 €
■ Pagamenti=334.177,77 € ■ Costo realizzato=414.935,00 €

Avanzamento impegni: 85.84 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 82.99 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 66.84 % sullo stanziato

Report del progetto: DF35 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SS 131 VALLATA DEL MASCARI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari (SS)


Responsabile dell'intervento

Ing. Claudio Castagna

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

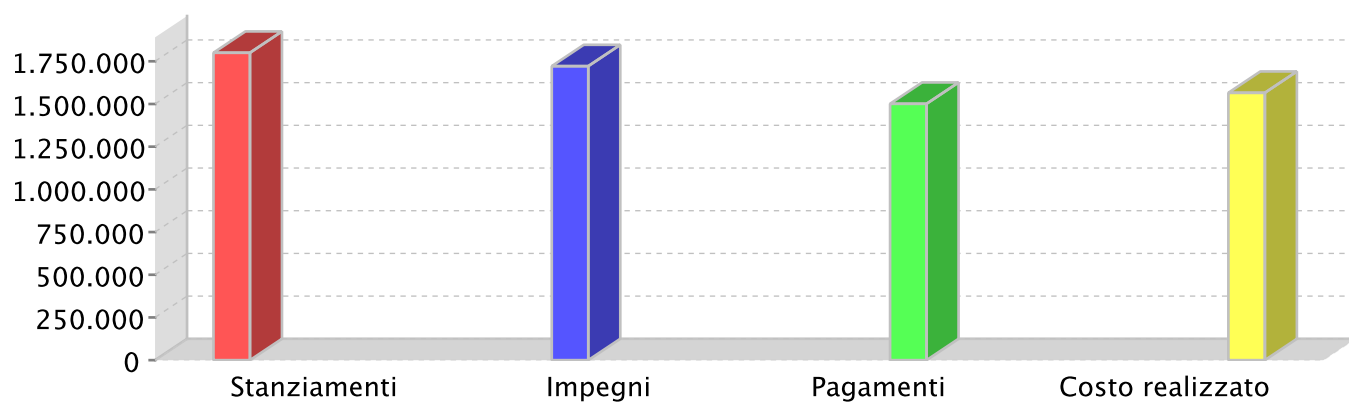

■ Stanziamenti=1.800.000,00 € ■ Impegni=1.721.557,29 €
■ Pagamenti=1.501.183,75 € ■ Costo realizzato=1.565.557,29 €

Avanzamento impegni: 95.65 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 86.98 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 83.40 % sullo stanziato

Report del progetto: DF37 - CONSOLIDAMENTE AREE FRANOSE COMUNE DI BANARI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Banari

Soggetto Attuatore

Comune di Banari (SS)


Responsabile dell'intervento

Geom. Chessa Giuseppe

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

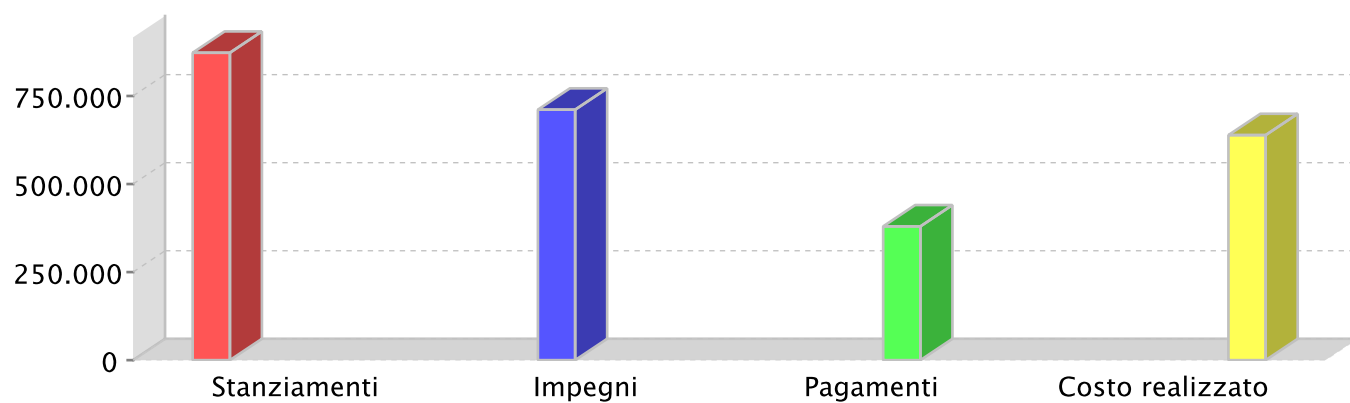

■ Stanziamenti=872.760,00 € ■ Impegni=711.139,29 €
■ Pagamenti=379.818,02 € ■ Costo realizzato=638.953,05 €

Avanzamento impegni: 81.49 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 73.22 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 43.52 % sullo stanziato

Report del progetto: DF38 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SS 134 - COMUNE DI CASTELSARDO

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Castelsardo

Soggetto Attuatore

Comune di Castelsardo (SS)


Responsabile dell'intervento

Dott. Angelo Francesco Cuccureddu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

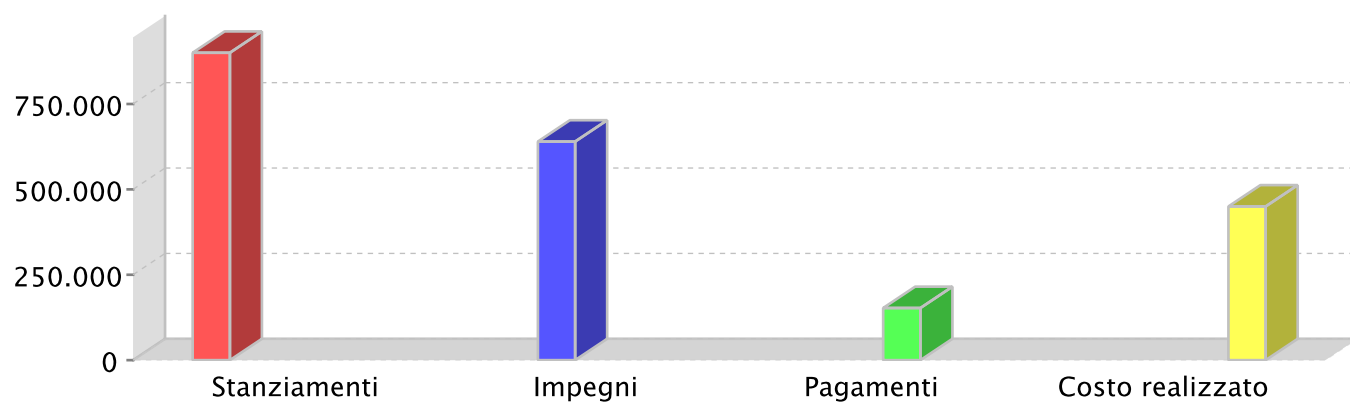

■ Stanziamenti=900.000,00 € ■ Impegni=640.024,69 €
■ Pagamenti=152.676,01 € ■ Costo realizzato=450.000,00 €

Avanzamento impegni: 71.12 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 50.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 16.97 % sullo stanziato

Report del progetto: DF39 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SS 134 COMUNE DI SEDINI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sedini

Soggetto Attuatore

Comune di Sedini (SS)


Responsabile dell'intervento

Geom. Giuseppe Floris

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

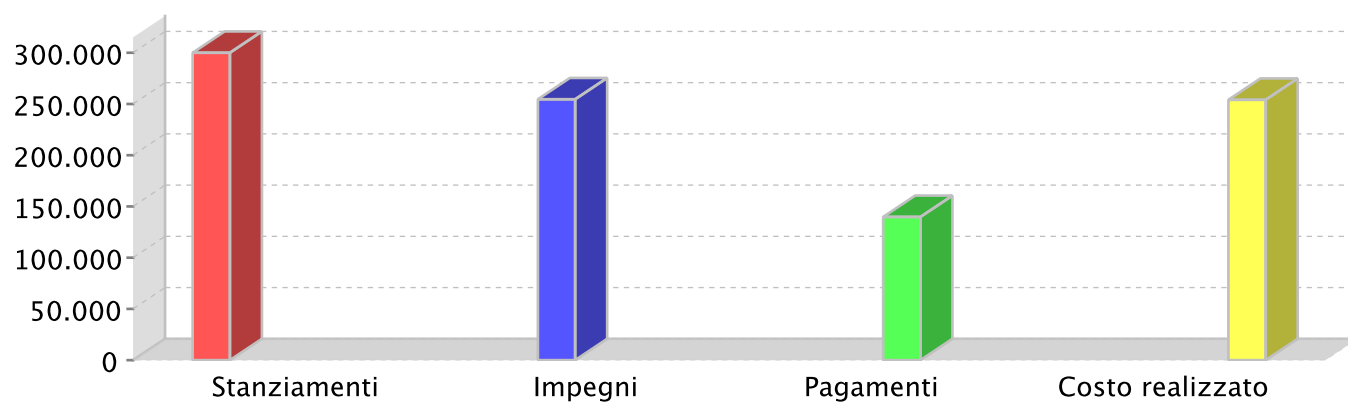

■ Stanziamenti=300.000,00 € ■ Impegni=254.599,20 €
■ Pagamenti=139.806,17 € ■ Costo realizzato=254.099,80 €

Avanzamento impegni: 84.87 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 84.70 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 46.61 % sullo stanziato

Report del progetto: DF41 - SISTEMAZIONE RIO MANNU PRESSI SP 18 E ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Sassari

Soggetto Attuatore

Comune di Sassari (SS)


Responsabile dell'intervento

Ing. Claudio Castagna

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

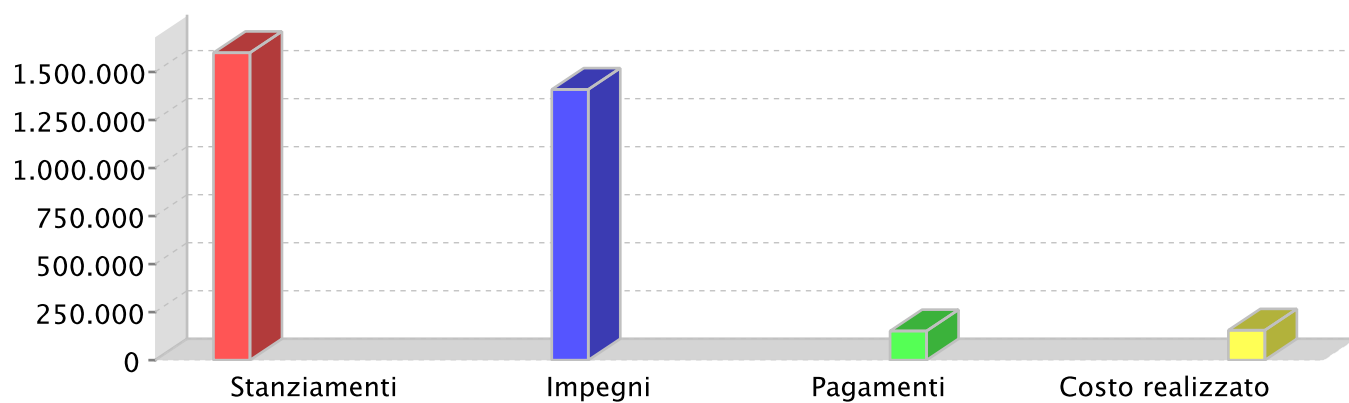

■ Stanziamenti=1.600.000,00 € ■ Impegni=1.409.024,69 €
■ Pagamenti=151.732,90 € ■ Costo realizzato=155.777,67 €

Avanzamento impegni: 88.07 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 9.74 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 9.49 % sullo stanziato

Report del progetto: DF42 - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO DELL'ASTA VALLIVA DEL

Programma/Fonte

Intesa - APQ Difesa del Suolo

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Muravera
2) CAGLIARI	San Vito
3) CAGLIARI	Villaputzu

Soggetto Attuatore

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA


Responsabile dell'intervento

ING. SANNA GIORGIO

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

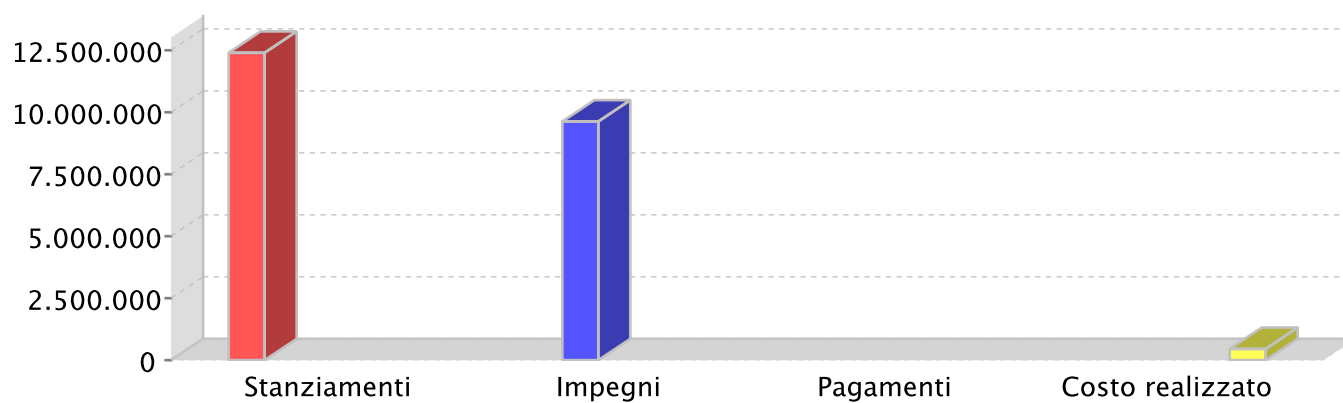

■ Stanziamenti=12.400.000,00 € ■ Impegni=9.628.739,07 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=454.578,00 €

Avanzamento impegni: 77.66 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.67 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
