




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Mobilità

DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

45

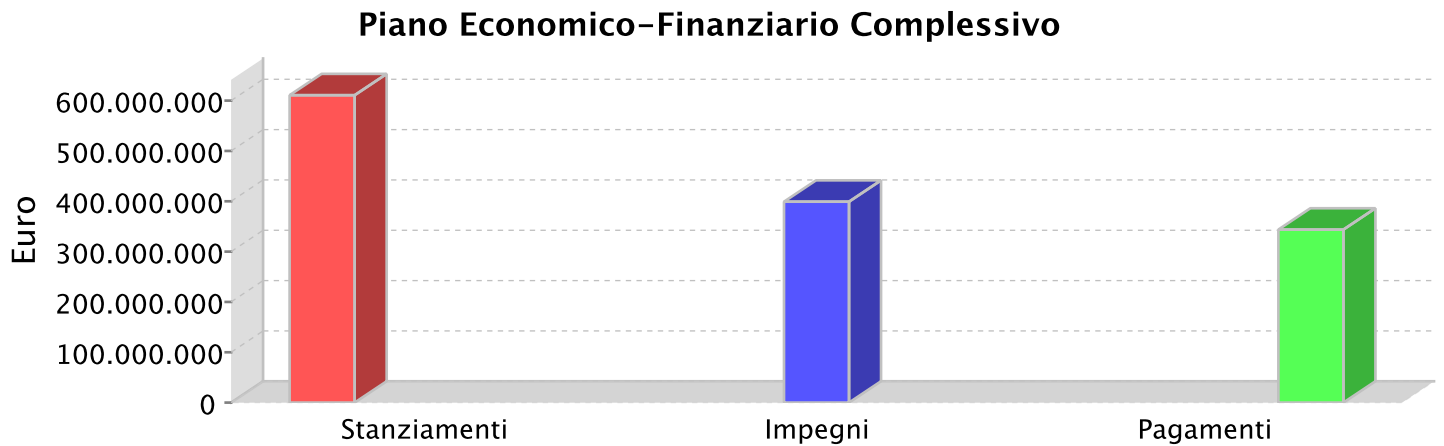


■ Stanziamenti=610.766.367,56 € ■ Impegni=399.192.211,89 €
■ Pagamenti =343.780.466,38 €

Avanzamento impegni: 65.36 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 56.29 % sullo stanziato

Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

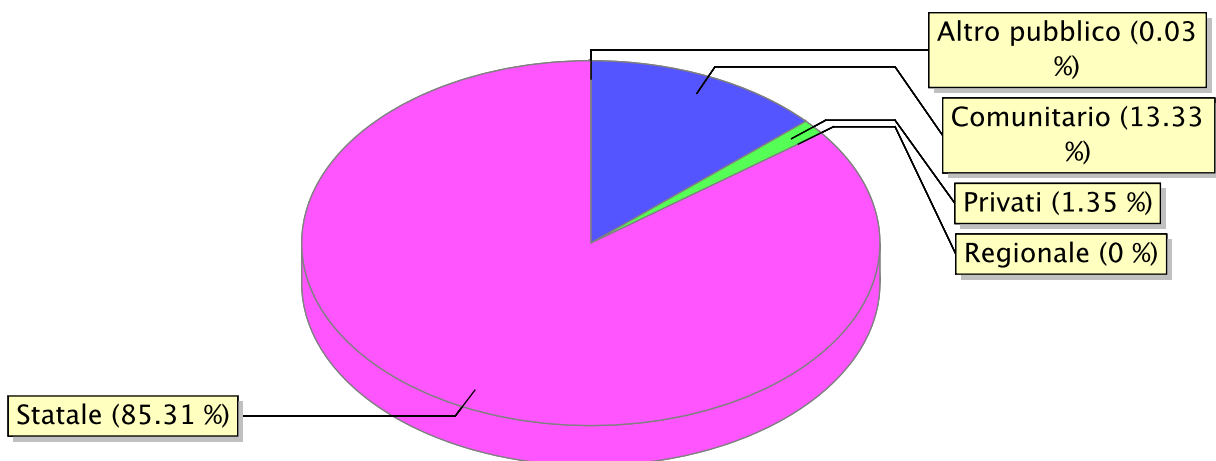

● Altro pubblico = 145.963,81 ● Comunitario = 81.406.499,47
● Privati = 8.212.880 ● Regionale = 0 ● Statale = 521.001.024,28

Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

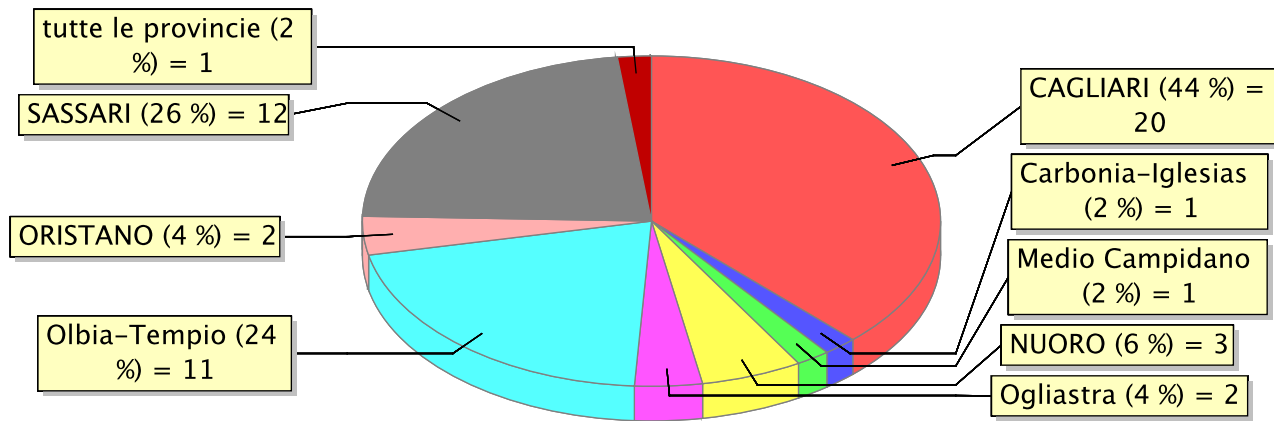

● CAGLIARI (44 %) = 20 ● Carbonia-Iglesias (2 %) = 1 ● Medio Campidano (2 %) = 1
● NUORO (6 %) = 3 ● Ogliastra (4 %) = 2 ● Olbia-Tempio (24 %) = 11
● ORISTANO (4 %) = 2 ● SASSARI (26 %) = 12 ● tutte le province (2 %) = 1

Report del progetto: RAS 01 - Ottimizzazione accessibilita Stazione Ferroviaria di Macomer tramite sottovia carrabile

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Macomer

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Ing. Elena Beccu

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

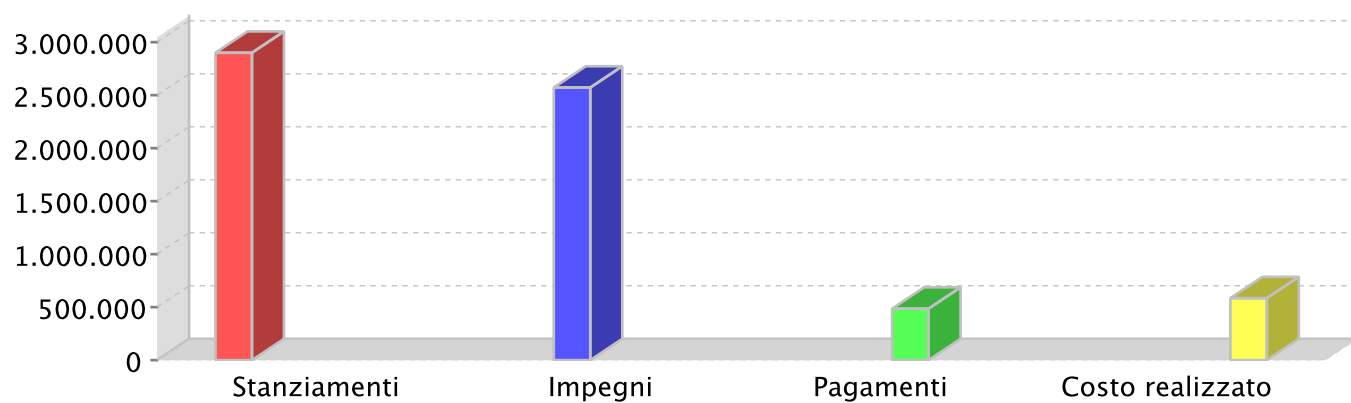

■ Stanziamenti=2.900.000,00 € ■ Impegni=2.571.530,67 €
■ Pagamenti=485.759,75 € ■ Costo realizzato=584.848,97 €

Avanzamento impegni: 88.68 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 20.17 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 16.76 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 04 - Ampliamento piazzale di sosta aeromobili e relative strutture logistiche (Lotto 1?) Aeroporto Olbia-Costa

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

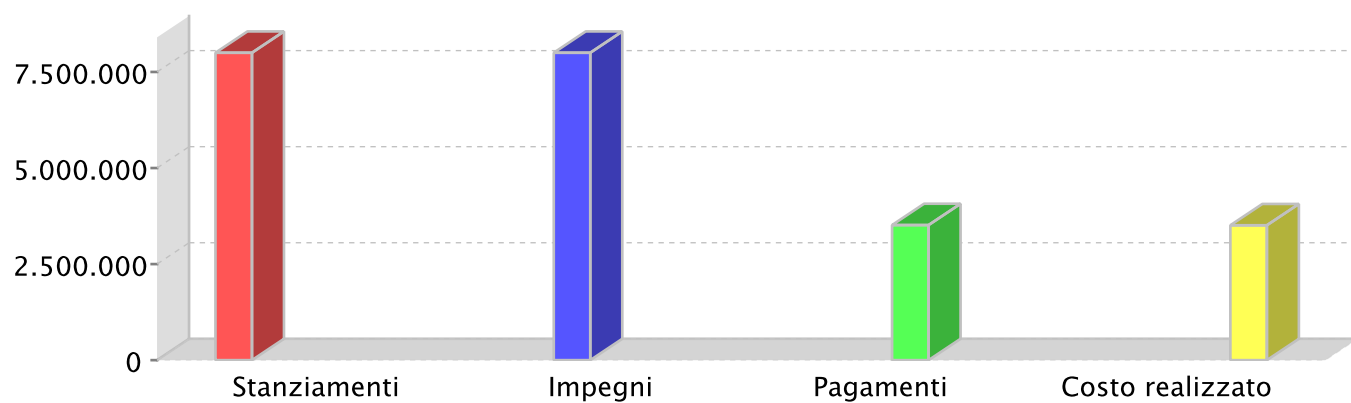

■ Stanziamenti=8.000.000,00 € ■ Impegni=8.000.000,00 €
■ Pagamenti=3.515.227,98 € ■ Costo realizzato=3.510.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 43.88 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 43.95 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 05 - Lavori di completamento dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

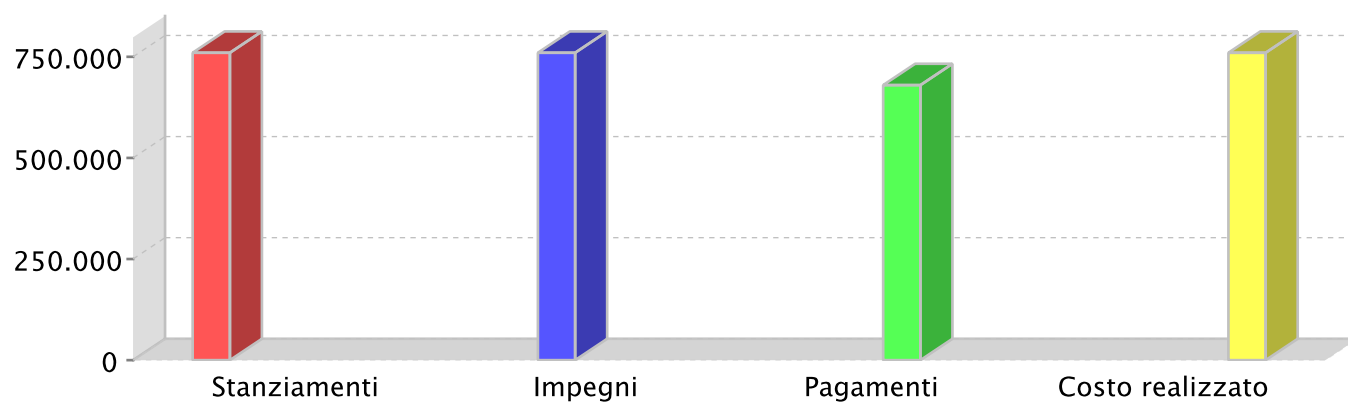

■ Stanziamenti=760.000,00 € ■ Impegni=760.000,00 €
■ Pagamenti=680.000,00 € ■ Costo realizzato=760.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 89.48 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 06 - Ristrutturazione vecchia aerostazione Aeroporto Alghero-Fertilia

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

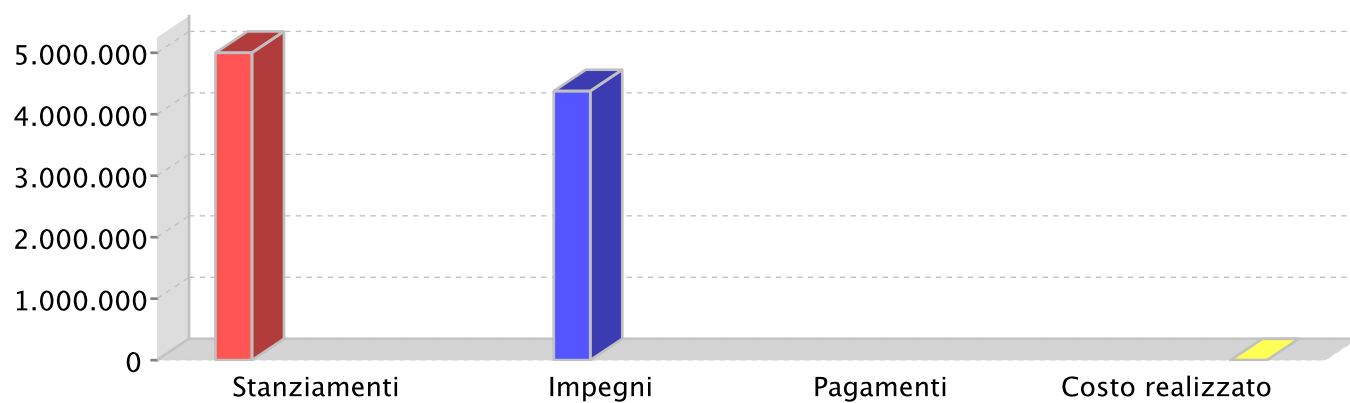

■ Stanziamenti=5.000.000,00 € ■ Impegni=4.376.893,62 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 87.54 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 08 - Zona di sicurezza (resa) testata 32 pista principale mediante colmata stagno Aeroporto Cagliari Elmas

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

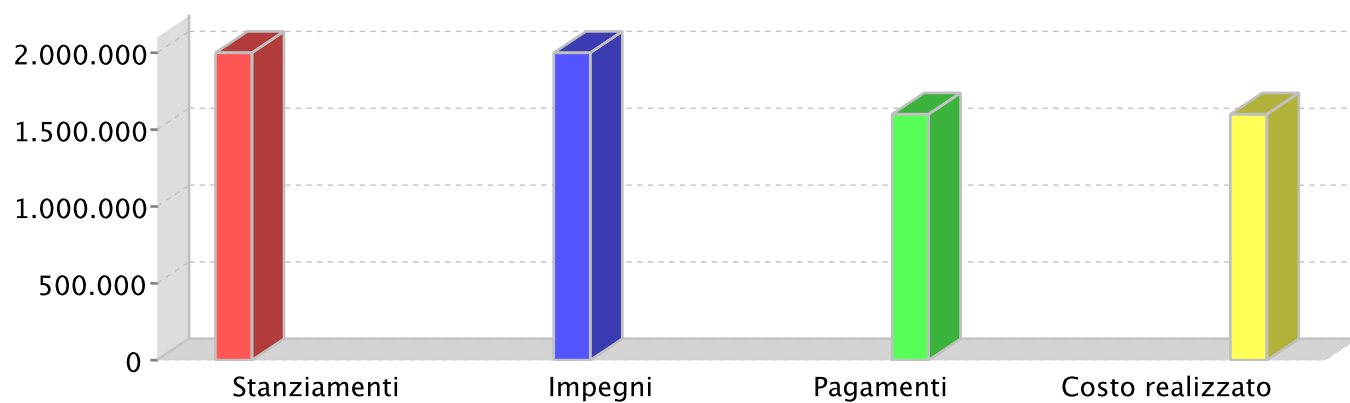

■ Stanziamenti=2.000.000,00 € ■ Impegni=2.000.000,00 €
■ Pagamenti=1.600.000,00 € ■ Costo realizzato=1.600.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 80.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 80.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 09 - Adeguamento pista di volo sussidiaria, comprese aree di sicurezza di testata (resa) e tombamento canale di

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

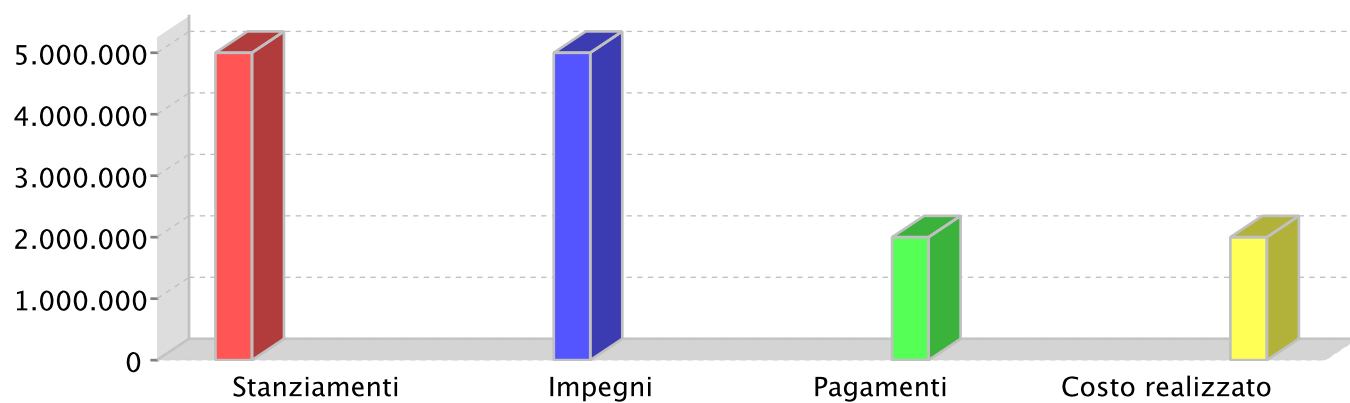

■ Stanziamenti=5.000.000,00 € ■ Impegni=5.000.000,00 €
■ Pagamenti=2.000.000,00 € ■ Costo realizzato=2.000.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 40.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 40.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAV-AL/01 - Aeroporto di Alghero ; AMMODERNAMENTO SISTEMA ATC

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) SASSARI	Alghero

Soggetto Attuatore

ENAV S.p.A.


Responsabile dell'intervento

ENAV S.p.A.

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

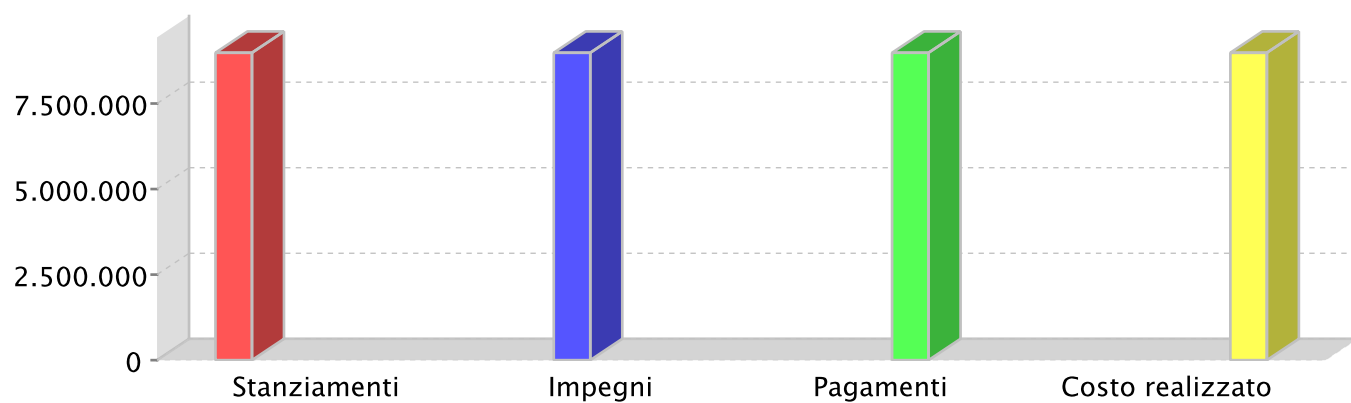

■ Stanziamenti=8.983.436,15 € ■ Impegni=8.983.436,15 €
■ Pagamenti=8.983.436,15 € ■ Costo realizzato=8.983.436,15 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAV-OL/01 - Ammodernamento Sistema ATC-Aeroporto Olbia

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

ENAV S.p.A.


Responsabile dell'intervento

Enav S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

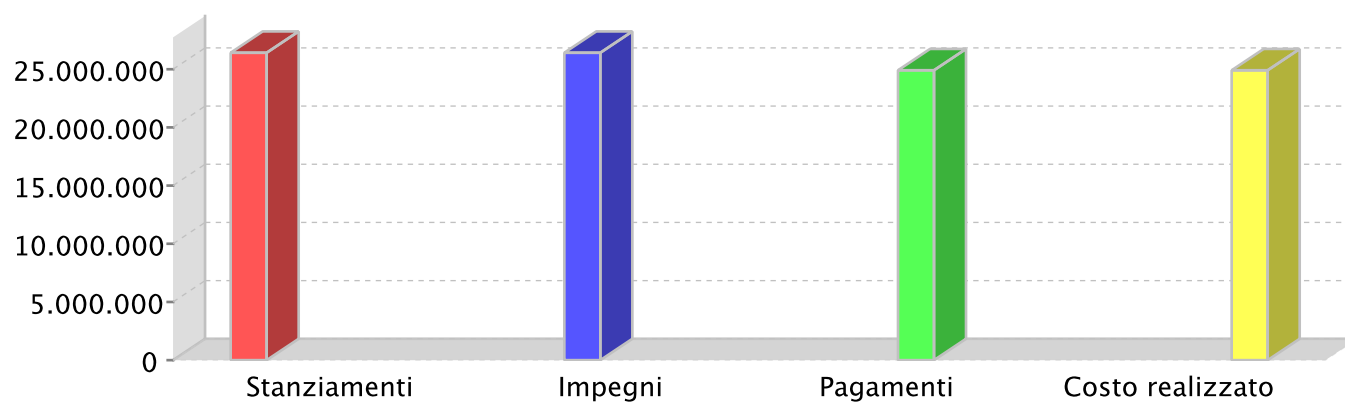

■ Stanziamenti=26.415.555,04 € ■ Impegni=26.415.555,04 €
■ Pagamenti=24.909.052,33 € ■ Costo realizzato=24.909.052,33 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 94.30 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 94.30 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-CA-01 - Aeroporto di Cagliari Aerostazione passeggeri II^ fase.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Elmas

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

SOGAER S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

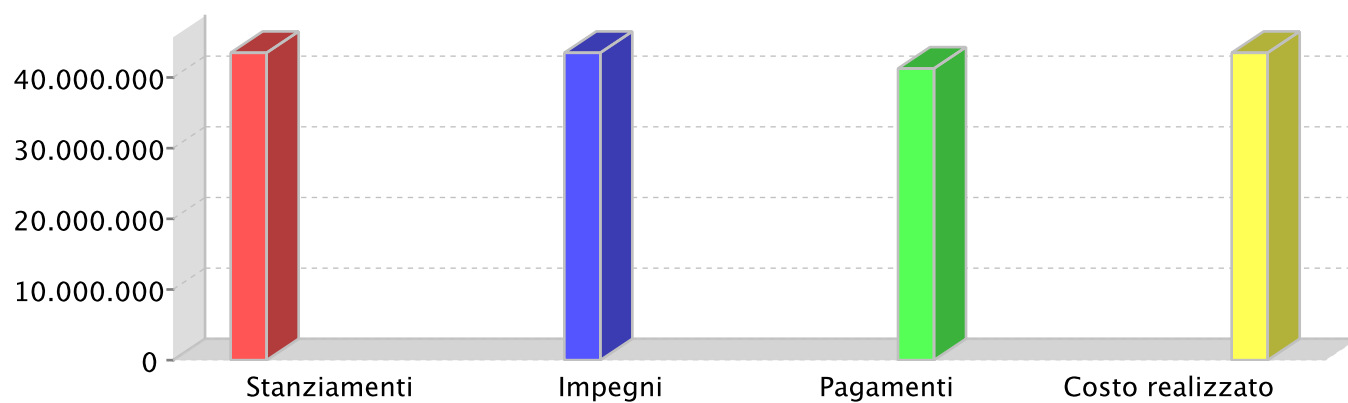

■ Stanziamenti=43.500.000,00 € ■ Impegni=43.500.000,00 €
■ Pagamenti=41.276.221,93 € ■ Costo realizzato=43.500.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 94.89 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-CA-02 - Aeroporto di Cagliari: Sistema controllo 100% bagagli da stiva

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Elmas

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

SOGAER S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

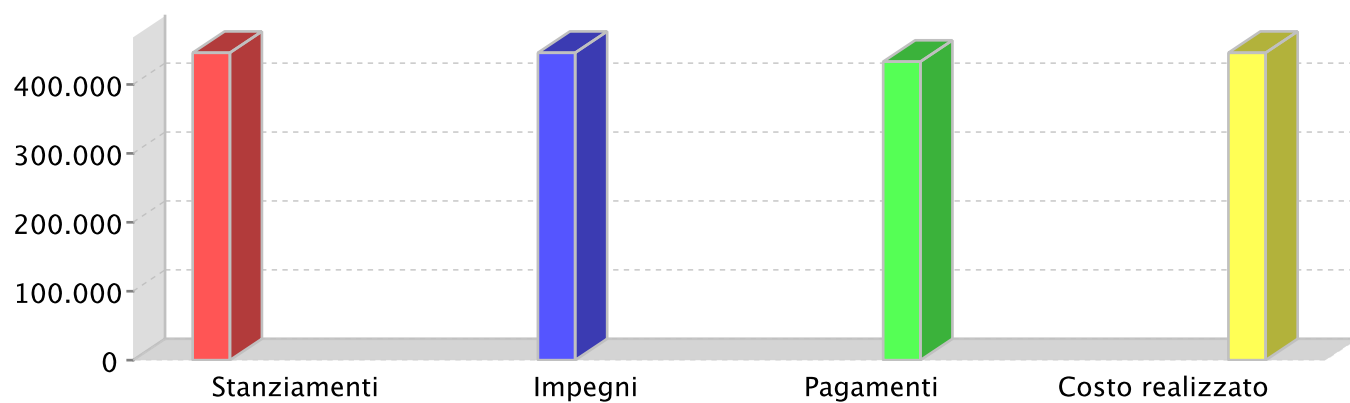

■ Stanziamenti=446.000,00 € ■ Impegni=446.000,00 €
■ Pagamenti=433.120,00 € ■ Costo realizzato=446.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 97.12 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-CA-03 - Aeroporto Cagliari: Riqualficazione aeroporto classe ICAO (pista principale)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Elmas

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Responsabile dell'intervento


SOGAER S.p.A.

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

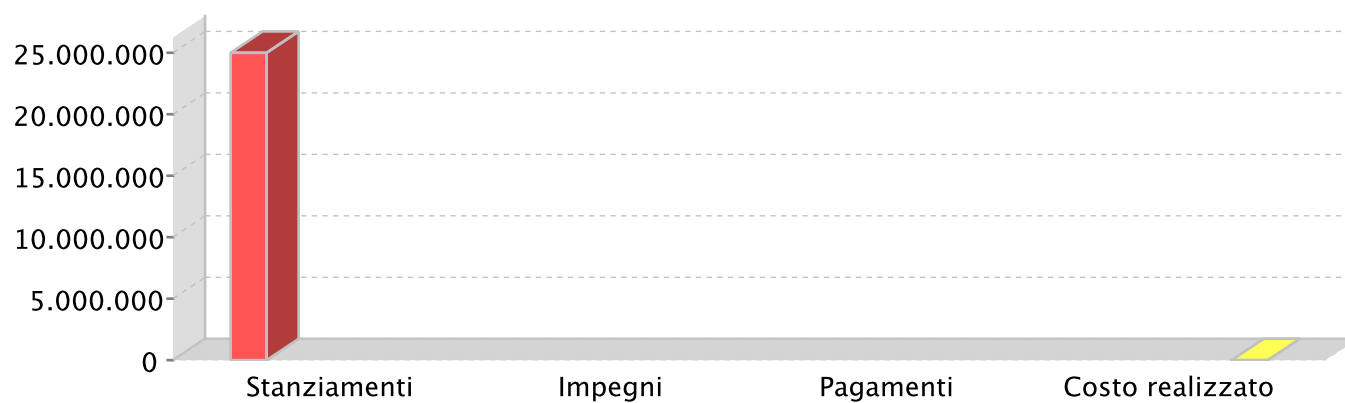

■ Stanziamenti=25.000.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-AL-01 - Aeroporto di Alghero:Sistema di controllo 100% bagagli da stiva.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

SOGEAAL S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

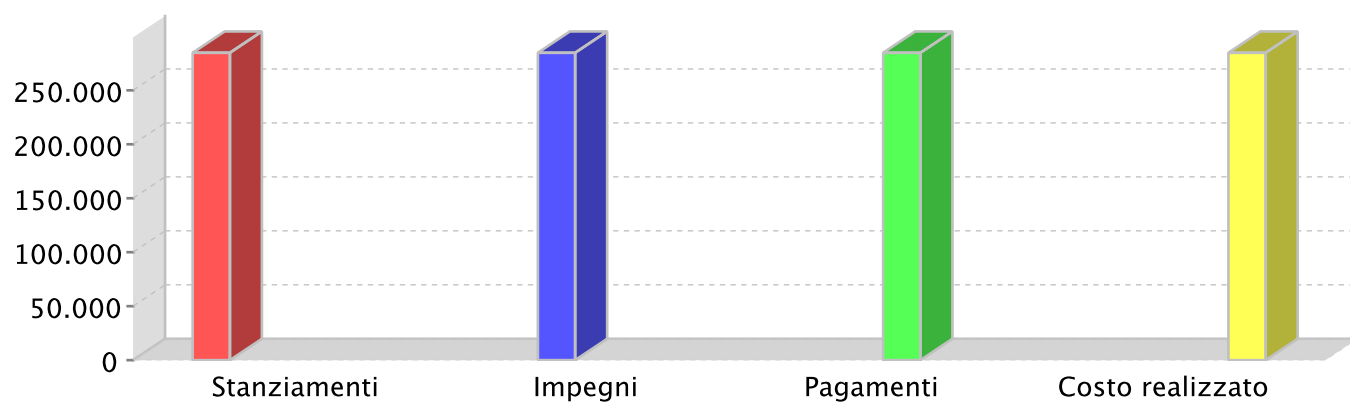

■ Stanziamenti=284.782,99 € ■ Impegni=284.782,99 €
■ Pagamenti=284.782,99 € ■ Costo realizzato=284.782,99 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-OL-01 - Aeroporto di Olbia: Sistema di controllo 100% bagagli da stiva.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Responsabile dell'intervento


GEASAR S.p.A.

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

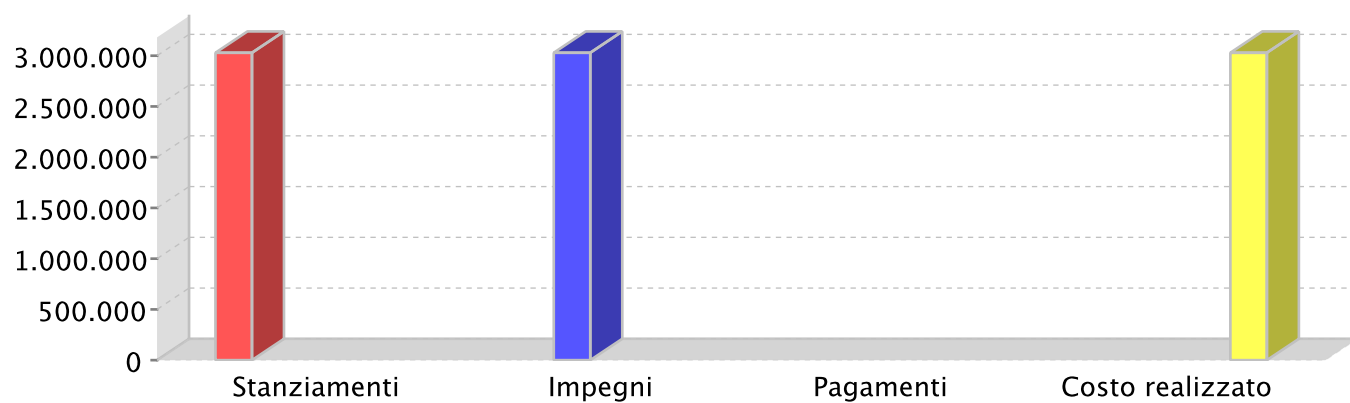

■ Stanziamenti=3.029.000,00 € ■ Impegni=3.029.000,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=3.029.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: ENAC-AL-02 - Aeroporto di Alghero - Riqualifica via di rullaggio 1? lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Alghero

Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


Responsabile dell'intervento

SOGEAAL S.p.A.

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

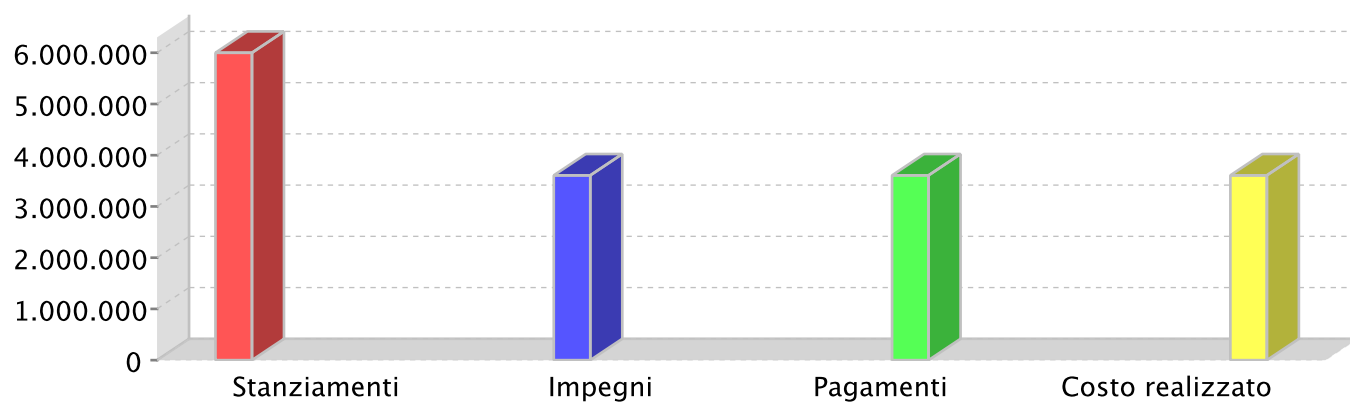

■ Stanziamenti=6.000.000,00 € ■ Impegni=3.607.346,38 €
■ Pagamenti=3.607.346,38 € ■ Costo realizzato=3.607.346,38 €

Avanzamento impegni: 60.13 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 60.13 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 60.13 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 01 - Porto di Porto Torres - Realizzazione di una struttura da adibire a terminal portuale a servizio dei vettori

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Servizio Integrato Infrastrutture Trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna - S.I.I.T. Sede Coordinata di Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

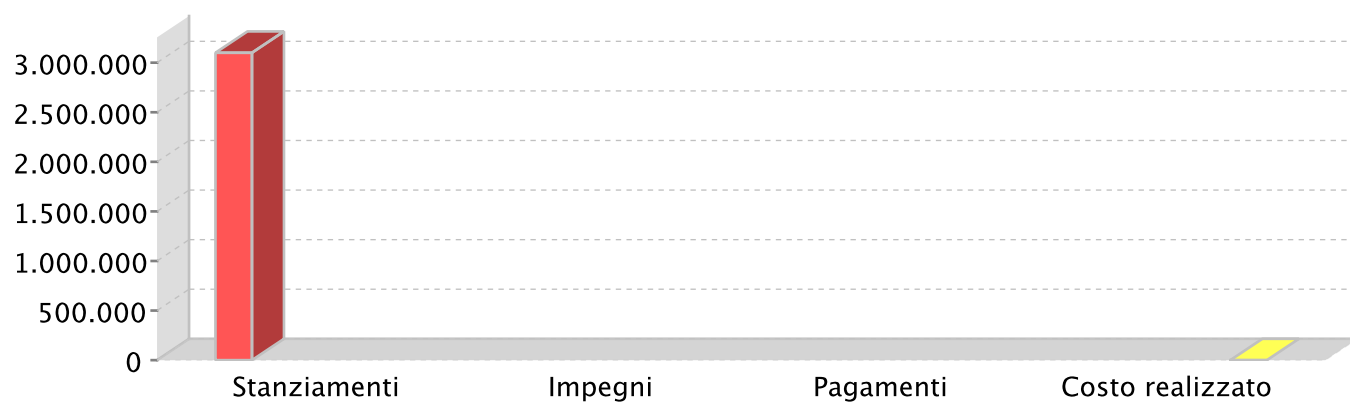

■ Stanziamenti=3.100.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-01 - Dragaggio a -16 metri bacino di evoluzione del porto canale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

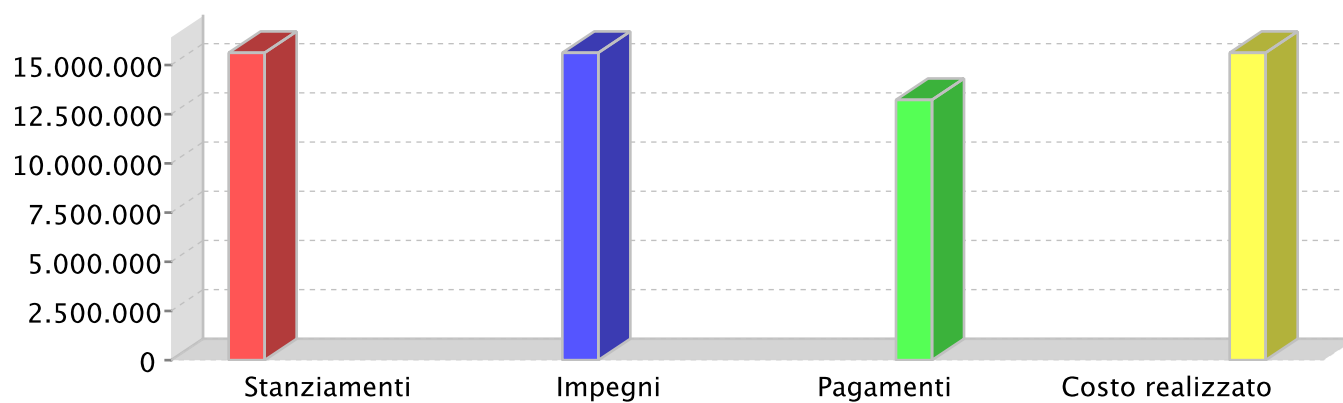

■ Stanziamenti=15.622.821,20 € ■ Impegni=15.622.821,20 €
■ Pagamenti=13.230.322,18 € ■ Costo realizzato=15.622.821,20 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 84.69 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-02 - Manutenzione straordinaria dente di attracco Molo Rinascita

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

Concluso



Piano Economico-Finanziario

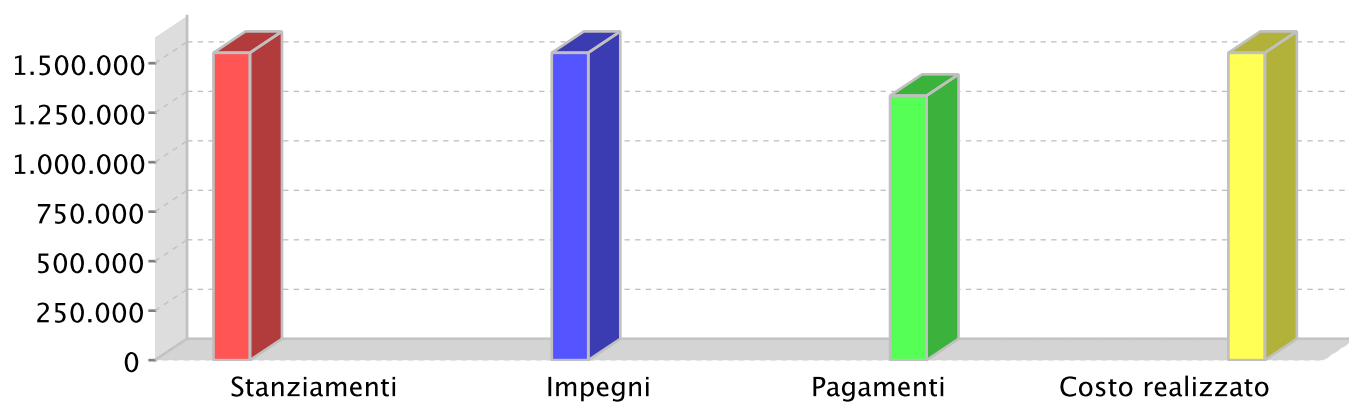

■ Stanziamenti=1.552.852,00 € ■ Impegni=1.552.852,00 €
■ Pagamenti=1.336.076,89 € ■ Costo realizzato=1.552.852,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 86.05 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-03 - I Lotto opere di infrastrutturazione avamposti Porto Canale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

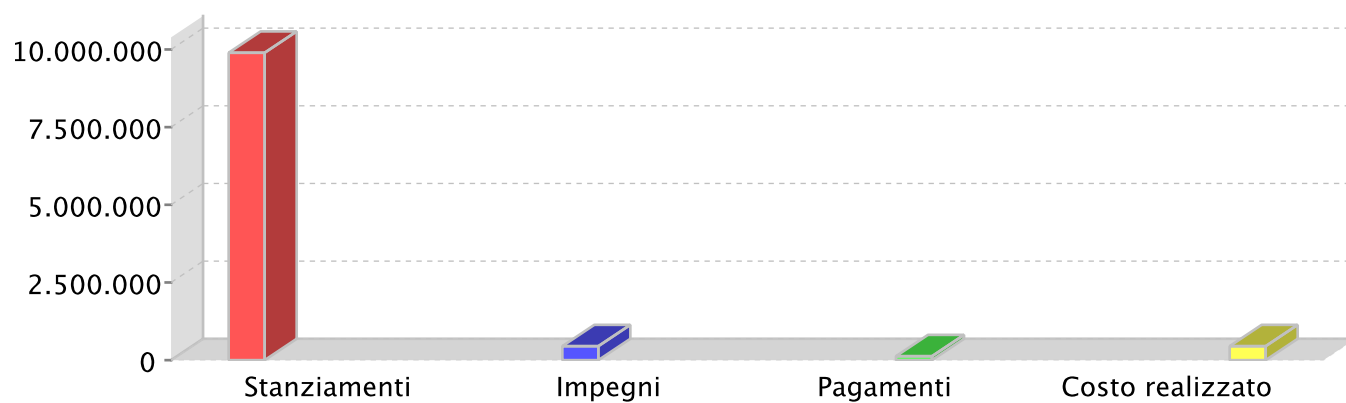

■ Stanziamenti=9.894.000,00 € ■ Impegni=450.000,00 €
■ Pagamenti=127.368,60 € ■ Costo realizzato=450.000,00 €

Avanzamento impegni: 4.55 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 4.55 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 1.29 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-04 - Realizzazione darsena Porto Foxi - Sarroch

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Sarroch

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

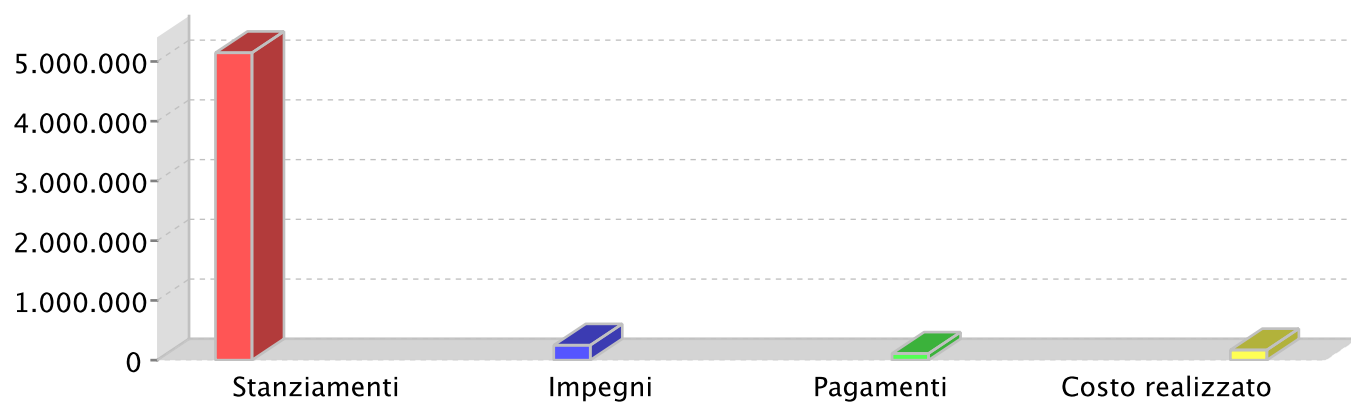

■ Stanziamenti=5.145.963,81 € ■ Impegni=250.000,00 €
■ Pagamenti=112.273,99 € ■ Costo realizzato=170.000,00 €

Avanzamento impegni: 4.86 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.31 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 2.19 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-05 - Realizzazione di una struttura sul Molo Ichnusa per l'accoglimento dei croceristi

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

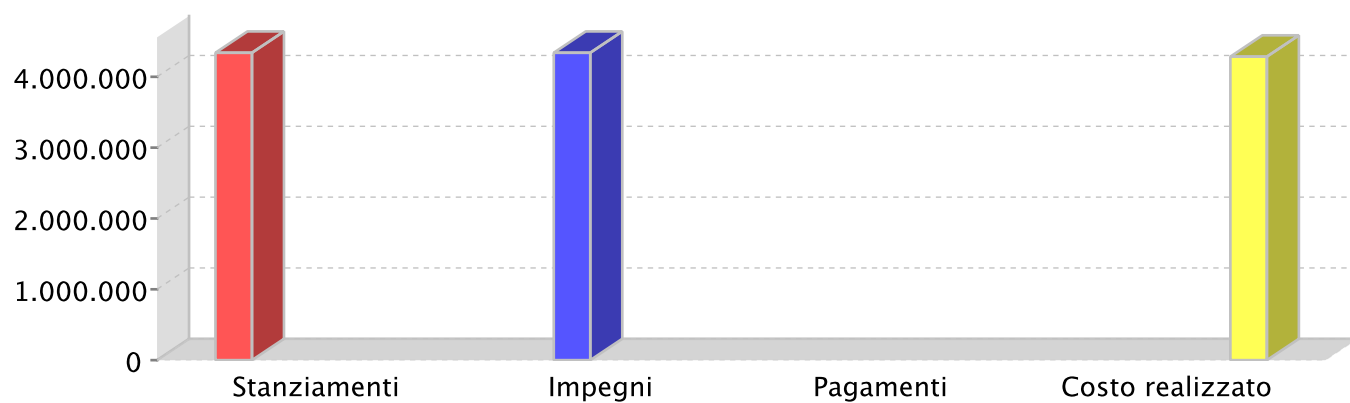

■ Stanziamenti=4.339.584,00 € ■ Impegni=4.339.584,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=4.284.514,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 98.74 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-06 - Realizzazione darsena pescherecci

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

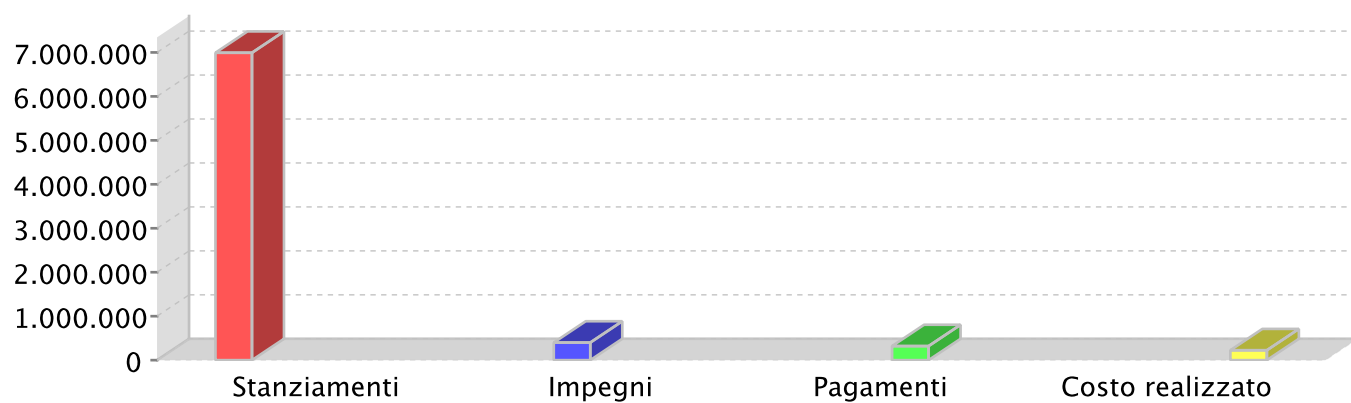

■ Stanziamenti=6.992.486,08 € ■ Impegni=400.000,00 €
■ Pagamenti=320.000,00 € ■ Costo realizzato=225.000,00 €

Avanzamento impegni: 5.73 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 3.22 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.58 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-07 - Adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo lato est

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

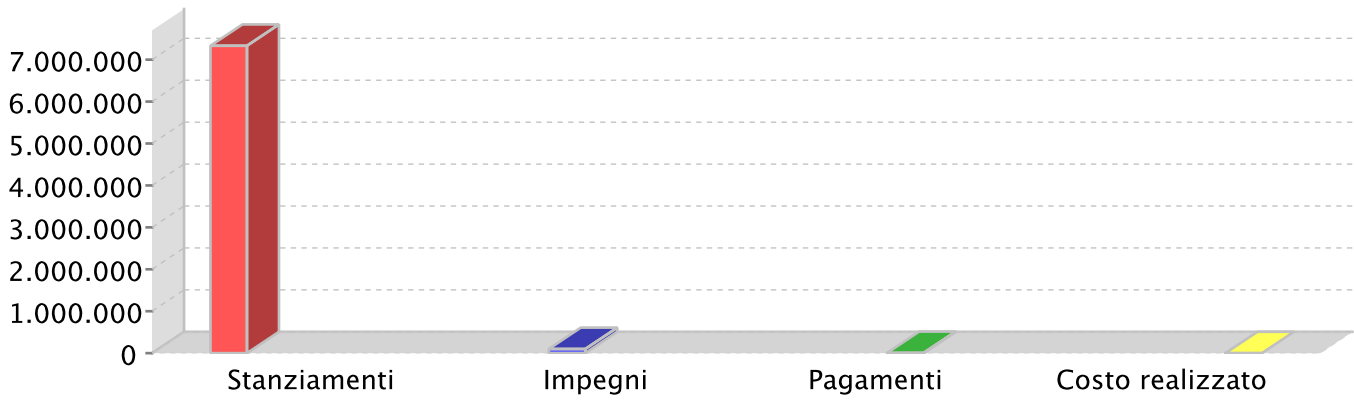

■ Stanziamenti=7.331.604,84 € ■ Impegni=100.000,00 €

■ Pagamenti=5.000,00 € ■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 1.37 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.07 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-08 - Manutenzione Straordinaria Fabbricato "Centro Servizi"

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari


Responsabile dell'intervento

Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

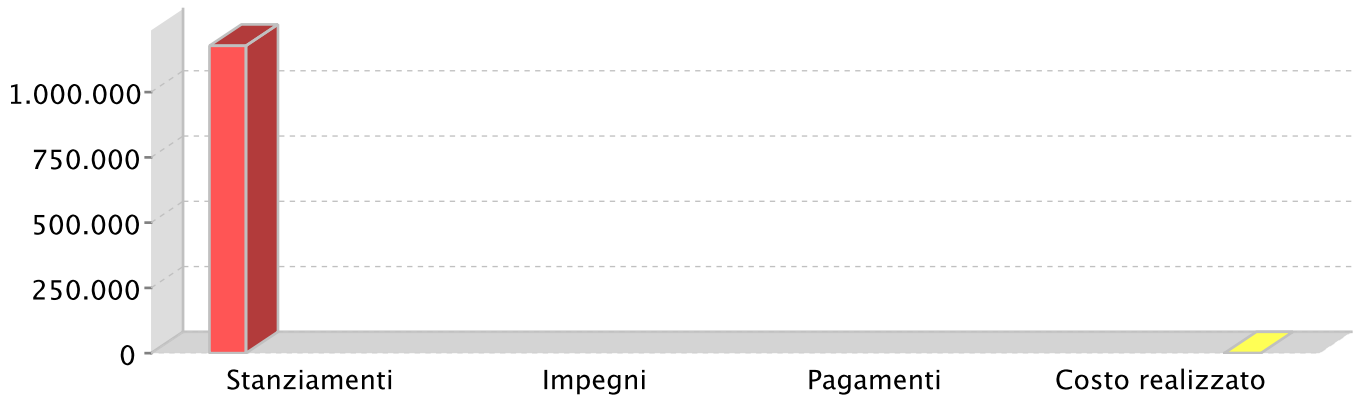

■ Stanziamenti=1.177.594,42 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: AP OL-GA01 - Porto di Olbia - Approfondimenti del bacino portuale lato nord

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Olbia e Golfo Aranci

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Olbia e Golfo Aranci - Ing. Alessandro Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

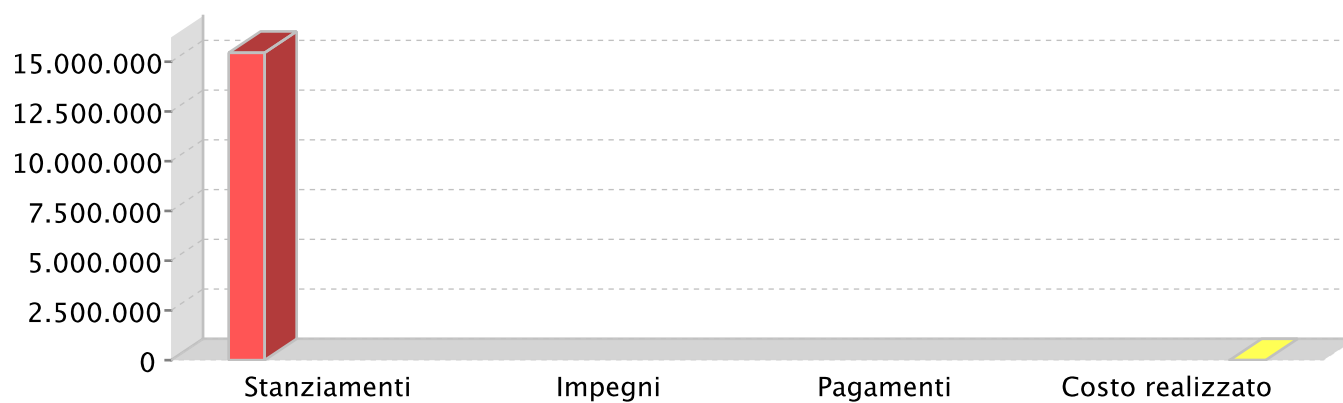

■ Stanziamenti=15.450.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: AP OL-GA02 - Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione del porto pescherecci

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Golfo Aranci

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Olbia e Golfo Aranci

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Olbia e Golfo Aranci - Ing. Alessandro Meloni

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

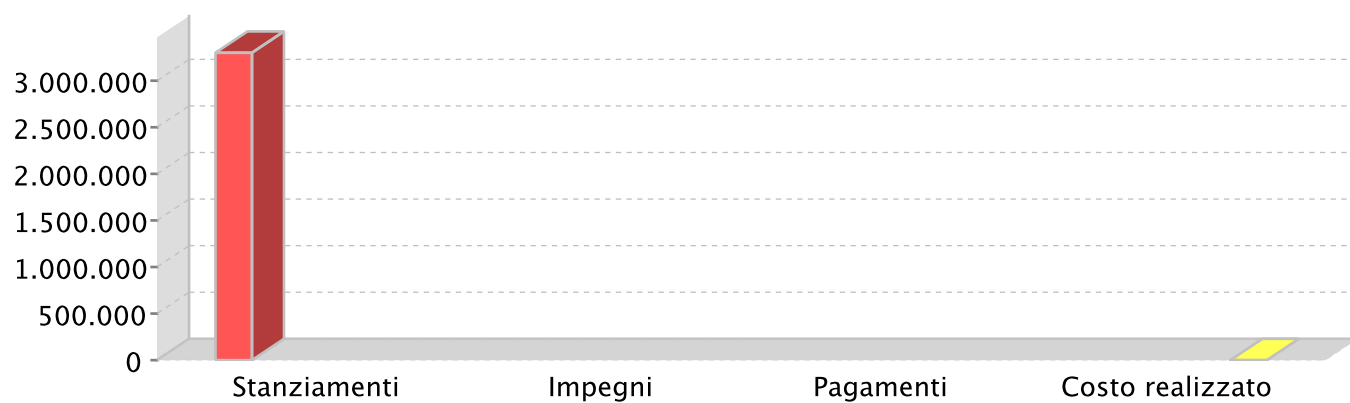

■ Stanziamenti=3.300.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 02 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo necessario al mantenimento dei fondali del porto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Servizio Integrato Infrastrutture Trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna S.I.I.T - Sede Coordinata di Cagliari

Stato del progetto

Realizzato



Piano Economico-Finanziario

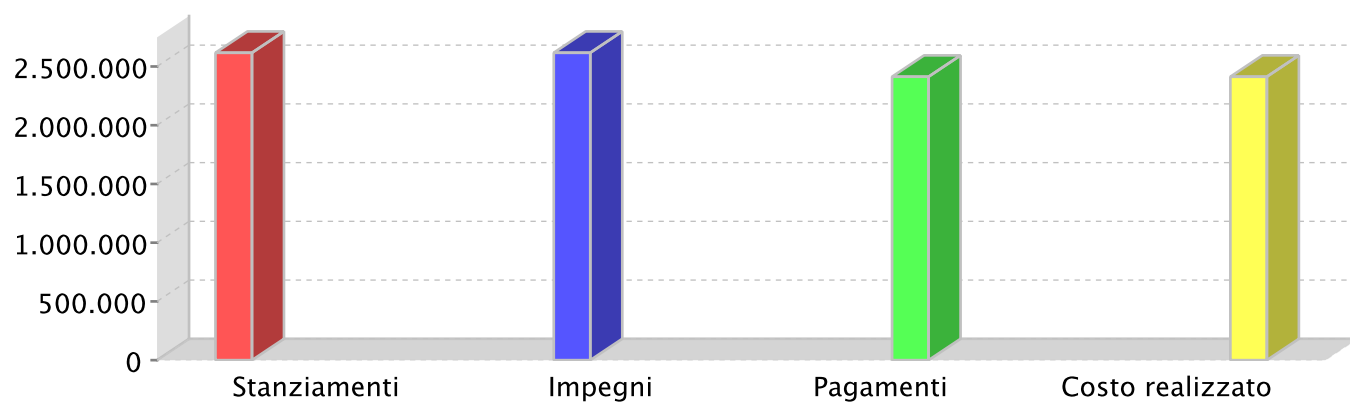

■ Stanziamenti=2.616.874,63 € ■ Impegni=2.616.874,63 €
■ Pagamenti=2.413.015,48 € ■ Costo realizzato=2.413.015,48 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 92.21 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 92.21 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 03 - Porto di Porto Torres - Progetto dell'escavo del fondale antistante la nuova banchina ASI

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

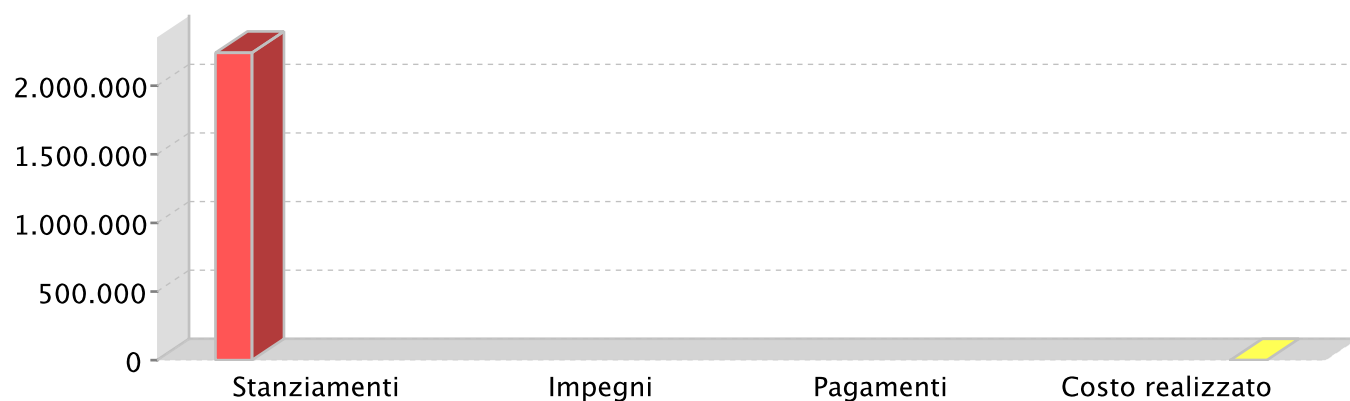

■ Stanziamenti=2.240.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 04 - Porto di Porto Torres - Impianto di condizionamento nell'edificio sede della Capitaneria di Porto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA

Responsabile dell'intervento


Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

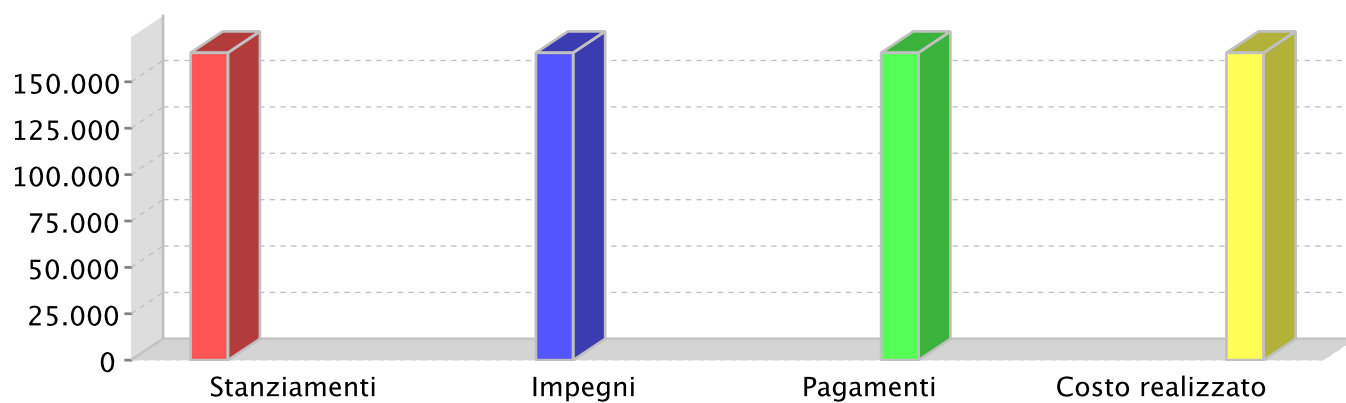

■ Stanziamenti=165.666,62 € ■ Impegni=165.666,62 €
■ Pagamenti=165.666,62 € ■ Costo realizzato=165.666,62 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 05 - Porto di Olbia - Sistemazione del Lungomare via Genova molo Brin.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Provveditorato Regionale OO.PP della Sardegna

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

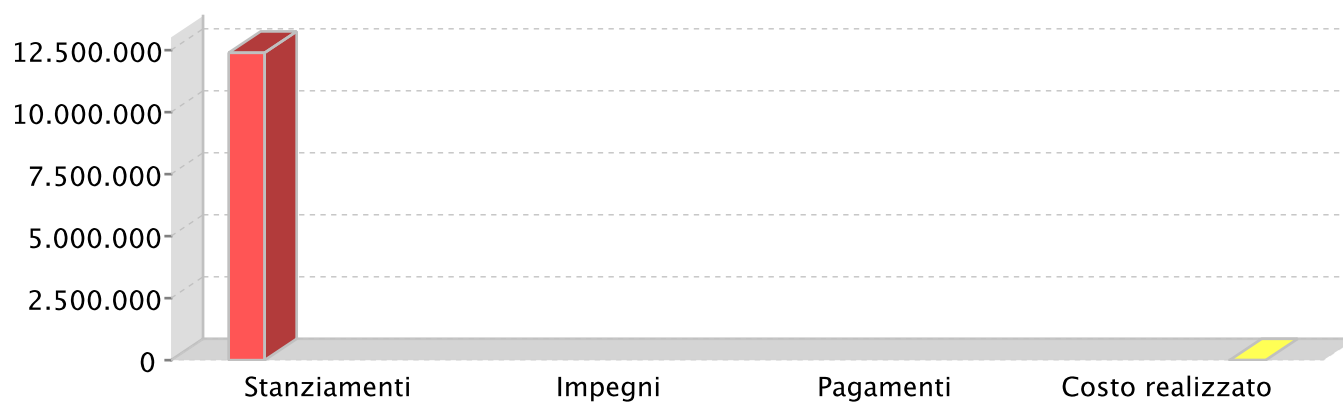

■ Stanziamenti=12.395.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 06 - Porto di Olbia - Ripristino e completamento delle soglie guardiane sulla banchina dell'Isola Bianca

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	Olbia

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna - S.I.I.T. Sede Coordinata di Cagliari

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

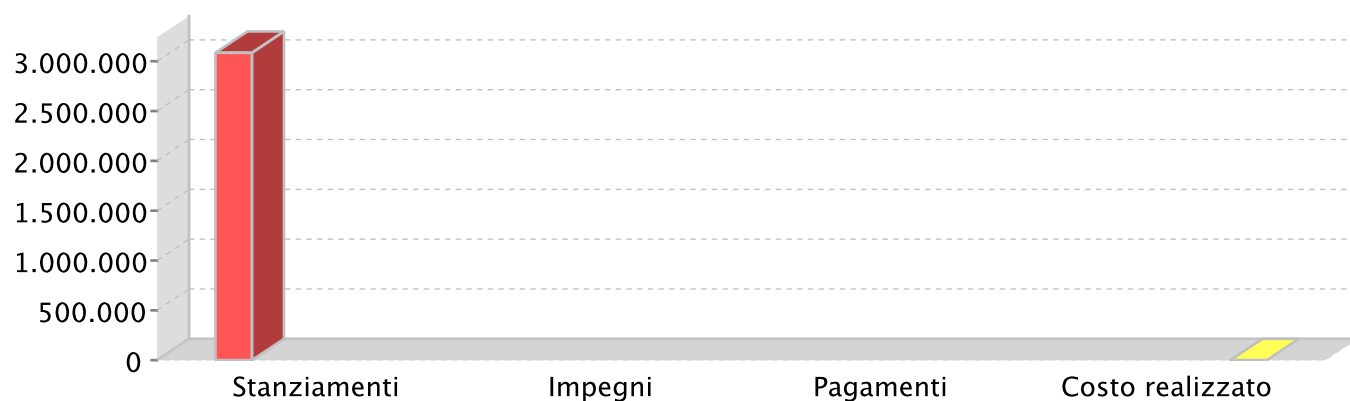

■ Stanziamenti=3.085.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 07 - Porto di Porto Torres - Fornitura ed installazione parabordi nel terzo accosto del porto industriale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

Realizzato

Piano Economico-Finanziario

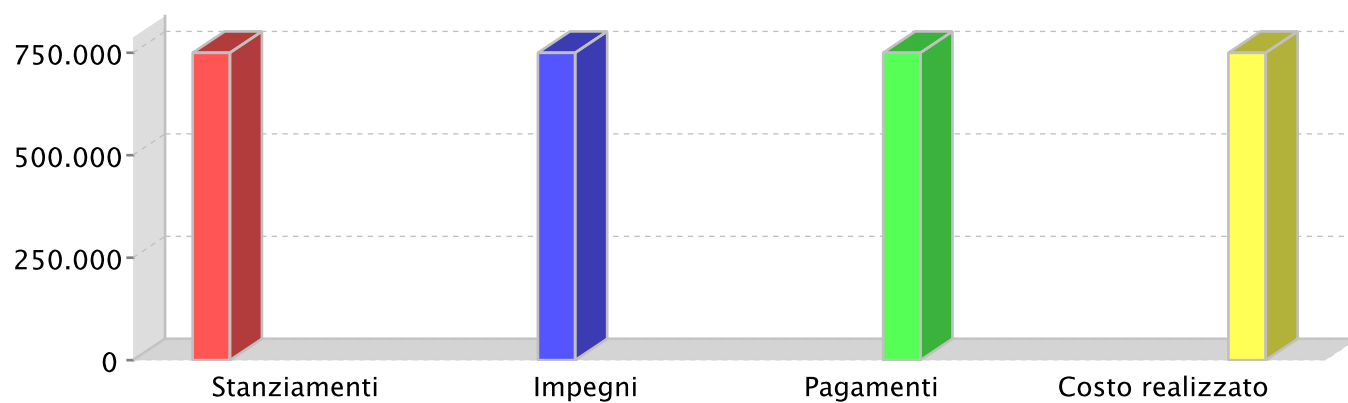

■ Stanziamenti=750.000,00 € ■ Impegni=750.000,00 €
■ Pagamenti=750.000,00 € ■ Costo realizzato=750.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 08 - Porto di Porto Torres - (SS A 407) - Nuovo Molo di Levante per costruire l'avamposto del porto commerciale

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Porto Torres

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

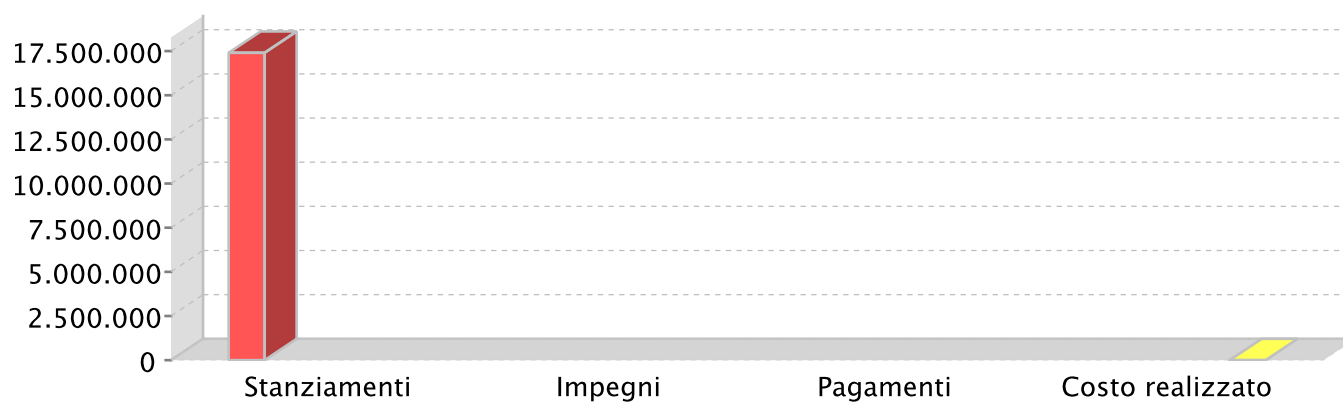

■ Stanziamenti=17.405.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 09 - Cagliari (CA A 301) - Lavori di manutenzione straordinaria ex deposito AGIP con nuova destinazione

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

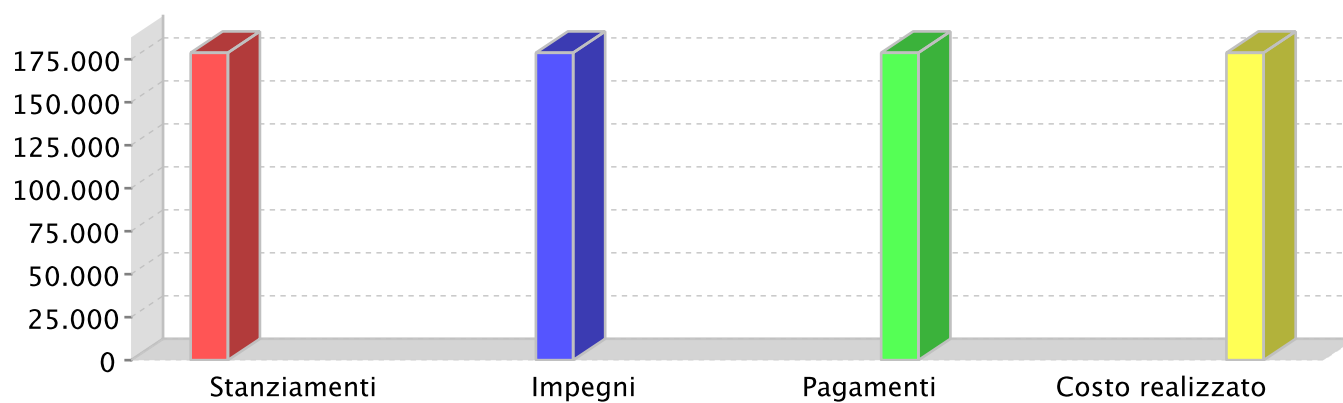

■ Stanziamenti=178.778,00 € ■ Impegni=178.778,00 €
■ Pagamenti=178.778,00 € ■ Costo realizzato=178.778,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 10 - Cagliari (CA A 288) - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria edificio della Capitaneria di Porto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

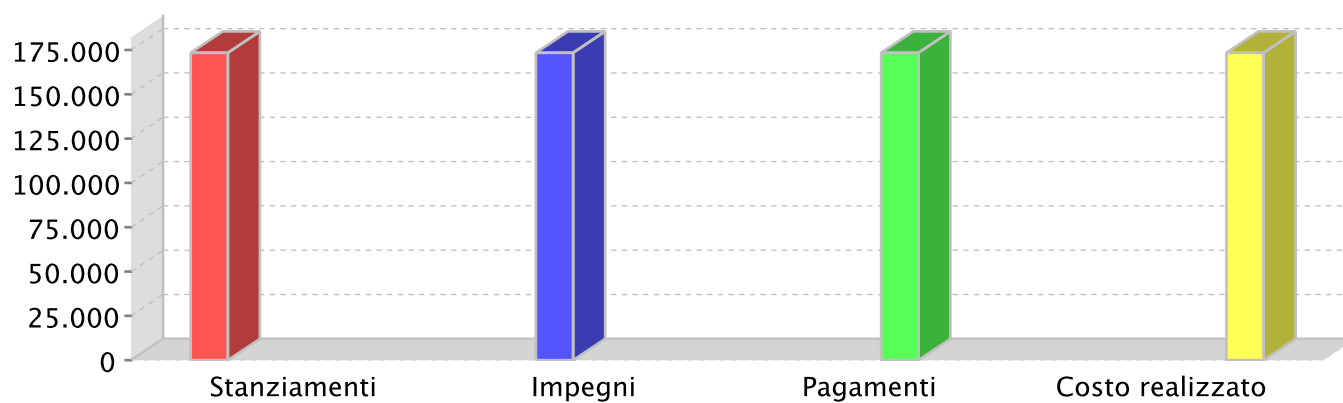

■ Stanziamenti=173.436,43 € ■ Impegni=173.436,43 €
■ Pagamenti=173.436,43 € ■ Costo realizzato=173.436,43 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 11 - Cagliari - Pavimentazione dell'area demaniale in uso alla Guardia di Finanza sita in localita Su Siccu

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Cagliari

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

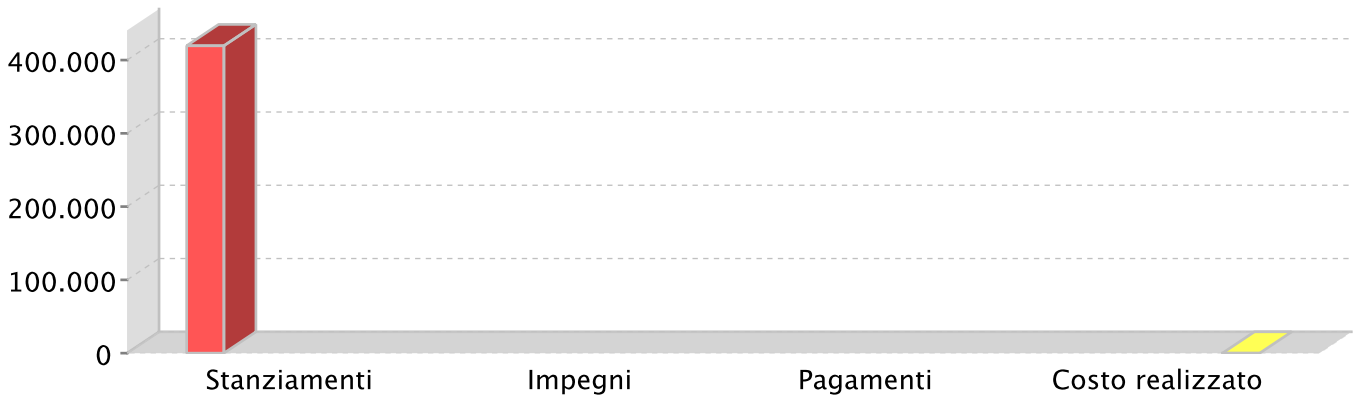

■ Stanziamenti=419.542,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 12 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	La Maddalena

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

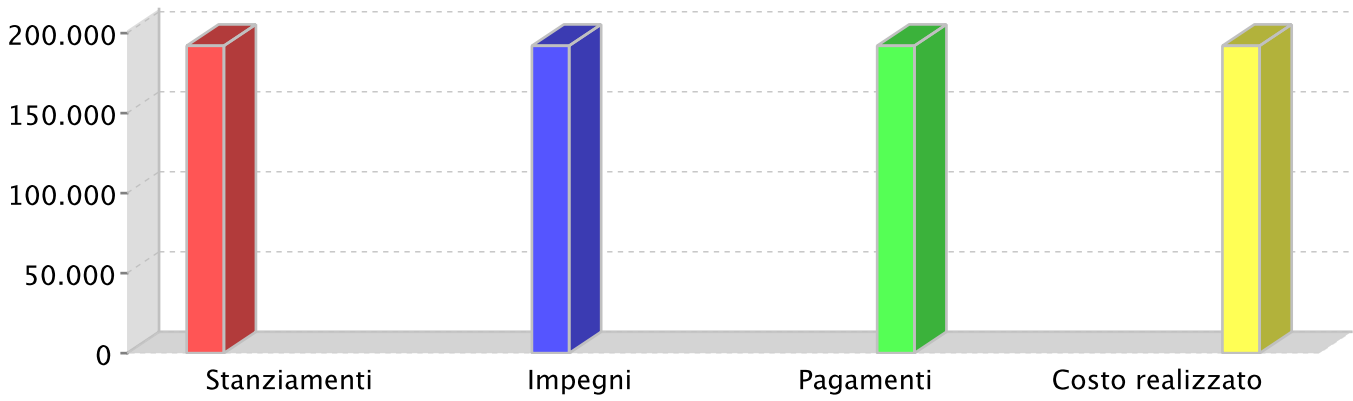

■ Stanziamenti=192.106,45 € ■ Impegni=192.106,45 €
■ Pagamenti=192.106,45 € ■ Costo realizzato=192.106,45 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: MIT 13 - La Maddalena - Lavori di ristrutturazione della caserma Barletta in uso Squadriglio Navale G.F.

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Olbia-Tempio	La Maddalena

Soggetto Attuatore

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP PER LA SARDEGNA


Responsabile dell'intervento

Ministero Infrastrutture e Trasporti S.I.I.T. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede Coordinata Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

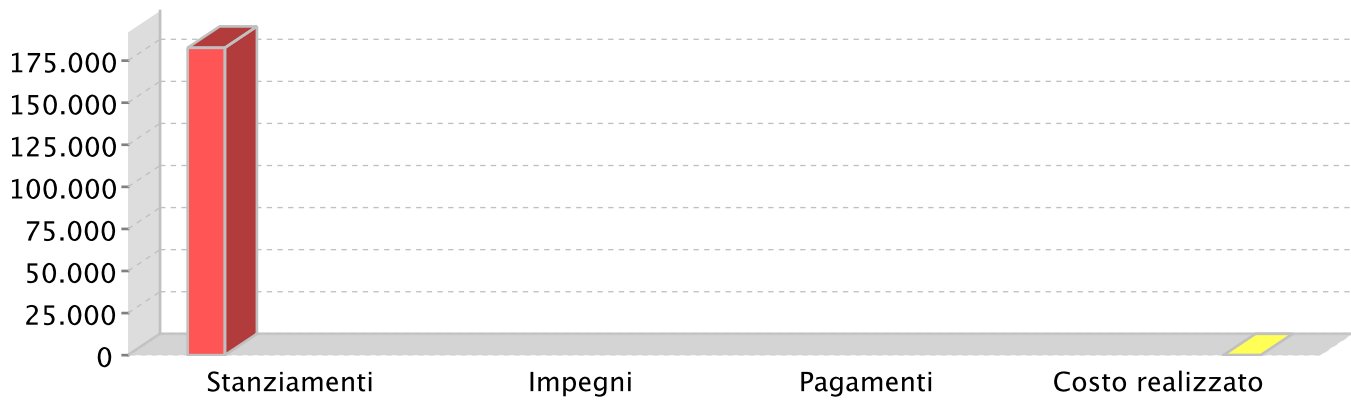

■ Stanziamenti=182.650,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI 01 - Ammodernamento e velocizzazione Rete sarda - Telecomando della rete sarda (SCC)

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	tutti i comuni
2) NUORO	tutti i comuni
3) CAGLIARI	tutti i comuni
4) ORISTANO	tutti i comuni

Soggetto Attuatore

RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURE - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale Infrastruttura - Cagliari

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

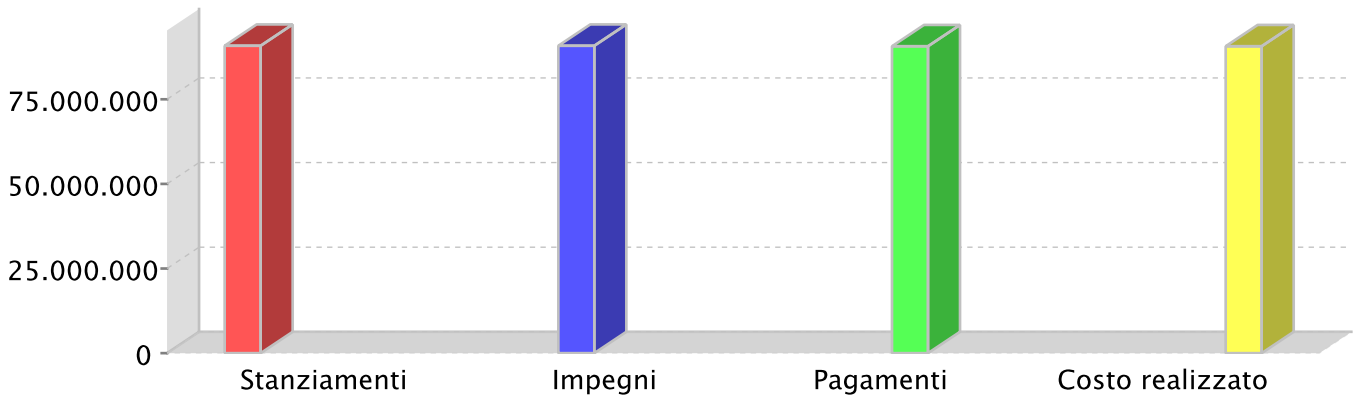

■ Stanziamenti=90.811.000,00 € ■ Impegni=90.811.000,00 €
■ Pagamenti=90.664.208,00 € ■ Costo realizzato=90.664.208,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 99.84 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 99.84 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI 02 - Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda - Variante Chilivani

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) SASSARI	Ozieri

Soggetto Attuatore

RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURE - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione compartimentale infrastruttura - Cagliari

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

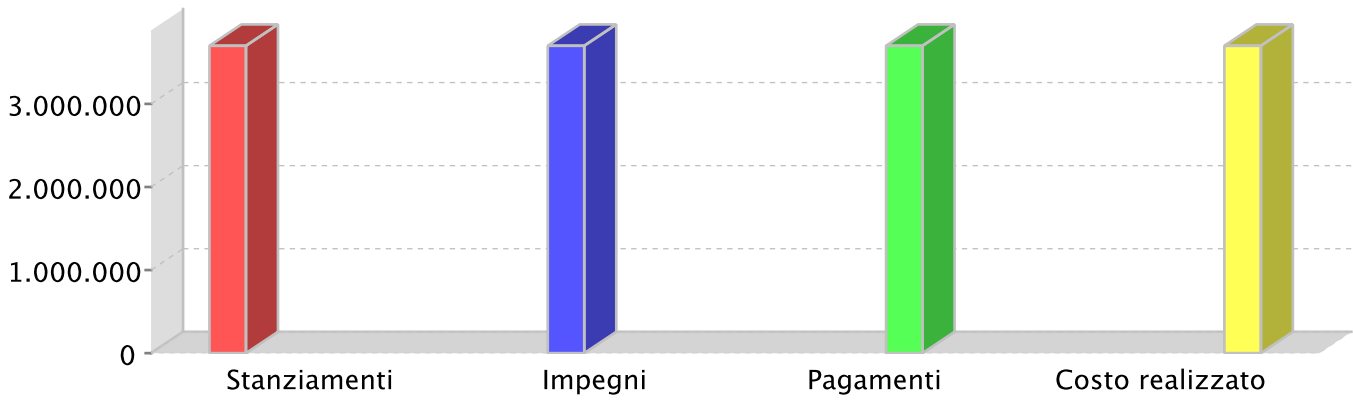

■ Stanziamenti=3.700.000,00 € ■ Impegni=3.700.000,00 €
■ Pagamenti=3.700.000,00 € ■ Costo realizzato=3.700.000,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI 03 - Raddoppio Decimomannu - San Gavino

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) CAGLIARI	Decimomannu
2) CAGLIARI	Decimoputzu
3) CAGLIARI	Villasor
4) Medio Campidano	Samassi
5) Medio Campidano	San Gavino Monreale
6) Medio Campidano	Sanluri
7) Medio Campidano	Serramanna

Soggetto Attuatore

RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURE - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale Infrastruttura - Cagliari

Stato del progetto

Concluso

Piano Economico-Finanziario

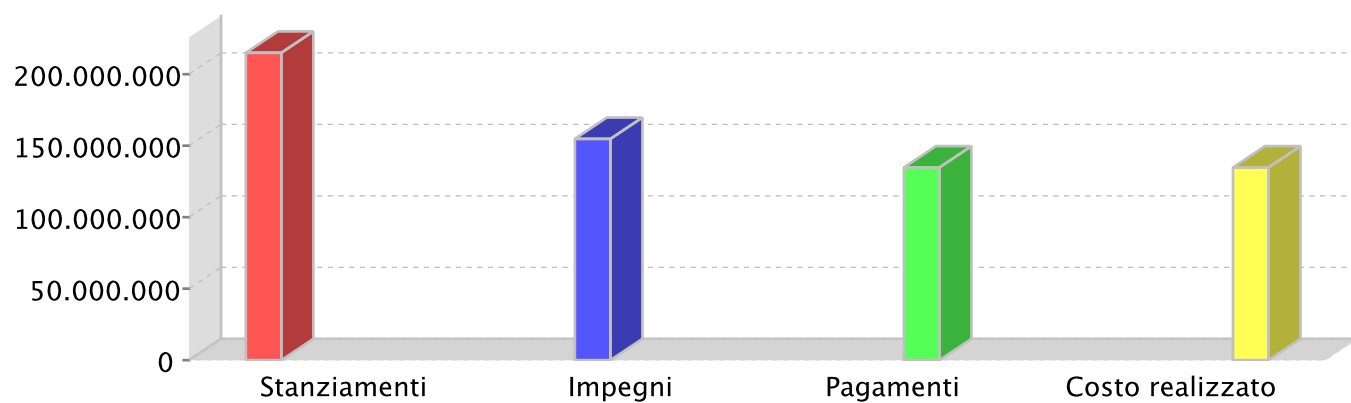

■ Stanziamenti=215.000.000,00 € ■ Impegni=154.776.160,00 €
■ Pagamenti=134.776.160,00 € ■ Costo realizzato=134.776.160,00 €

Avanzamento impegni: 71.99 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 62.69 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 62.69 % sullo stanziato

Report del progetto: RFI 04 - Riqualificazione e mantenimento stazioni/fermate - Macomer - Oristano - Abbasanta - Siliqua -

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) NUORO	Macomer
2) CAGLIARI	Assemini
3) CAGLIARI	Cagliari
4) CAGLIARI	Siliqua
5) CAGLIARI	Elmas
6) ORISTANO	Abbasanta
7) ORISTANO	Oristano
8) Olbia-Tempio	Olbia
9) Carbonia-Iglesias	Villamassargia

Soggetto Attuatore

RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURE - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale Infrastruttura - Cagliari

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

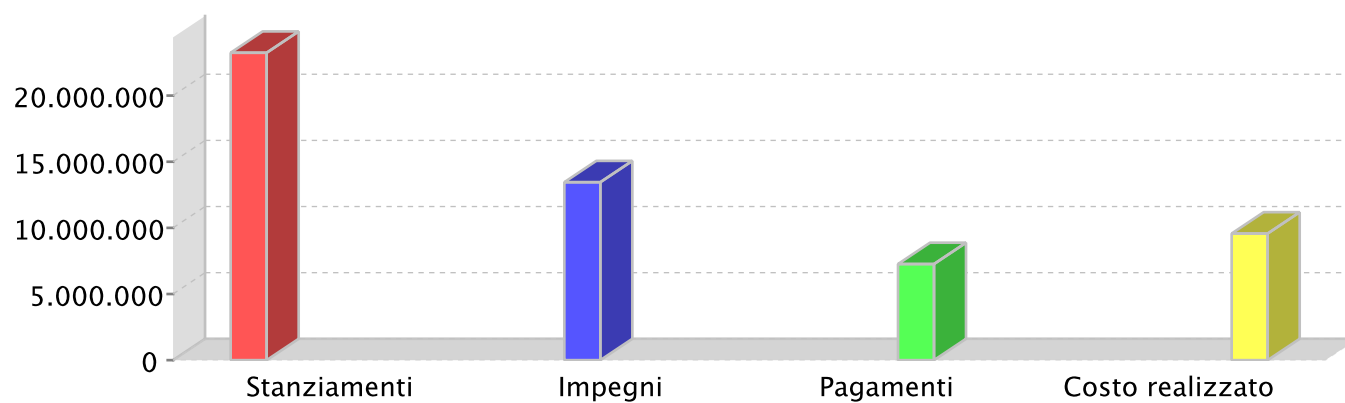

■ Stanziamenti=23.239.000,00 € ■ Impegni=13.452.176,00 €
■ Pagamenti=7.266.836,00 € ■ Costo realizzato=9.573.615,00 €

Avanzamento impegni: 57.89 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 41.20 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 31.28 % sullo stanziato

Report del progetto: AP CA-09 - Banchinamento lato di ponente del Porto Canale - I Lotto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia
1) CAGLIARI

Comune
Cagliari

Soggetto Attuatore

Autorita Portuale di Cagliari

Responsabile dell'intervento


Autorita Portuale di Cagliari

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

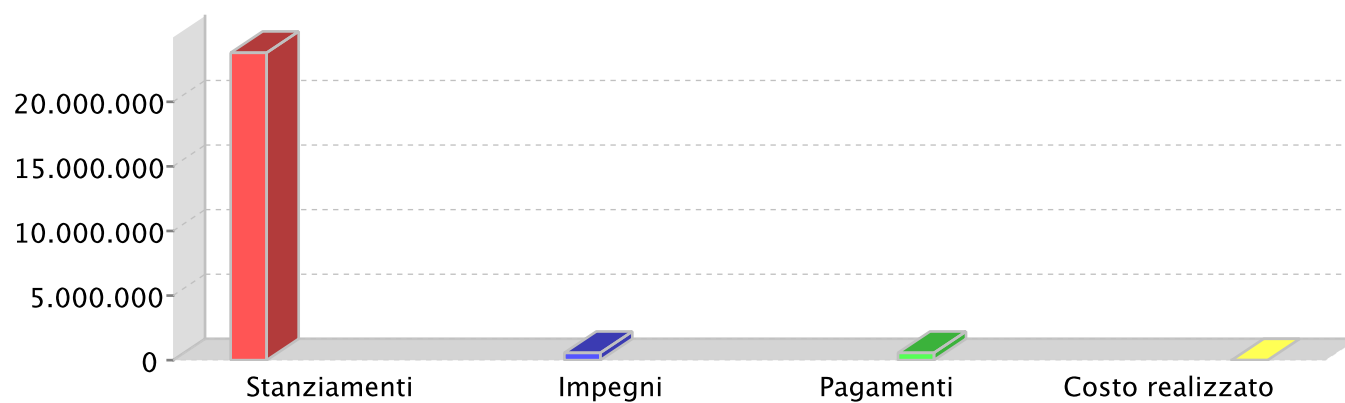

■ Stanziamenti=23.797.152,90 € ■ Impegni=568.731,71 €

■ Pagamenti=568.731,71 € ■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 2.39 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 2.39 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 02/a - Studi di fattibilità previsti dall'I.I.P 21/04/99 per il risanamento delle Aziende Governative Ferrovie della

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilità

Localizzazione

Provincia

1) tutte le provincie

Comune

tutti i comuni

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento


Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Trasporti

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

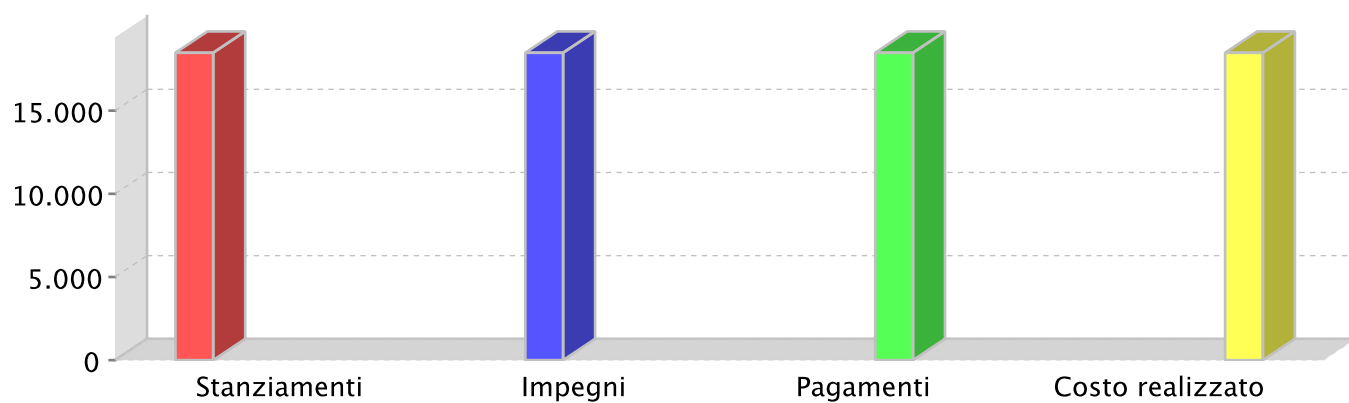

■ Stanziamenti=18.480,00 € ■ Impegni=18.480,00 € ■ Pagamenti=18.480,00 €
■ Costo realizzato=18.480,00 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 100.00 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 03/a - Tortoli - Adeguamento aeroporto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Tortoli'

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

Responsabile dell'intervento


Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Ing. Antonio Usai

Stato del progetto

In corso



Piano Economico-Finanziario

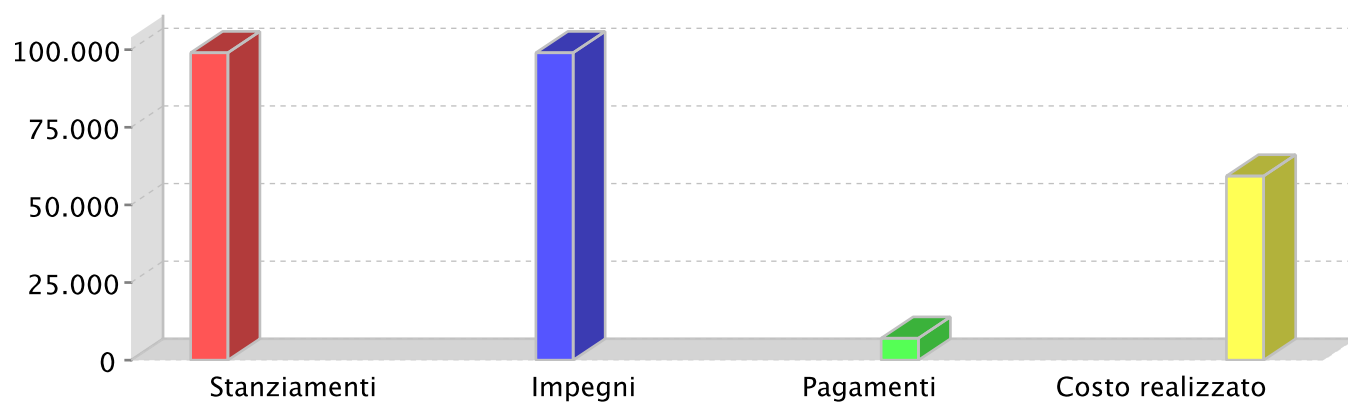

■ Stanziamenti=99.000,00 € ■ Impegni=99.000,00 € ■ Pagamenti=7.058,52 €
■ Costo realizzato=59.298,26 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 59.90 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 7.13 % sullo stanziato

Report del progetto: RAS 03/b - Tortoli - Adeguamento aeroporto

Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita'

Localizzazione

Provincia	Comune
1) Ogliastra	Tortoli'

Soggetto Attuatore

REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI


Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Trasporti - Ing. Antonio Usai

Stato del progetto

In corso

Piano Economico-Finanziario

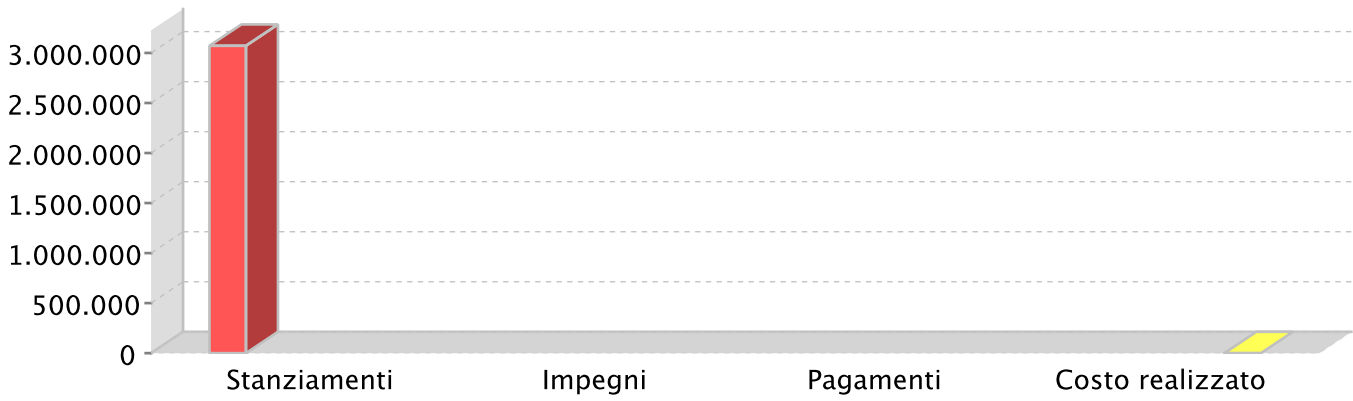

■ Stanziamenti=3.072.000,00 € ■ Impegni=0,00 € ■ Pagamenti=0,00 €
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato
