



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


**STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

Mobilta' - Atto Integrativo

## DATI COMPLESSIVI DELL'APQ

Numero interventi nel campione

5

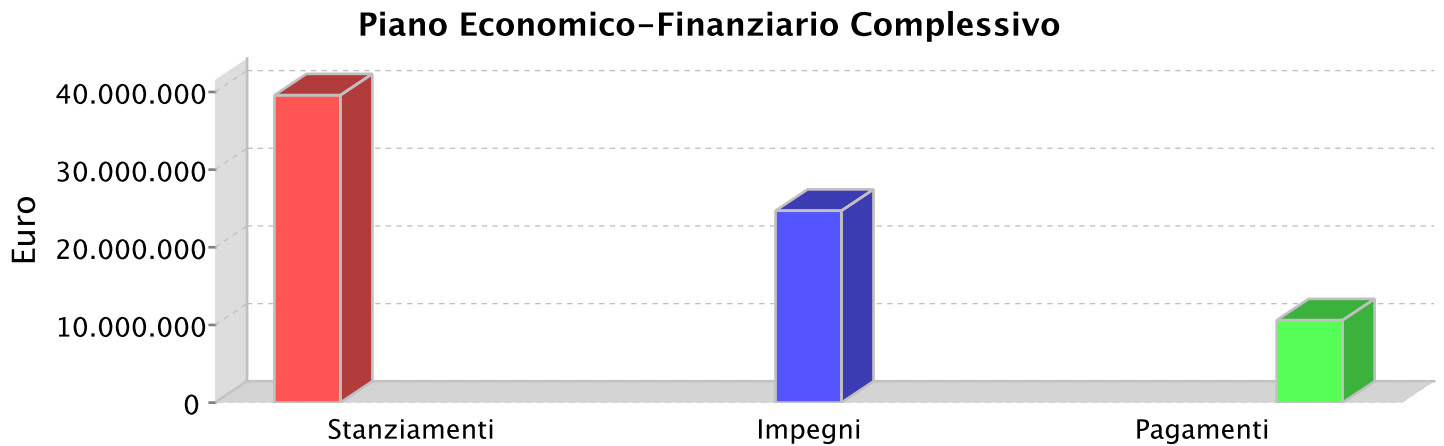


■ Stanziamenti=39.583.330,80 €   ■ Impegni=24.712.318,15 €  
■ Pagamenti =10.611.043,16 €

Avanzamento impegni: 62.44 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 26.81 % sullo stanziato

### Distribuzione in base alle fonti


limitatamente agli stanziamenti ripartiti

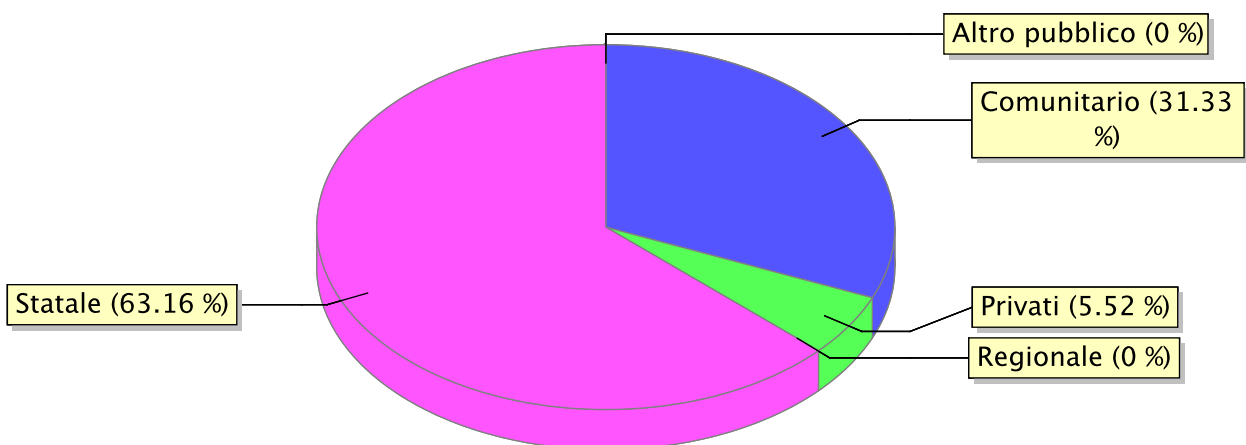

● Altro pubblico = 0   ● Comunitario = 12.400.000   ● Privati = 2.183.330,8  
● Regionale = 0   ● Statale = 25.000.000

## Distribuzione in base alla località

E' possibile che alcuni progetti ricadano in più province

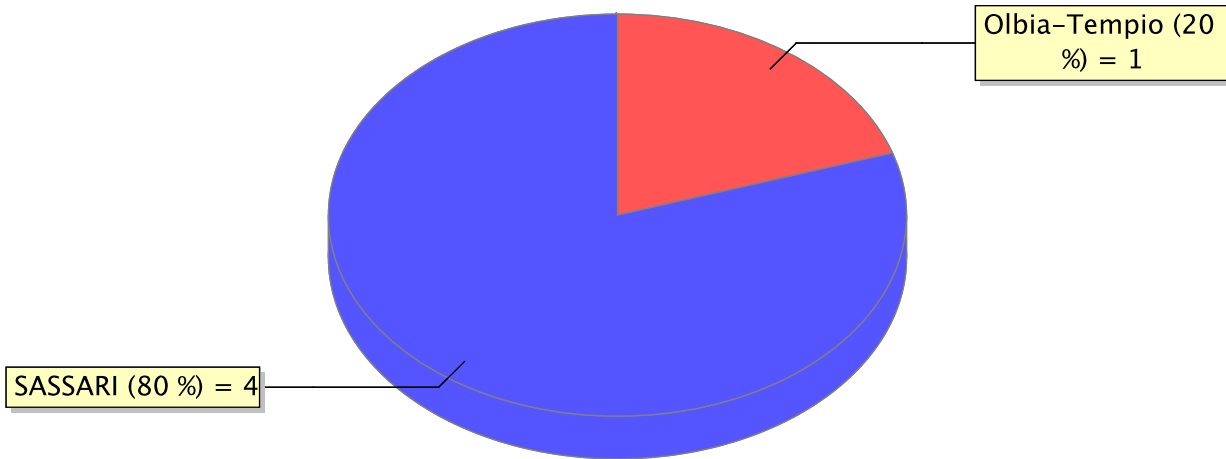

● Olbia-Tempio (20 %) = 1 ● SASSARI (80 %) = 4

# Report del progetto: ENAC AL05 - Sistema di controllo perimetrale e completamenti operativi

## Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita' - Atto Integrativo

## Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Alghero

## Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

## Responsabile dell'intervento


REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO TRASPORTI - CAGLIARI

## Stato del progetto

In corso



## Piano Economico-Finanziario

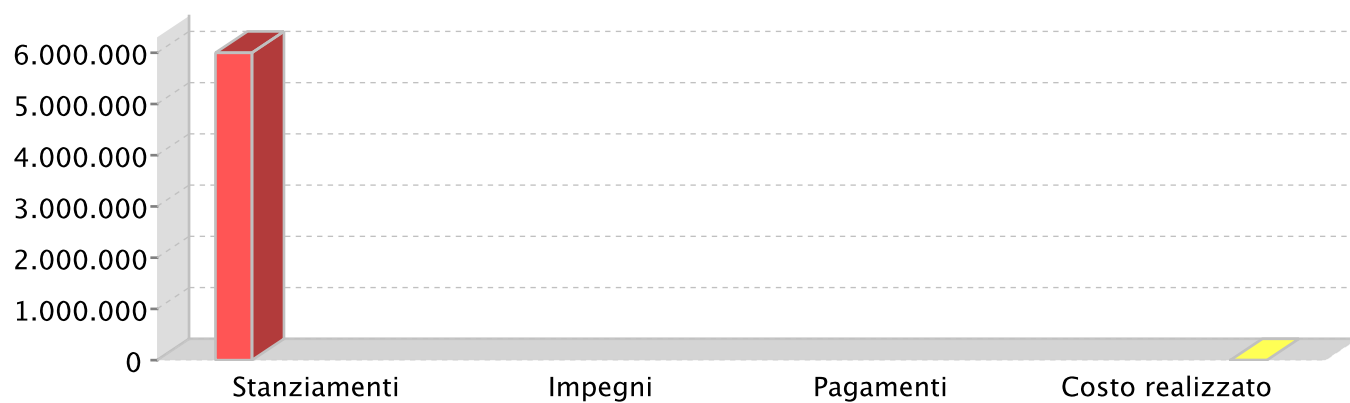

■ Stanziamenti=6.000.000,00 €   ■ Impegni=0,00 €   ■ Pagamenti=0,00 €  
■ Costo realizzato=0,00 €

Avanzamento impegni: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 0.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 0.00 % sullo stanziato

# Report del progetto: ENAC OL04 - Completamento nuovo piazzale di sosta aeromobili e sistema di controllo perimetrale

## Programma/Fonte

Intesa - APQ Mobilita' - Atto Integrativo

## Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) Olbia-Tempio	Olbia

## Soggetto Attuatore

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


## Responsabile dell'intervento

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato dei Trasporti

## Stato del progetto

In corso

## Piano Economico-Finanziario

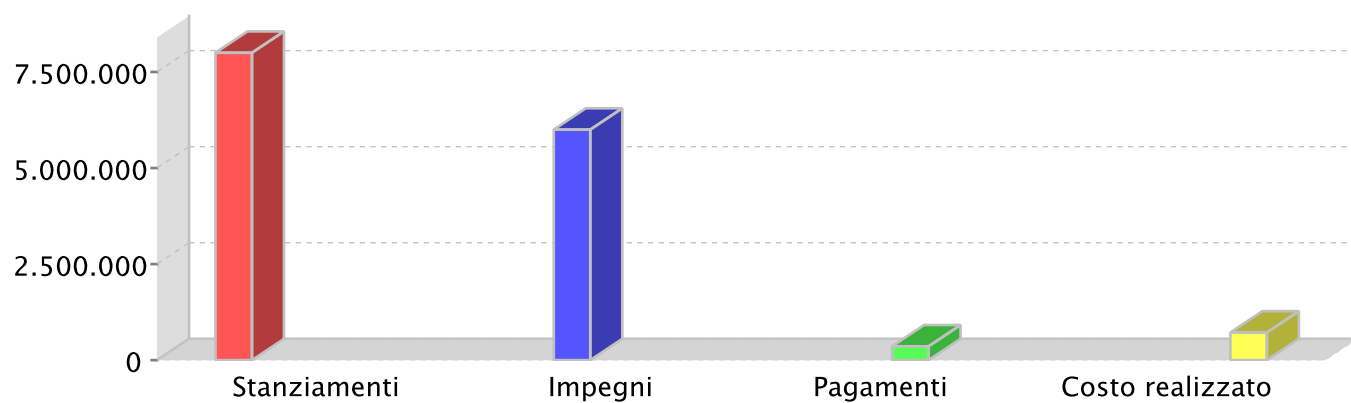

■ Stanziamenti=8.000.000,00 €   ■ Impegni=6.000.000,00 €  
■ Pagamenti=360.000,00 €   ■ Costo realizzato=720.000,00 €

Avanzamento impegni: 75.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 9.00 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 4.50 % sullo stanziato

## Report del progetto: ENACAL0301 - Ampliamento piazzali sosta aeromobili

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Mobilita' - Atto Integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Alghero

### **Soggetto Attuatore**

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

### **Responsabile dell'intervento**


Regione Autonoma Sardegna - Assessorato dei Trasporti

### **Stato del progetto**

Concluso



## Piano Economico-Finanziario

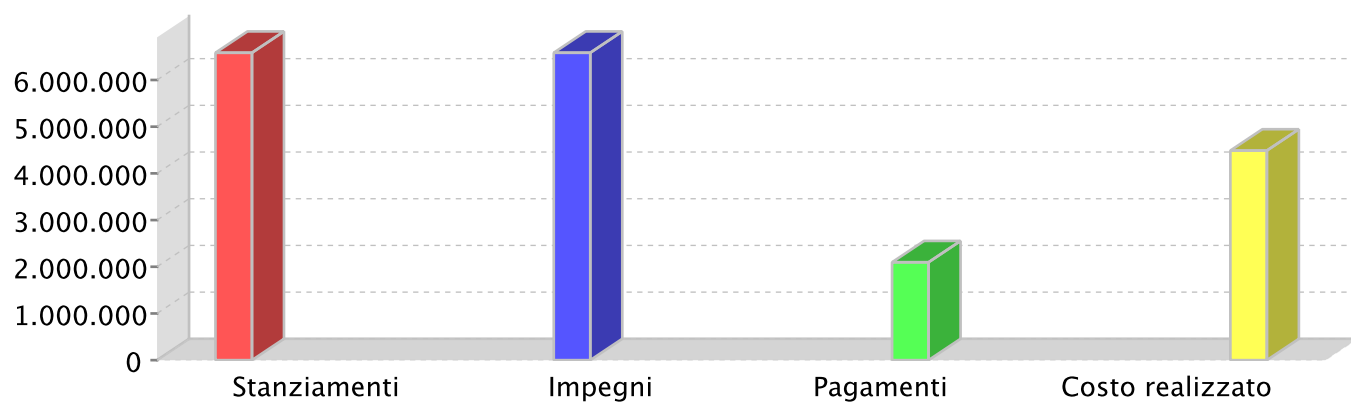

■ Stanziamenti=6.583.330,80 €   ■ Impegni=6.583.330,80 €  
■ Pagamenti=2.096.542,97 €   ■ Costo realizzato=4.488.824,96 €

Avanzamento impegni: 100.00 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 68.19 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 31.85 % sullo stanziato

## Report del progetto: ENACAL0303 - Completamento riqualifica via di rullaggio

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Mobilita' - Atto Integrativo

Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Alghero

### **Soggetto Attuatore**

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


### **Responsabile dell'intervento**

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato dei Trasporti

### **Stato del progetto**

Concluso

## Piano Economico-Finanziario

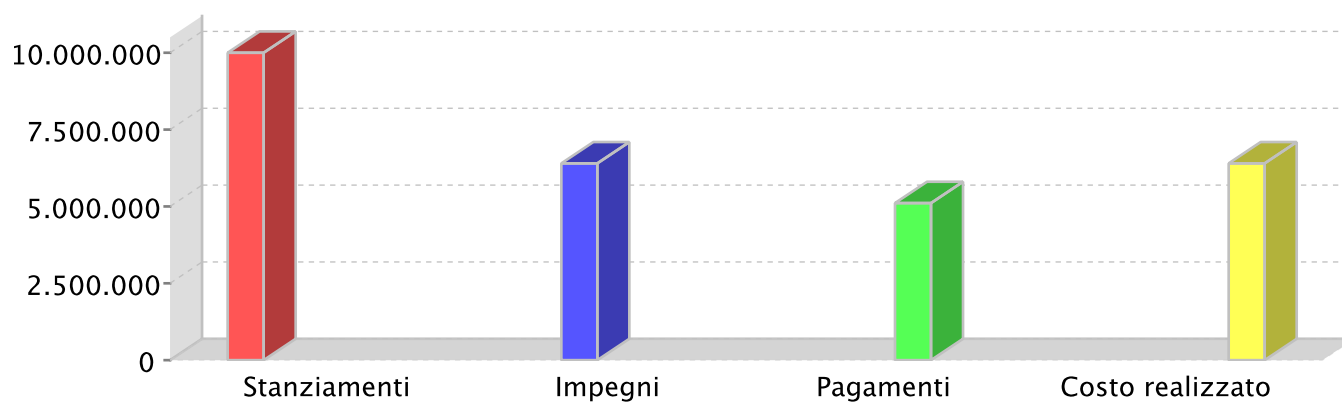

■ Stanziamenti=10.000.000,00 €   ■ Impegni=6.401.685,82 €  
■ Pagamenti=5.109.050,62 €   ■ Costo realizzato=6.401.685,82 €

Avanzamento impegni: 64.02 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 64.02 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 51.10 % sullo stanziato

## Report del progetto: ENACAL0302 - Riqualifica pista di volo

### **Programma/Fonte**

Intesa - APQ Mobilita' - Atto Integrativo

### Localizzazione

Provincia	Comune
1 ) SASSARI	Alghero

### **Soggetto Attuatore**

E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


### **Responsabile dell'intervento**

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti

### **Stato del progetto**

Realizzato

## Piano Economico-Finanziario

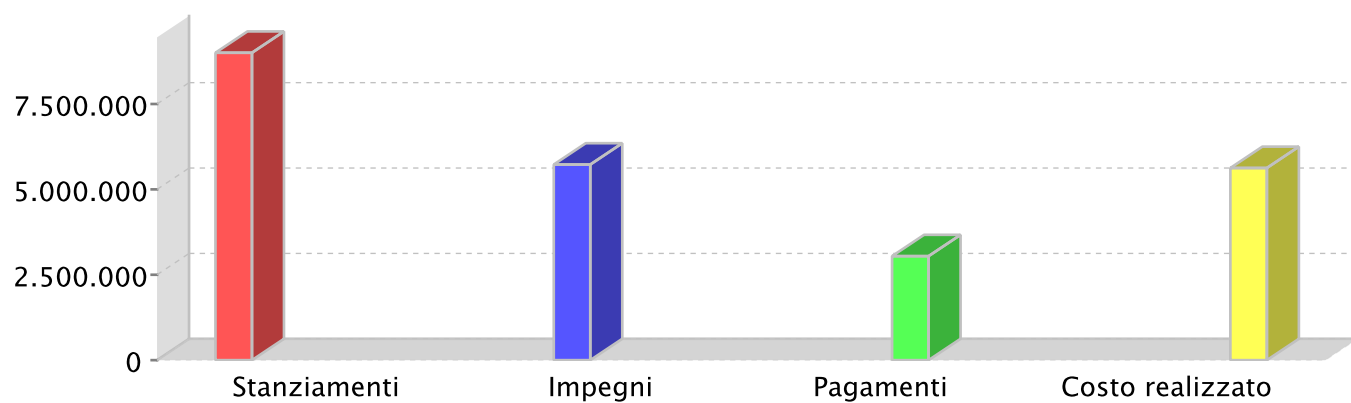

■ Stanziamenti=9.000.000,00 €	■ Impegni=5.727.301,53 €
■ Pagamenti=3.045.449,57 €	■ Costo realizzato=5.626.360,68 €

Avanzamento impegni: 63.64 % sullo stanziato

Avanzamento costo realizzato: 62.52 % sullo stanziato

Avanzamento pagamenti: 33.84 % sullo stanziato
