



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9 - APQ Aree Urbane

Assessorato Enti Locali

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

9 - Aree Urbane

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - pdq_04 - Castelsardo - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità
2	2 - pdq_05_1 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali
3	3 - pdq_05_2 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto B - complesso del San Michele
4	4 - pdq_10_1 - Cagliari - Mediateca del Mediterraneo
5	5 - pdq_10_2 - Cagliari - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli
6	6 - pdq_14_1 - Carbonia - Ecologie del traffico. Riqualificazione funzionale e ambientale dell'asse attrezzato per l'accessibilità sostenibile alla città di fondazione
7	7 - pdq_14_2 - Carbonia - Restauro e recupero del Padiglione Torneria e Forge come struttura polifunzionale integrata. Alta formazione universitaria e Centro congressi
8	8 - pdq_14_3 - Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico con funzione di centro educativo giovanile integrato
9	9 - pdq_14_4 - Carbonia - Itinerari storico-culturali del moderno. Riqualificazione dell'accessibilità allo spazio pubblico centrale della "città di fondazione"
10	10 - ps_1 - Alghero - piano strategico
11	11 - ps_10 - Selargius - piano strategico
12	12 - ps_2 - Cagliari - piano strategico
13	13 - ps_3 - Carbonia - piano strategico
14	14 - ps_4 - Iglesias - piano strategico
15	15 - ps_5 - Nuoro - piano strategico
16	16 - ps_6 - Olbia - piano strategico
17	17 - ps_7 - Oristano - piano strategico
18	18 - ps_8 - Quartu Sant'Elena - piano strategico
19	19 - ps_9 - Sassari - piano strategico



9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

1 - pdq_04 - Castelsardo - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità: creazione di un centro per accrescere la fruizione dei luoghi e dei servizi offerti al cittadino

Somma stanziata: € 7.479.413,32

Somma impegnata: € 190.963,19

% impegnato su stanziato: 2,55%


Costo realizzato: € 20.907,03

% realizzato su stanziato: 0,28%

Pagamenti: € 20.907,03

% pagato su stanziato: 0,28%

Stato di attuazione: In fase di progettazione esecutiva

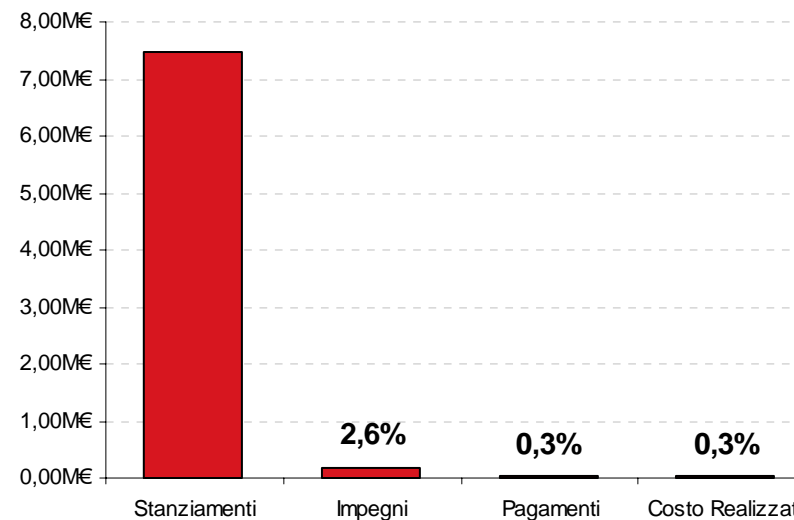

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

2 - pdq_05_1 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali

Somma stanziata: € 2.224.797,21

Somma impegnata: € 275.487,45

% impegnato su stanziato: 12,38%


Costo realizzato: € 1.730,40

% realizzato su stanziato: 0,08%

Pagamenti: € 1.730,40

% pagato su stanziato: 0,08%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva conclusa

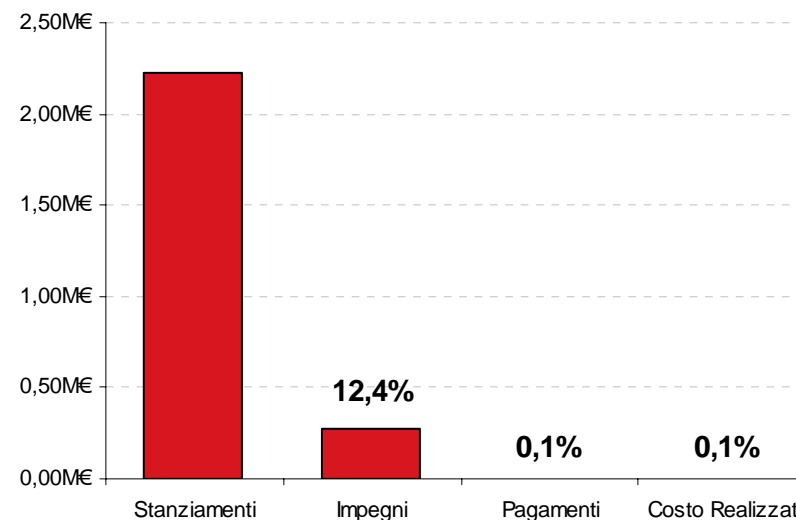

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

3 - pdq_05_2 - Alghero - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter - lotto B - complesso del San Michele

Somma stanziata: € 6.240.170,79

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione esecutiva conclusa

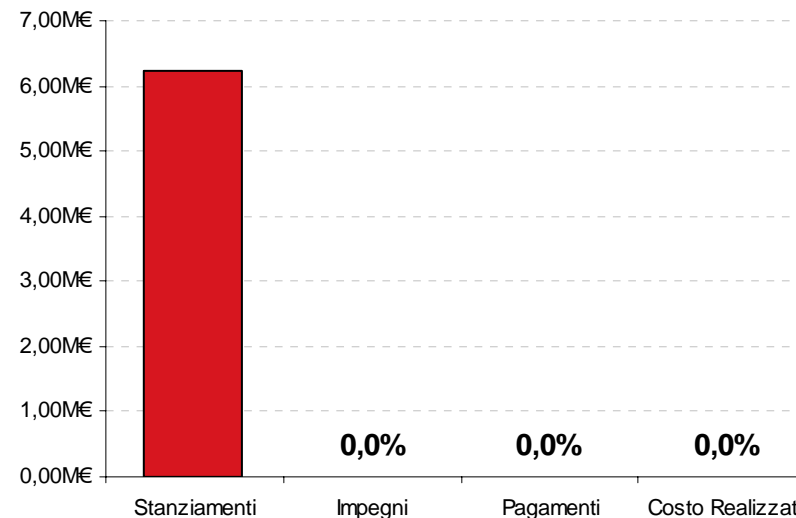

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

4 - pdq_10_1 - Cagliari - Mediateca del Mediterraneo

Somma stanziata: € 10.175.000,00

Somma impegnata: € 409.333,42

% impegnato su stanziato: 4,02%


Costo realizzato: € 393.509,28

% realizzato su stanziato: 3,87%

Pagamenti: € 393.509,28

% pagato su stanziato: 3,87%

Stato di attuazione: In fase di appalto

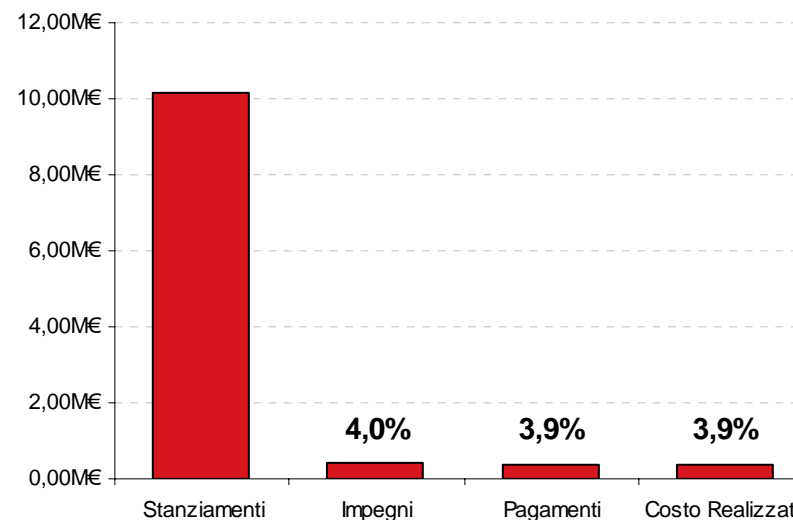

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

5 - pdq_10_2 - Cagliari - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli

Somma stanziata: € 2.825.000,00

Somma impegnata: € 140.322,13

% impegnato su stanziato: 4,97%


Costo realizzato: € 125.313,52

% realizzato su stanziato: 4,44%

Pagamenti: € 125.313,52

% pagato su stanziato: 4,44%

Stato di attuazione: In fase di appalto

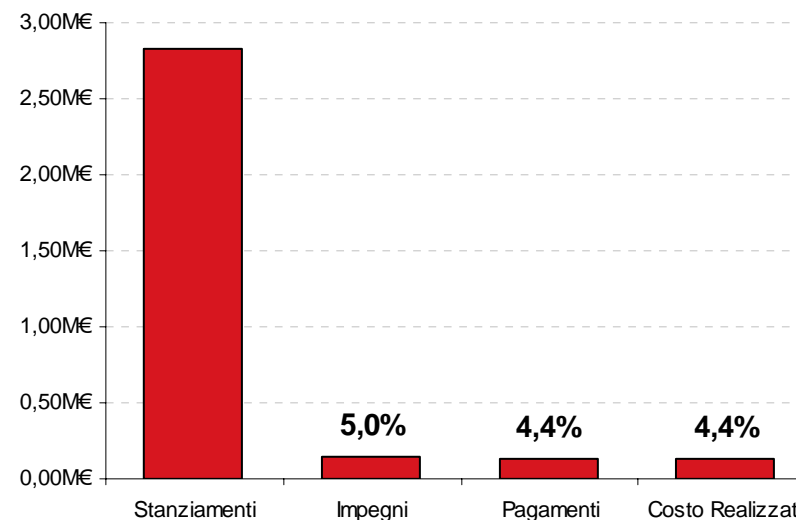

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

6 - pdq_14_1 - Carbonia - Ecologie del traffico. Riqualificazione funzionale e ambientale dell'asse attrezzato per l'accessibilità sostenibile alla città di fondazione

Somma stanziata: € 4.000.000,00

Somma impegnata: € 2.968.499,64

% impegnato su stanziato: 74,21%


Costo realizzato: € 125.112,97

% realizzato su stanziato: 3,13%

Pagamenti: € 125.112,97

% pagato su stanziato: 3,13%

Stato di attuazione: Lavori in esecuzione

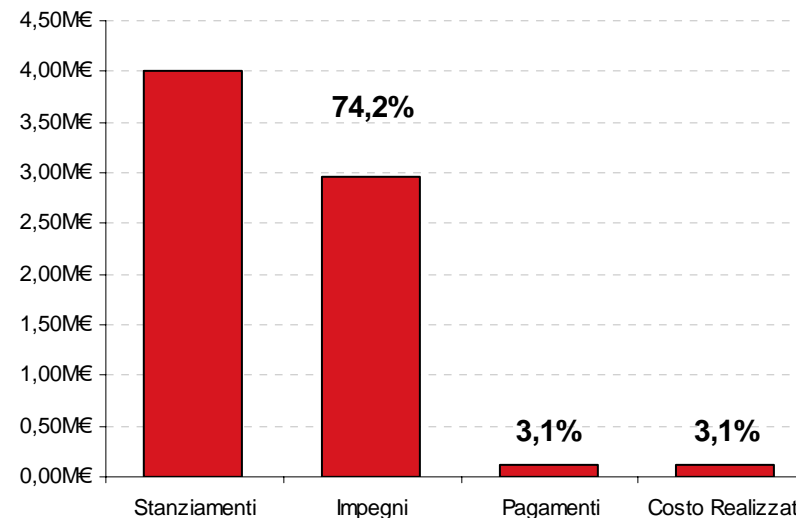

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

7 - pdq_14_2 - Carbonia - Restauro e recupero del Padiglione Torneria e Forge come struttura polifunzionale integrata. Alta formazione universitaria e Centro congressi

Somma stanziata: € 2.160.000,00

Somma impegnata: € 223.326,95

% impegnato su stanziato: 10,34%


Costo realizzato: € 178.146,25

% realizzato su stanziato: 8,25%

Pagamenti: € 178.146,25

% pagato su stanziato: 8,25%

Stato di attuazione: In fase di progettazione esecutiva

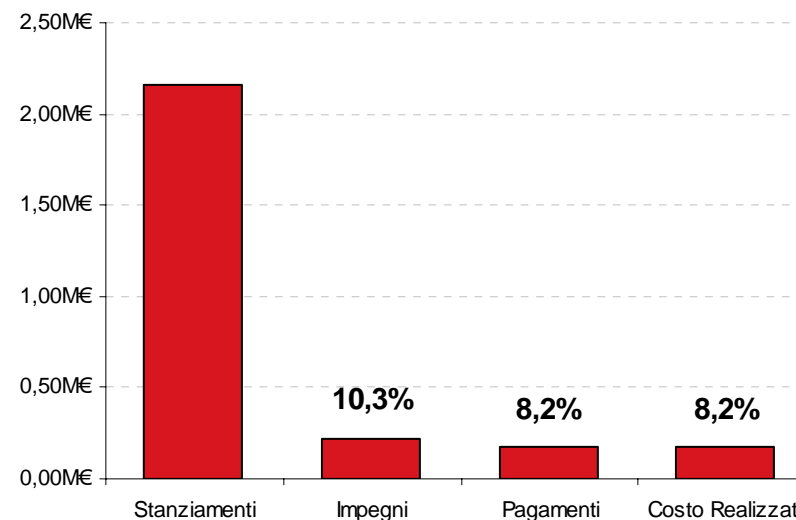

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

8 - pdq_14_3 - Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico con funzione di centro educativo giovanile integrato

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 182.998,11

% impegnato su stanziato: 9,15%


Costo realizzato: € 167.324,66

% realizzato su stanziato: 8,37%

Pagamenti: € 167.324,66

% pagato su stanziato: 8,37%

Stato di attuazione: In fase di aggiudicazione

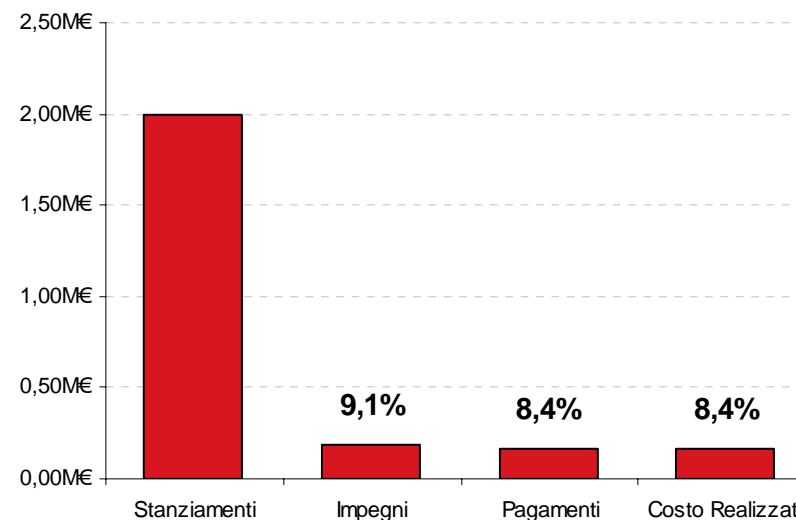

9 AREE URBANE APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

9 - pdq_14_4 - Carbonia - Itinerari storico-culturali del moderno. Riqualificazione dell'accessibilità allo spazio pubblico centrale della "città di fondazione"

Somma stanziata: € 1.800.000,00

Somma impegnata: € 1.517.063,29

% impegnato su stanziato: 84,28%


Costo realizzato: € 273.002,94

% realizzato su stanziato: 15,17%

Pagamenti: € 273.002,94

% pagato su stanziato: 15,17%

Stato di attuazione: In fase di esecuzione lavori

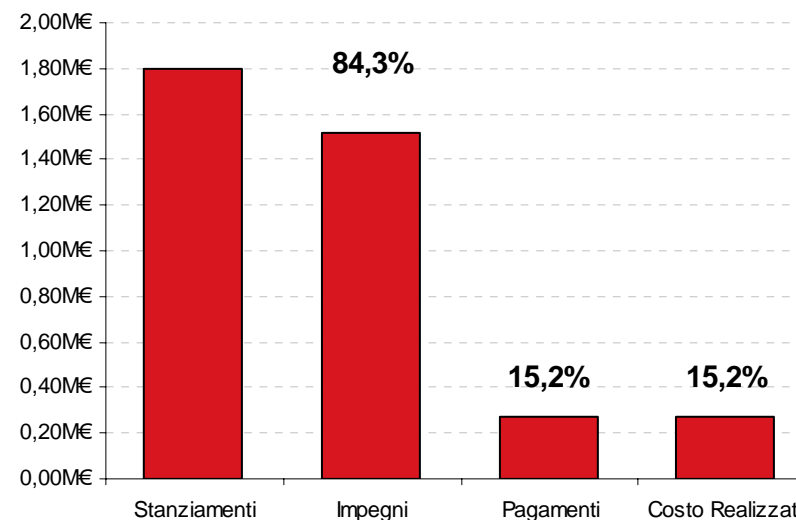

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

10 - ps_1 - Alghero - piano strategico

Somma stanziata: € 432.833,60

Somma impegnata: € 314.879,79

% impegnato su stanziato: 72,75%


Costo realizzato: € 164.928,71

% realizzato su stanziato: 38,1%

Pagamenti: € 164.928,71

% pagato su stanziato: 38,1%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (38%)

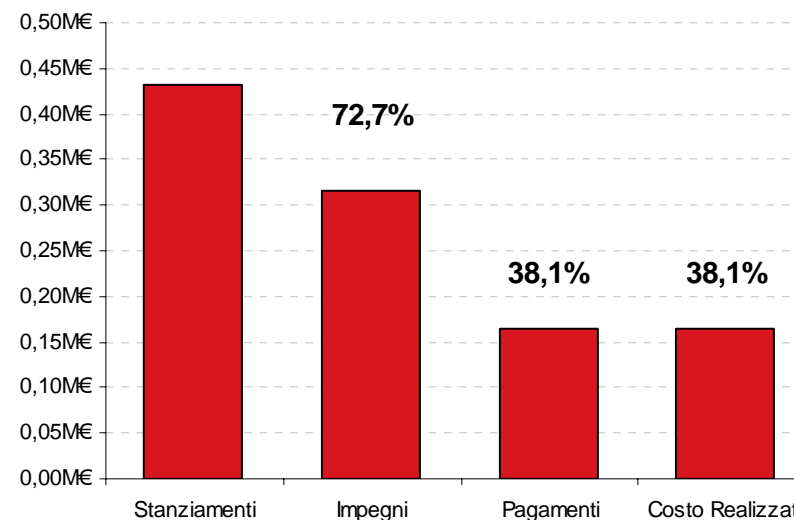

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

11 - ps_10 - Selargius - piano strategico

Somma stanziata: € 270.323,36

Somma impegnata: € 154.624,00

% impegnato su stanziato: 57,2%


Costo realizzato: € 87.112,00

% realizzato su stanziato: 32,23%

Pagamenti: € 87.112,00

% pagato su stanziato: 32,23%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (32%)

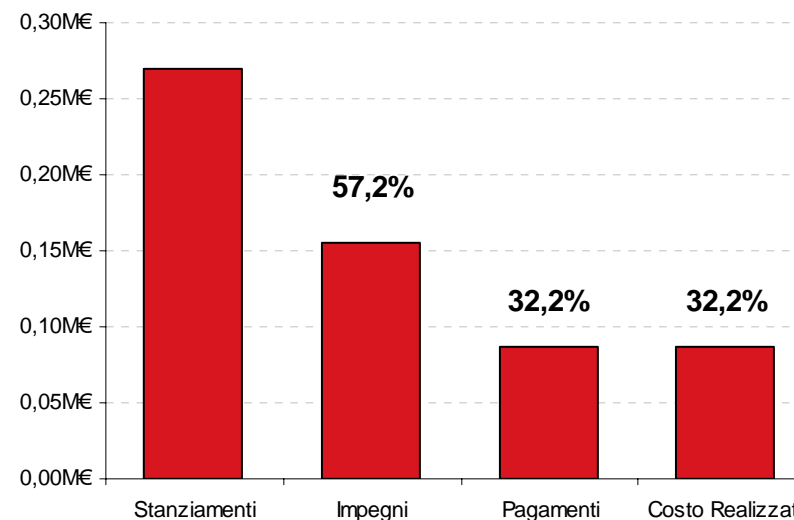

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

12 - ps_2 - Cagliari - piano strategico

Somma stanziata: € 1.022.917,42

Somma impegnata: € 240.651,37

% impegnato su stanziato: 23,53%


Costo realizzato: € 75.119,87

% realizzato su stanziato: 7,34%

Pagamenti: € 75.119,87

% pagato su stanziato: 7,34%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (7%)

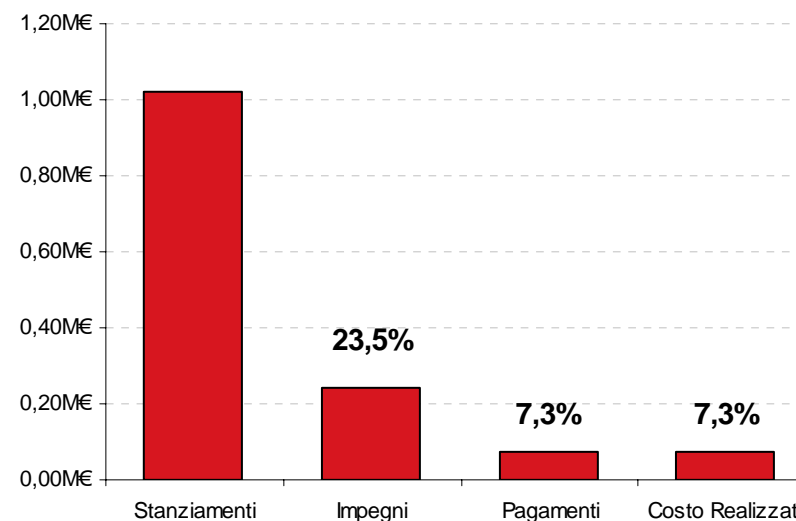

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

13 - ps_3 - Carbonia - piano strategico

Somma stanziata: € 210.000,00

Somma impegnata: € 177.483,00

% impegnato su stanziato: 84,52%


Costo realizzato: € 85.162,56

% realizzato su stanziato: 40,55%

Pagamenti: € 85.162,56

% pagato su stanziato: 40,55%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (40%)

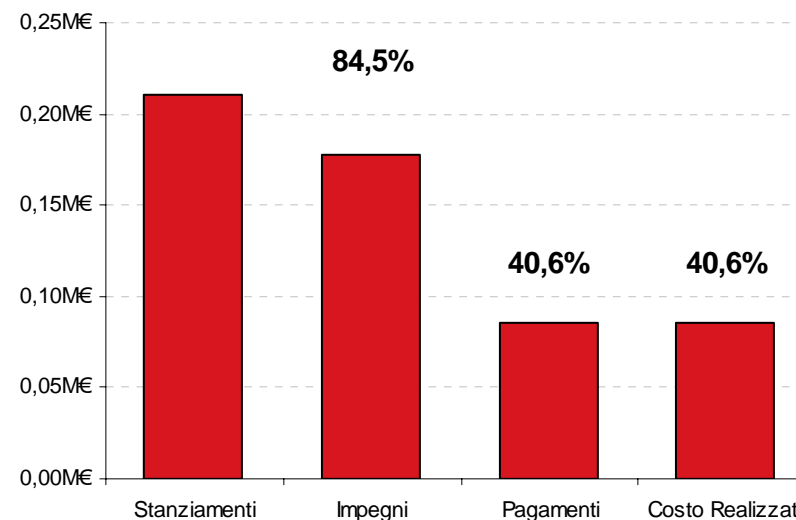

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

14 - ps_4 - Iglesias - piano strategico

Somma stanziata: € 210.000,00

Somma impegnata: € 117.600,00

% impegnato su stanziato: 56%


Costo realizzato: € 58.800,00

% realizzato su stanziato: 28%

Pagamenti: € 58.800,00

% pagato su stanziato: 28%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%)

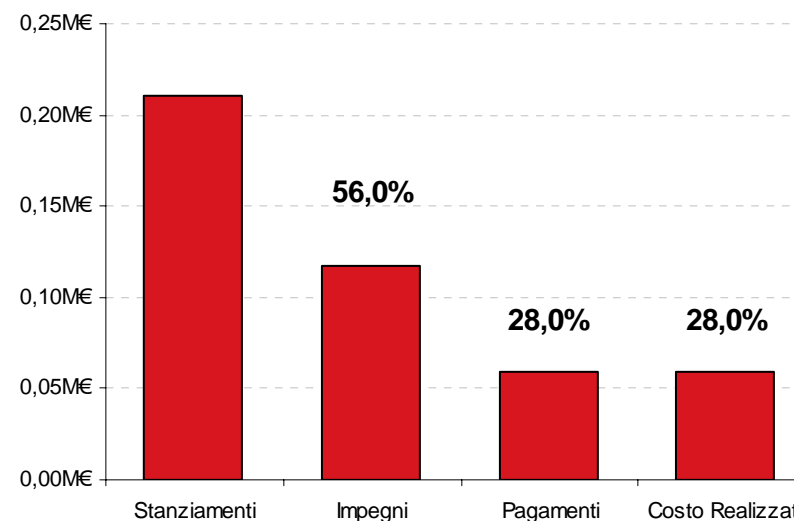

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

15 - ps_5 - Nuoro - piano strategico

Somma stanziata: € 409.472,15

Somma impegnata: € 218.407,06

% impegnato su stanziato: 53,34%


Costo realizzato: € 91.077,68

% realizzato su stanziato: 22,24%

Pagamenti: € 91.077,68

% pagato su stanziato: 22,24%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (22%)

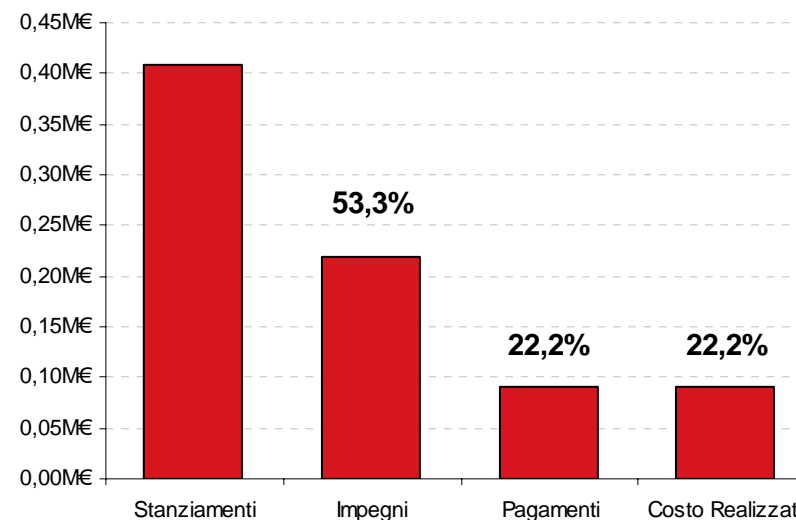

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

16 - ps_6 - Olbia - piano strategico

Somma stanziata: € 510.971,13

Somma impegnata: € 421.206,18

% impegnato su stanziato: 82,43%


Costo realizzato: € 144.245,62

% realizzato su stanziato: 28,23%

Pagamenti: € 144.245,62

% pagato su stanziato: 28,23%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%)

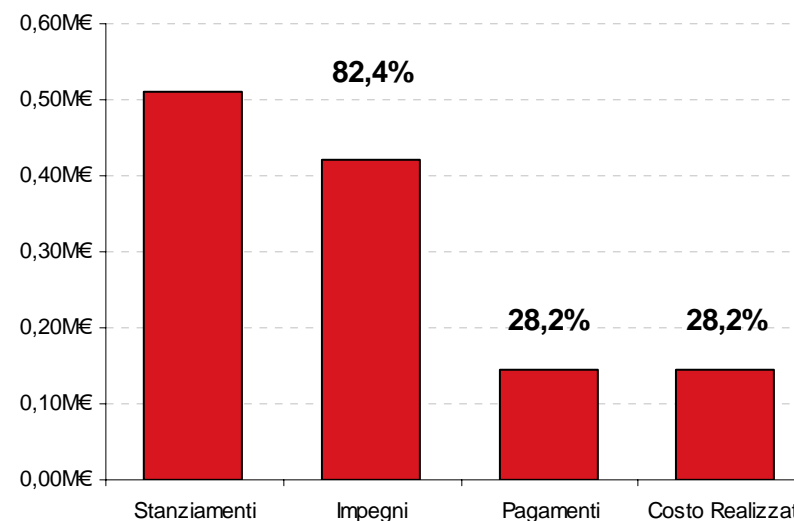

9 AREE URBANE APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

17 - ps_7 - Oristano - piano strategico

Somma stanziata: € 410.246,79

Somma impegnata: € 157.100,00

% impegnato su stanziato: 38,29%


Costo realizzato: € 26.583,00

% realizzato su stanziato: 6,48%

Pagamenti: € 26.583,00

% pagato su stanziato: 6,48%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (6%)

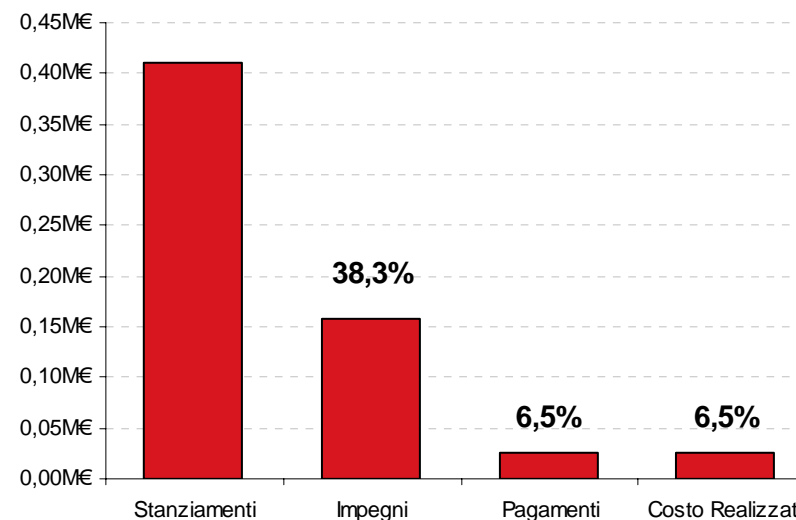

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

18 - ps_8 - Quartu Sant'Elena - piano strategico

Somma stanziata: € 473.192,98

Somma impegnata: € 347.098,01

% impegnato su stanziato: 73,35%


Costo realizzato: € 96.565,22

% realizzato su stanziato: 20,41%

Pagamenti: € 96.565,22

% pagato su stanziato: 20,41%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (20%)

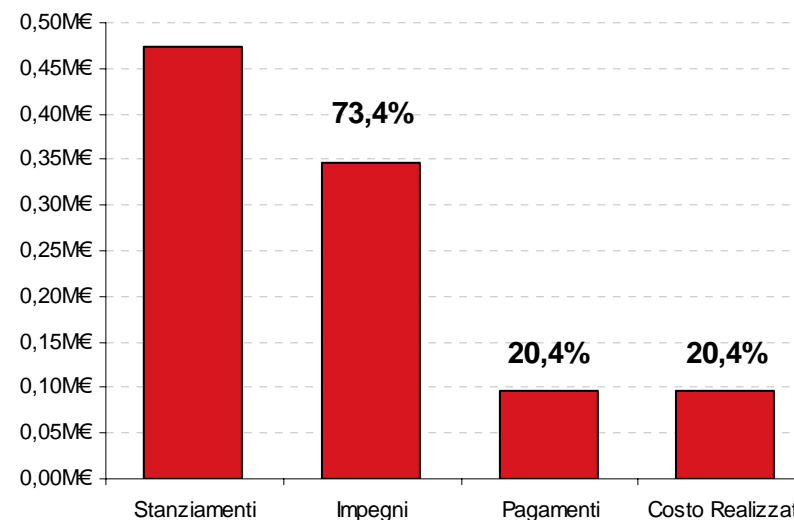

9 AREE URBANE

APQ ORIGINARIO 30 MARZO 2005

19 - ps_9 - Sassari - piano strategico

Somma stanziata: € 891.688,03

Somma impegnata: € 455.713,91

% impegnato su stanziato: 51,11%

Costo realizzato: € 252.782,15

% realizzato su stanziato: 28,35%

Pagamenti: € 252.782,15

% pagato su stanziato: 28,35%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (28%)

