


Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto

STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 125 "CAGLIARI - TORTOLI"

LAVORI ULTIMATI (IN ESERCIZIO)  
 LAVORI IN CORSO  
 PROGETTAZIONE

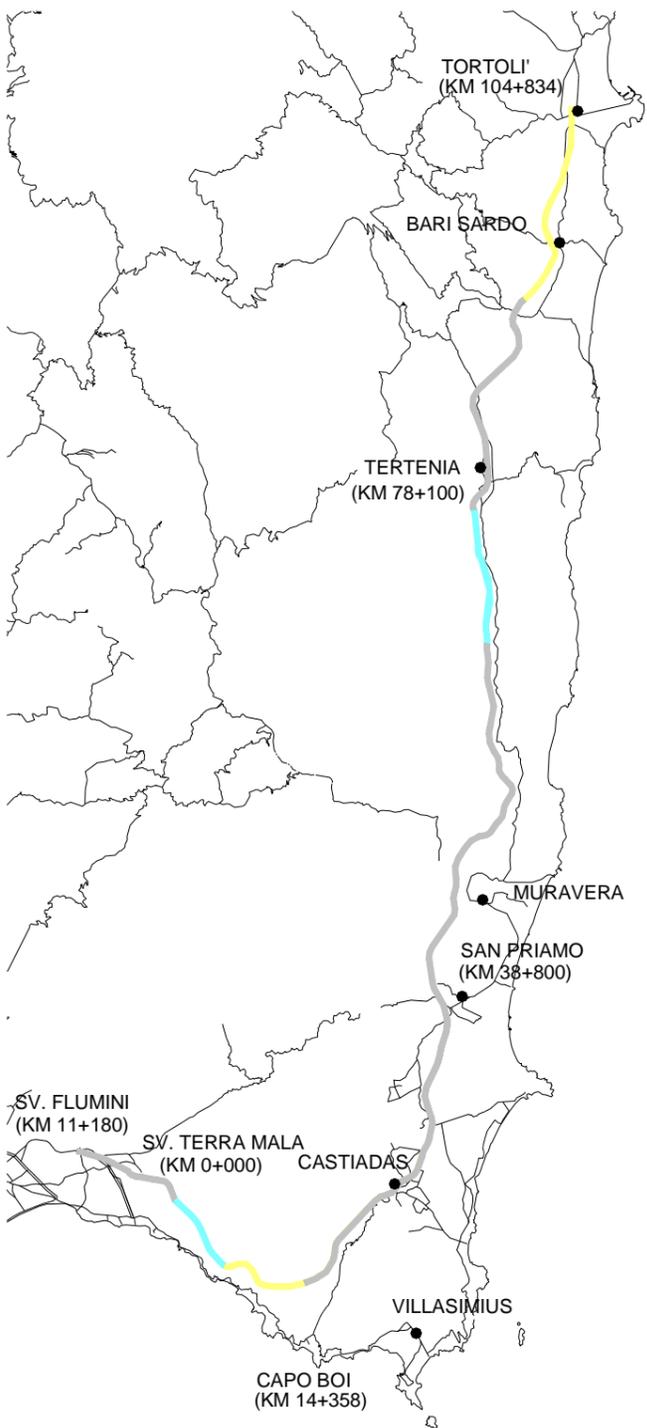

TRATTO	LOTTE	IMPORTO	Progressive	Km	SITUAZIONE	NOTE	FINANZIAMENTO	
Tertenia - Tortoli Km 78+100 - 104+834 (Ing. G. Marredda)	IV Lotto 2° stralcio Sv. Cea - Sv. Tortoli	11.305.971,16	100+897-104+834	3,936	Lavori in corso	Rescissione contrattuale in corso con Impresa GESTIM Srl	Fondi RAS (ex POP) più cofinanziamento ANAS	
	IV Lotto 1° stralcio Sv. Barisardo nord-Sv. Cea	24.015.245,81	96+033-100+897	4,864		Consegnati 03.07.2003. Ultimati nell'ottobre 2007. Impresa Condotte d'acqua SpA. Non ancora aperta al traffico		
	III Lotto 3° stralcio Sv. Barisardo sud - Sv. Barisardo nord	18.593.968,21	93+239-96+033	2,794		Impresa "Impresa" Lavori in corso (Fonte ANAS) al 90% Ultimazione prevista Luglio 2008		
	III Lotto 2° stralcio Loc. Genna Ortiga - Sv. Barisardo sud	20.856.300,22	89+692-93+239	3,547	Lavori in corso	Consegnati 12.03.2003 Impresa Baldassini & Tognozzi Lavori in corso 50% (Fonte ANAS) Contenzioso con impresa		
						II Lotto 3° stralcio Marina di Gairo - Cardedu		13.336.358,40
	In esercizio	II Lotto 2° stralcio Uscita Galleria Quadassoni - Marina di Gairo	12.970.880,84	83+450-86+122	2,672	Ultimati 30.06.2002 Impresa Baldassini & Tognozzi		Fondi RAS (POP) più cofinanziamento ANAS
		II Lotto 1° stralcio Loc. Sa Canna - Uscita Galleria Quadassoni	20.649.793,36	80+522-83+450	2,928	Ultimati 24.04.2002 Impresa Vittadello Intercantieri SpA		
		I Lotto Sv. Tertenia-Loc. Sa Canna	5.527.695,45	78+100-80+522	2,422	Ultimati 09.03.2002 Impresa Gelfi Brescia SpA		
Variante di Tertenia						Finanziamento ANAS precedente al 1997		
San Priamo - Tertenia Km 38+800 - 78+100 (Ing. E. Musio)	I Lotto 1° stralcio Sv. Tertenia-Sv. Osini	67.670.000,00	72+765-78+100	5,430	Progetto definitivo per appalto integrato In corso	Appalto lavori N.D. (fonte ANAS)	Finanziamento ANAS precedente al 1997	
	I Lotto 2° stralcio Sv. Osini-Sv. San Giorgio	62.000.000,00	64+923-72+765	7,842			Fondi da reperire	
	In esercizio	II Lotto 1° stralcio Sv. San Giorgio-Sv. Quirra	15.673.485,51	60+633-64+923	4,290	Consegnati 25.06.2002 ATI Tirrena Scavi SpA-Soc. Internazionale gallerie	Finanziamento ANAS Piano stralcio 2000	
		II Lotto 2° stralcio Sv. Quirra-Sv. Murtas	32.159.344,86	55+766-60+633	4,867	Consegnati 03.06.2004 Impresa Todini Costruzioni		
		III Lotto 1° stralcio Sv. Murtas - Ingresso Galleria Sa Sperruma	18.344.572,30	51+595-55+766	4,171	Aperto al traffico il 02.04.2006 Impresa Cavalieri Ottavio SpA		
		III Lotto 2° stralcio Uscita Galleria Sa Sperruma - Sv. Muravera	23.274.547,37	47+467-51+595	4,128	Aperto al traffico il 02.04.2006 ATI Gelfi-Romana Scavi		
		IV Lotto 1° stralcio Sv. Muravera-Cuili Paderi	19.276.000,00	43+693-47+467	3,774	Consegnati 06.10.2004 Impresa Irces 95 Ingg. Pisa s.r.l.	Finanziamento ANAS Piano Triennale 2002/2004	
		IV Lotto 2° stralcio Cuili Paderi-Sv. San Priamo	25.276.012,16	38+800-43+693	4,893	Consegnati 07.09.2000 Impresa "Impresa"	Finanziamento ANAS precedente al 1997	
Capo Boi - San Priamo Km 14+358 - 38+800 (Ing. F. Cannas)	I Lotto S. Priamo-Brunco Margiani	22.081.211,89	31+688-38+800	7,112	In esercizio	Impresa C.I.R. costruzioni	Fondi RAS (POP) più cofinanziamento ANAS	
	II Lotto Brunco Margiani - Svincolo Castiadas	18.572.370,87	22+931-31+688	8,757		Ultimati 29.11.2002 Impresa Fabiani SpA		
	III Lotto 1° stralcio Svincolo Castiadas - Gutturu Frascu	15.099.820,24	20+301-22+931	2,630		Ultimati 29.11.2002 Impresa Fabiani SpA		
	III Lotto 2° stralcio Galleria Gutturu Frascu	26.596.934,94	17+382-20+301	2,919		Ultimati 30.11.2002 Impresa Condotte d'acqua SpA		
	III Lotto 3° stralcio Uscita Galleria Gutturu Frascu - Capo Boi	26.147.535,55	14+358-17+382	3,024		Ultimati 10.12.2001 ATI Provera Carrassi		
Sv. Terra Mala - Capo Boi Km 0+000 - 14+358 (Ing. A. De Lorenzo)	I Lotto Km 0,000 - 8,789	92.580.000,00	5+569-14+358	8,789	Lavori in corso	Consegnati 09.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE	Finanziamento ANAS Piano straord. 2003 - Nuove Opere	
	II Lotto Km 8,789 - 14,358	151.303.000,00	0+000-5+569	5,569	Gara per appalto integrato	Lavori aggiudicati 20.06.2008 (Fonte ANAS) Ultimazione prevista Dicembre 2011	Fondi RAS 120,215 M€ + cofinanziamento ANAS	
Variante esterna all'abitato di Cagliari in alternativa alla S.S. 554 Km 11+180 - Km 0+000 (Ing. G. Marredda)	I Lotto 1° stralcio	74.627.013,96	11+180-0+000	11,180	In esercizio	Ultimati 15.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE	Fondi RAS (ex POP) più cofinanziamento ANAS	
	I Lotto 2° stralcio (Svincolo Flumini)	14.427.538,00	11+180	0,000	Lavori in corso	Ultimazione prevista Luglio 2008 Impresa Opere Pubbliche SpA	ANAS	
